

【東日本大震災津波】 社会資本の復旧・復興ロードマップ

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

策定の趣旨

◆ 被災者の今後の生活設計・再建等に資するよう、身近な社会資本の整備に関する情報を定期的に提供

被災者や被災地の事業者が、今後の生活再建・事業再開等を具体的に検討するためには、県民生活に身近な**社会資本の復旧・復興の工程についての情報が不可欠**です。

また、**本格復興の着実な推進**を、目に見える形で広く**情報発信**する必要があります。このため、県では、現時点における県民生活に身近な**社会資本（主要8分野）の復旧・復興事業の動きや今後の見通し**について**情報提供を行う**ものです。

なお、記載している工程等については、様々な要因により変更等が必要になる可能性があることから、定期的に最新のデータに更新していきます。

ロードマップの構成

◆ 主要8分野について掲載

- ① 海岸保全施設
- ② 復興まちづくり
- ③ 復興道路等
- ④ 災害公営住宅
- ⑤ 漁港
- ⑥ 港湾
- ⑦ 医療（病院、医科診療所）
- ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

◆ 総括と市町村別の2種類で構成

- 1 総括表
 - ① 復旧・復興事業の動き
 - ② 分野別の着工・完成箇所割合
 - ③ 事業計画掲載箇所一覧
 - ④ 復旧・復興ロードマップの見方
- 2 市町村別工程表
 - ① 各事業箇所の位置図
 - ② 年度別の整備スケジュール

ロードマップの更新

◆ 更新頻度

事業計画の策定や許認可に関する手続き、復旧・復興事業に係る工事が具体的に進捗してきていることから、その**進捗状況を分かりやすくお知らせするため、四半期ごとに基準日を定め、定期的に最新のデータに更新していきます。**

◆ 工程上の主要課題

- ① 自治体職員の不足
 - ② 労働者や建設資材の調整
 - ③ 用地取得期間の長期化
- 公表している工程を達成するためには、上記課題の解決が必要です。

◆ 情報発信


社会資本の復旧・復興ロードマップは、これまでに策定したものを併せ、県のホームページで公表しています。

(<http://www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html>)

復旧・復興事業の動き


◆ 前回の公表時点（基準日：平成27年9月30日）から、今回の更新までの期間の復興事業の進捗状況を『**工事の着工と完成**』に着目し整理しています。 全箇所数：752箇所

◆ 着工箇所数

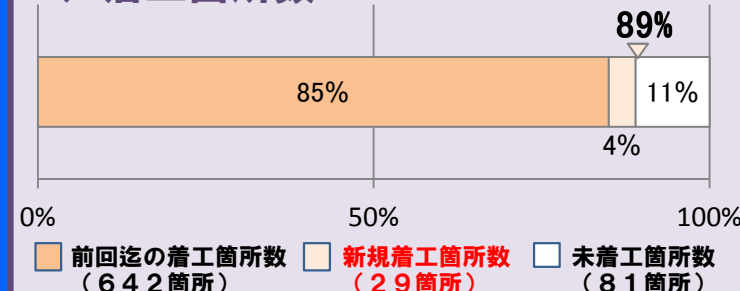

※ 着工：3%増加し、全箇所の89%


◆ 完成箇所数

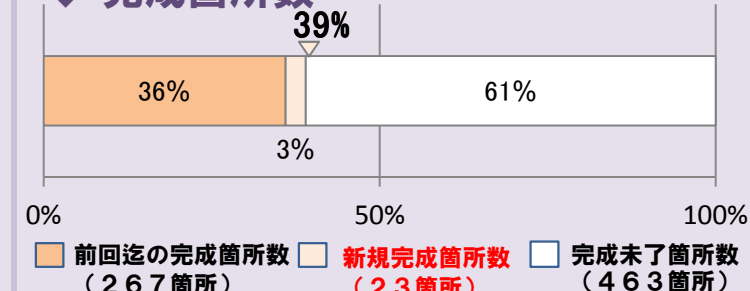

※ 完成：3%増加し、全箇所の39%

分野別の着工・完成箇所割合

◆ 社会資本の主要8分野における**分野別の着工箇所と完成箇所の割合**を整理しています。

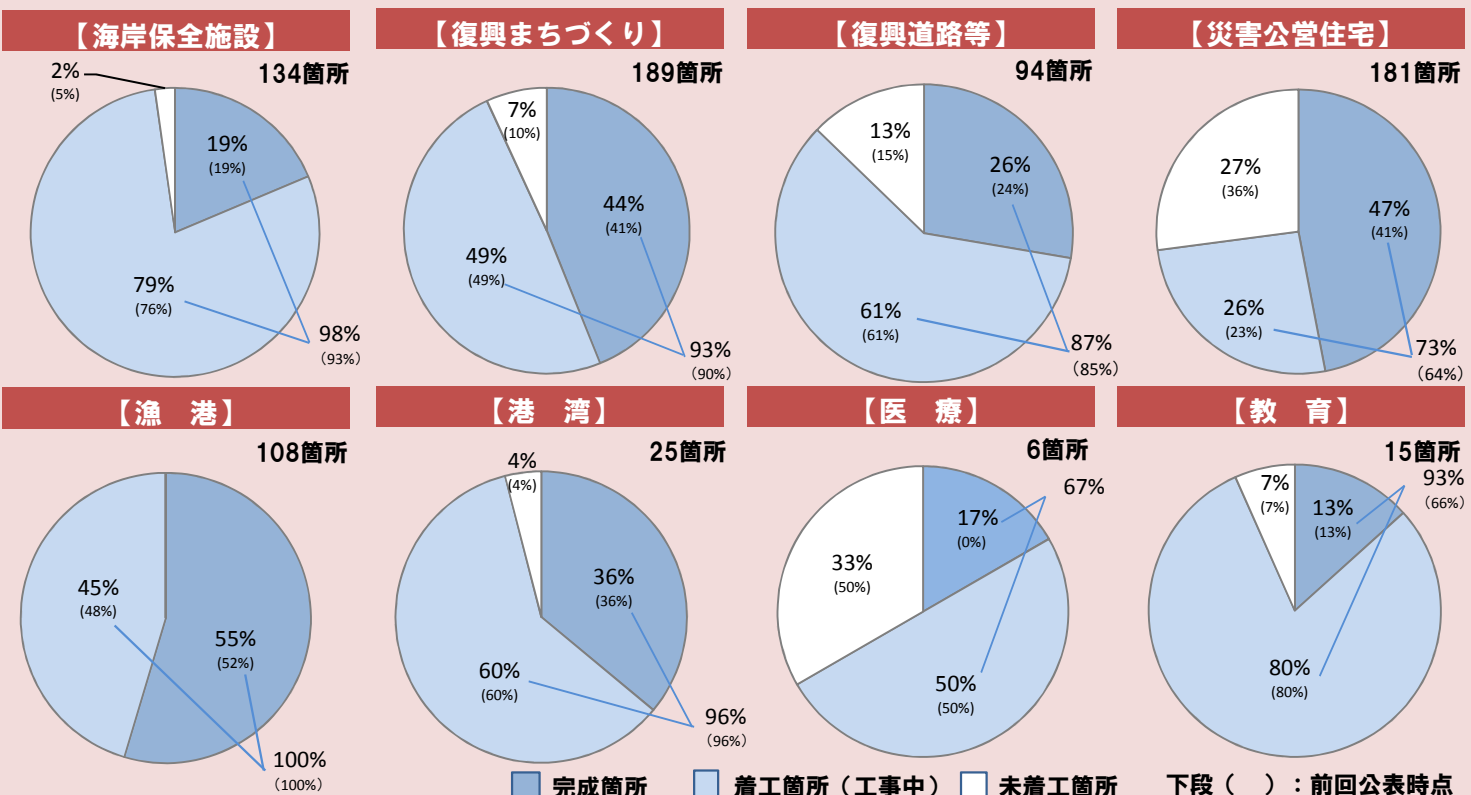

【お問い合わせ先】岩手県復興局まちづくり再生課（019-629-6935）

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

宅地供給計画区画数 8,012区画 (8,064区画から52区画の減少)
災害公営住宅計画戸数 5,771戸 (5,771戸から変更なし)

赤字は前回からの変更箇所

※ 復興道路等と災害公営住宅の全体の箇所数には、その他の市町村の箇所数を含んでいます。

【東日本大震災津波】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

社会資本の復旧・復興ロードマップ



基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

This map illustrates the Sagami Bay region, highlighting proposed expressway routes and key locations. The map includes the following labels and features:


- Proposed Expressway Routes:**
 - 洋野IC(仮)** (Yonohi Interchange, Provisional)
 - 洋野東IC(仮)** (Yonohi Higashi Interchange, Provisional)
 - 洋野南IC(仮)** (Yonohi Minami Interchange, Provisional)
 - 侍浜IC(仮)** (Sahibama Interchange, Provisional)
- Ports and Coastal Areas:**
 - ②角浜漁港** (Kakuhama Fishing Port)
 - 1大谷地海岸** (Ohtani-uchi Coast)
 - 2平内海岸** (Hirai Coast)
 - ③川尻漁港** (Kawajiri Fishing Port)
 - 7種市漁港海岸** (Shuichi Fishing Port Coast)
 - ①種市漁港** (Shuichi Fishing Port)
 - ④鹿糠漁港** (Kadonaka Fishing Port)
 - 3玉川海岸** (Tamagawa Coast)
 - ⑤戸類家漁港** (Togorika Fishing Port)
 - ⑥宿戸漁港** (Shukuto Fishing Port)
 - ⑦小子内漁港** (Kodanari Fishing Port)
 - 4小子内海岸** (Kodanari Coast)
 - 5原子内海岸** (Uchiwa Coast)
 - ⑧有家漁港** (Ukaya Fishing Port)
 - ⑨高家漁港** (Takaya Fishing Port)
- Other Landmarks and Routes:**
 - 階上IC** (Kaijō Interchange)
 - A三陸沿岸道路** (Sanriku Coast Road)
 - B(一)角ノ浜玉川線 玉川** (Route B(1) Kakuhama Tamagawa Line Tamagawa)
 - ア災害公営(八木北)** (Public Disaster Relief (Yagi North))
 - C(一)明戸八木線 小田の沢** (Route C(1) Akaho Yagi Line Oda no Sawa)
 - 1(一)八木港線(八木)** (Route 1(1) Yagi Port Line (Yagi))
 - 八木港** (Yagi Port)
 - a漁集(八木地区)** (Fishing Market (Yagi Area))
 - 洋野IC** (Yonohi Interchange)
 - 侍浜IC** (Sahibama Interchange)

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール																
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）									
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30						
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大谷地海岸	（災害復旧） 根固工V=92m ³ 他	■ H24.12完成																
			2 平内海岸	（災害復旧） 消波工L=220m	■ H25.10完成																
			3 玉川海岸	（災害復旧） 護岸L=87m 他	■ H24.11完成																
			4 小子内海岸	（災害復旧） 監視カメラ1台 他	■ H24.8完成																
			5 原子内海岸	（災害復旧） 根固工V=92m ³ 他	■ H24.5完成																
			6 八木海岸	（海岸高潮） 防潮堤L=0.4km、 水門等N=3基	用地設計等	★工事															
	漁港海岸	7 種市漁港海岸	（災害復旧） 陸閘N=1基、 水門N=1基 他	■ H24.3完成																	
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	洋野階上道路 （待浜～階上）	★用地買収、工事等 ◆ H25.9.12起工式																
	復興関連道路	県	B（一） 角ノ浜玉川線	玉川	★工事 ◆ H27.3着工																
			C（一） 明戸八木線	小田の沢	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手																
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 八木	対象戸数：15戸 （民15戸）	用地、設計等					民15戸											
	まちづくり連携道路	県	1（一）八木港線	八木	★工事 ◆ H27.11着工																
災害公営住宅	直接建設	町	ア 八木北 （単独）	木造平屋 戸数：4戸	■ H25.8完成		4戸														
漁港	漁港	町	① 種市漁港	（漁港災害） 防波堤L=106m 他	■ H24.9完成																
			② 角浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=10m	■ H24.3完成																
			③ 川尻漁港	（漁港災害） 護岸N=1式 他	■ H24.3完成																
			④ 鹿糠漁港	（漁港災害） 船揚場L=22m 他	■ H24.3完成																
			⑤ 戸類家漁港	（漁港災害） 船揚場N=1式	■ H24.3完成																
			⑥ 宿戸漁港	（漁港災害） 防波堤L=69m、 船揚場L=8m 他	■ H24.12完成																
			⑦ 小子内漁港	（漁港災害） 防波堤L=101m、 岸壁L=14m 他	■ H25.1完成																
			⑧ 有家漁港	（漁港災害） 防波堤L=85m 他	■ H25.1完成																
			⑨ 高家漁港	（漁港災害） 防波堤L=45m 他	■ H24.11完成																
港湾	八木港	県	北港地区	（災害復旧） 防波堤L=162m、 -4.5m岸壁L=159m 他	■ H26.3完成																
			南港地区	（災害復旧） 第2防波堤L=13m、 1号護岸L=57.8m	■ H26.3完成																

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市1/2】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり

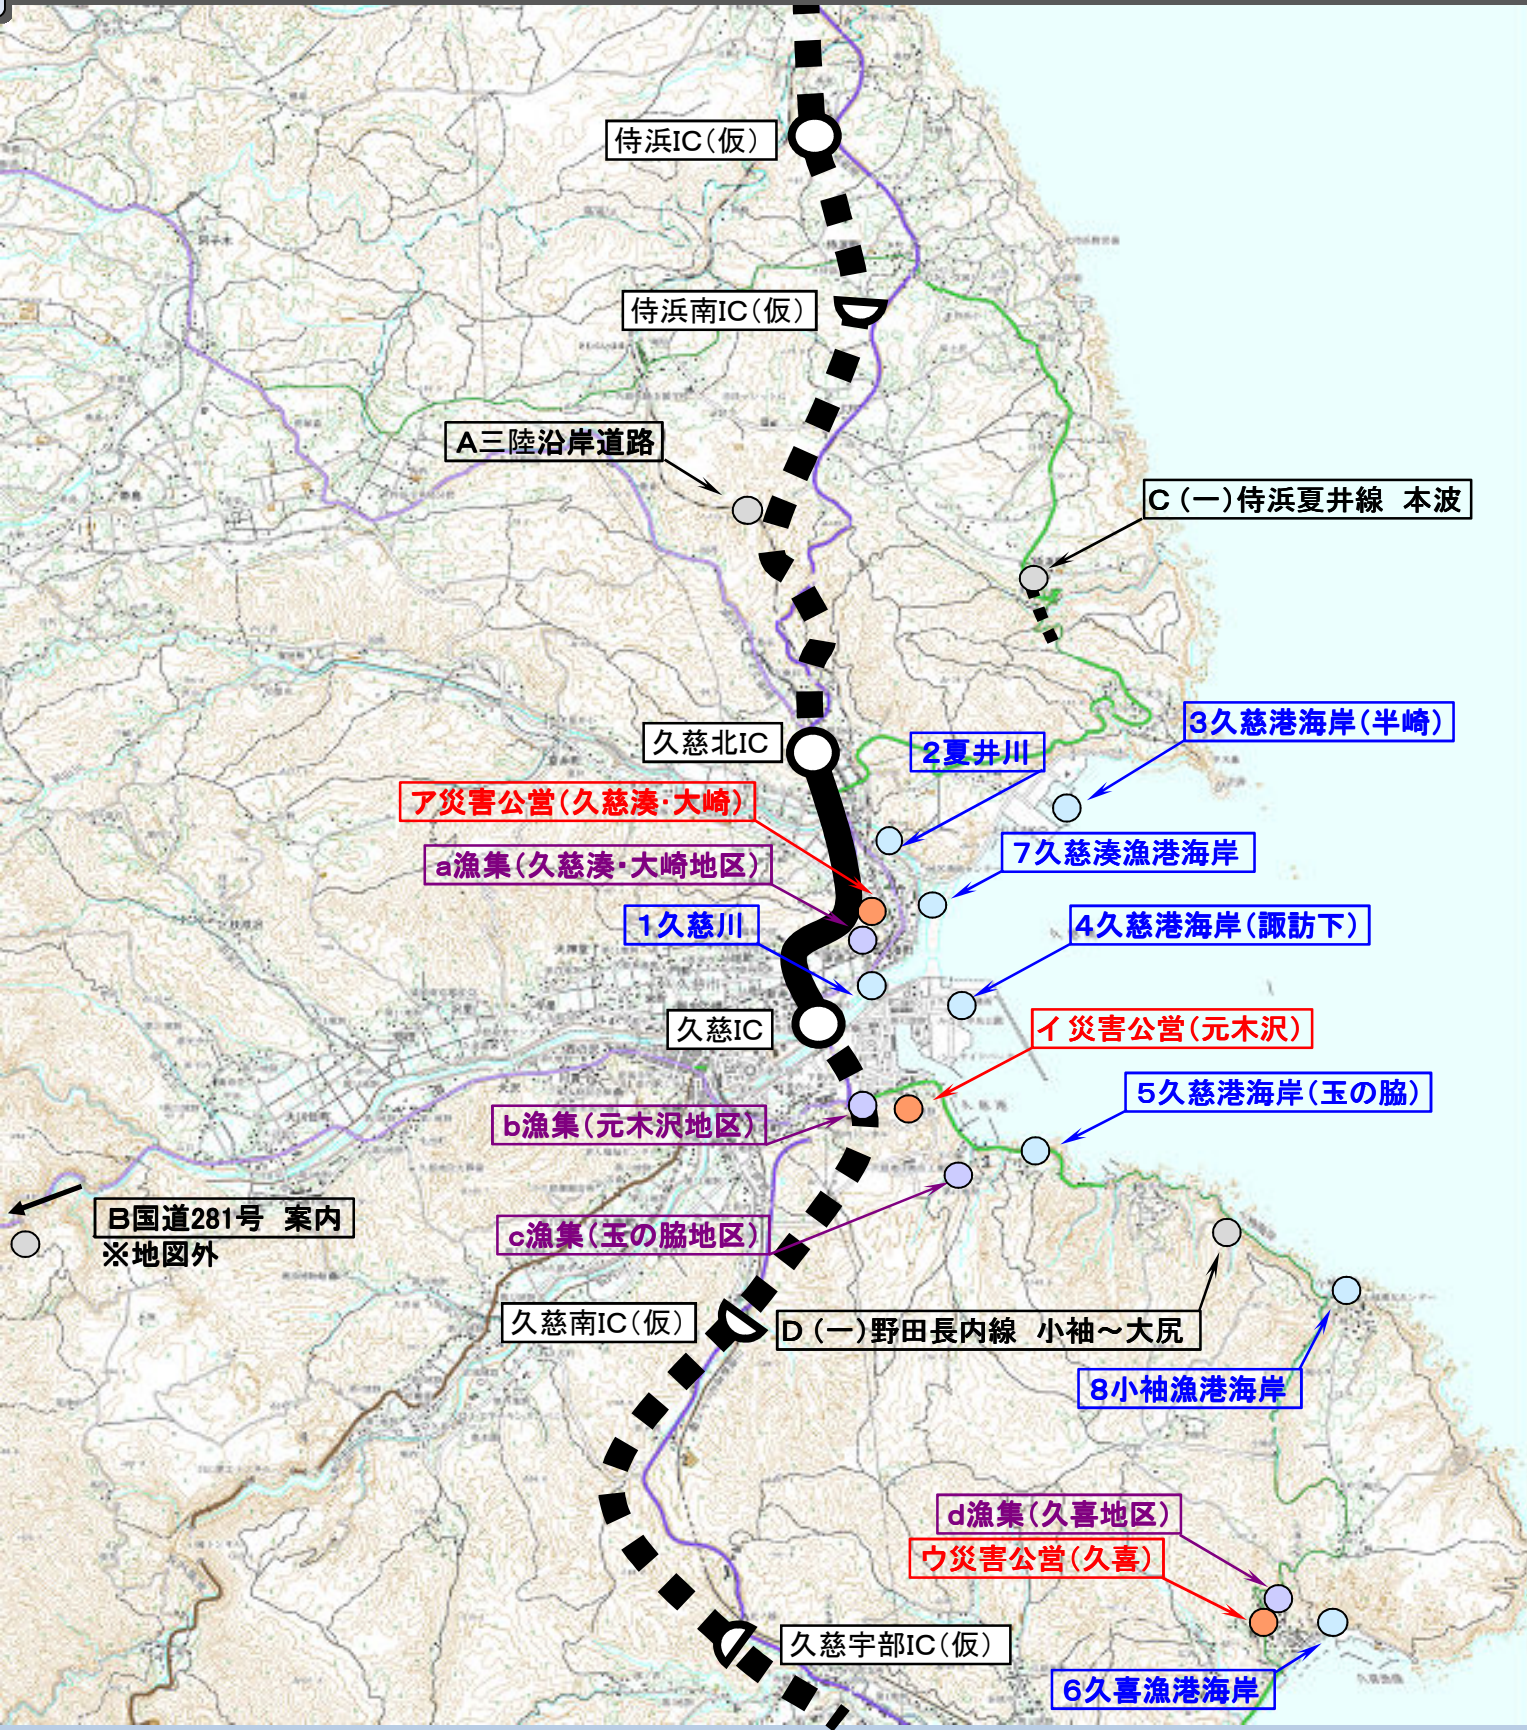


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)					第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 久慈川	(三陸高潮) 防潮堤L=2.0km	用地、設計等	★工事									
			2 夏井川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.8km	用地、設計等	★工事									
	港湾海岸		3 久慈港海岸 (半崎)	(災害復旧) 離岸堤L=0.2km	■H24.10完成										
			4 久慈港海岸 (諏訪下)	(災害復旧) 防潮堤L=2.6km、 陸閘N=12基		★工事									
	漁港海岸		5 久慈港海岸 (玉の脇)	(災害復旧) 離岸堤L=0.4km	■H24.10完成										
			6 久喜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事									
			7 久慈湊 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=4基	用地、設計等	★工事									
			8 小袖漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事									
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	久慈北道路 (侍浜～久慈北)	★用地買収、工事等										
				野田久慈道路 (普代～久慈)	★用地買収、工事等 ◆H25.6.27起工式										
	復興支援道路	県	B 国道281号	案内	★工事 ◆H25.12着工										
			C (一) 侍浜夏井線	本波	■H24.9.30供用開始										
	復興関連道路		D (一) 野田長内線	小袖～大尻	★工事										
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	市	a 久慈湊・大崎	対象戸数:14戸 (民9戸・公5戸)	民9戸・公5戸		■H26.3完成								
			b 元木沢	対象戸数:5戸 (民2戸・公3戸)	民2戸・公3戸		■H25.11完成								
			c 玉の脇	対象戸数:3戸 (民3戸)	民3戸		■H25.11完成								
			d 久喜	対象戸数:4戸 (民1戸・公3戸)	民1戸・公3戸		■H25.8完成								
災害公営住宅	直接建設	市	ア 久慈湊・大崎 (漁:久慈湊・大崎地区)	木造 戸数:5戸	5戸		■H26.3完成								
			イ 元木沢 (漁:元木沢地区)	木造 戸数:3戸	3戸		■H26.3完成								
			ウ 久喜 (漁:久喜地区)	木造 戸数:3戸	3戸		■H25.12完成								

社会資本の復旧・復興ロードマップ【久慈市2/2】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

新たな視点による 新たなまちづくり

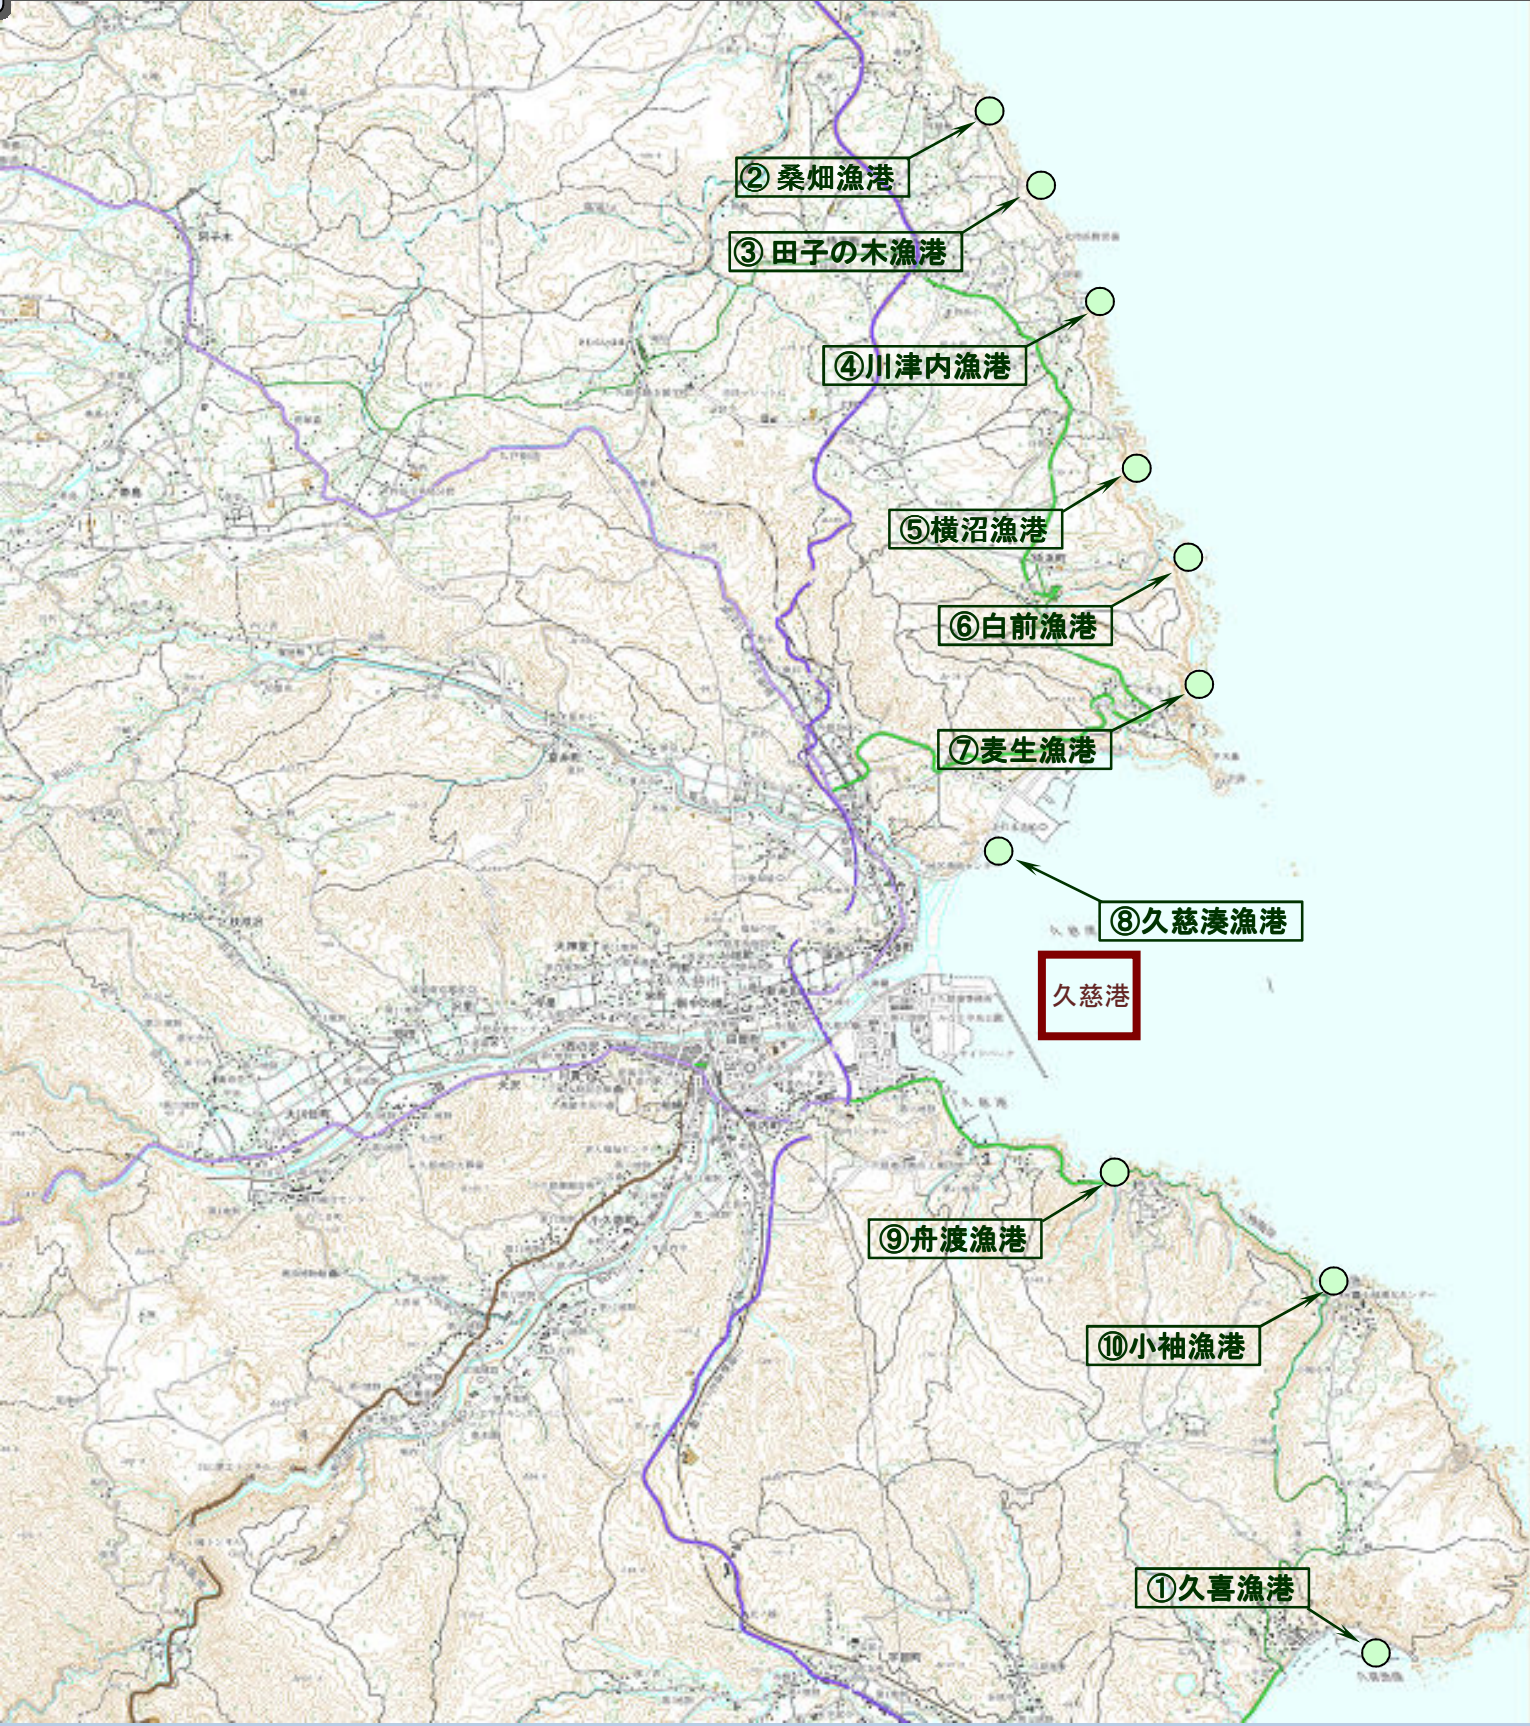


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール															
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）								
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30					
漁 港	漁 港	県	① 久喜漁港	（漁港災害） 防波堤L=162m、 岸壁L=93m 他	■H25.7完成															
			② 桑畑漁港	（漁港災害） 用地N=1式 他	■H24.1完成															
		市	③ 田子の木漁港	（漁港災害） 護岸N=1式 他	■H23.8完成															
			④ 川津内漁港	（漁港災害） 防波堤L=11m 他	■H24.3完成															
			⑤ 横沼漁港	（漁港災害） -3m岸壁N=1式 他	■H24.3完成															
			⑥ 白前漁港	（漁港災害） 防波堤L=29m 他	■H24.3完成															
			⑦ 麦生漁港	（漁港災害） 物揚場N=1式 他	■H24.3完成															
			⑧ 久慈湊漁港	（漁港災害） 航路N=1式	■H23.9完成															
			⑨ 舟渡漁港	（漁港災害） 護岸L=64m 他	■H24.5完成															
			⑩ 小袖漁港	（漁港災害） 防波堤L=150m 他	■H24.7完成															
港湾	久慈港	国	湾口防波堤	（防波堤整備・直轄災害復旧） 防波堤L=3,800m	★工事（平成40年度完成目標）															
		県	堀込地区	（災害復旧） -4.5m岸壁L=180m、 -6.0m岸壁L=497m、 -2.0m物揚場L=105m	■H26.3完成															
			諏訪下地区	（災害復旧） 諏訪下防波堤L=5.0m、 外防波堤L=L=293m、 -7.5m岸壁L=281.6m、 -10.0m岸壁L=23.7m	■H26.3完成															
			玉の脇地区	（災害復旧） 外防波堤L=297m、 北防波堤L=152m、 内防波堤L=95m、 物揚場L=51m	■H25.10完成															
			半崎地区	（災害復旧） 半崎防波堤L=23m、 波除堤L=40m、 -4.0m物揚場L=69m 船揚場L=48m	■H25.11完成															

社会資本の復旧・復興ロードマップ【野田村】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

安全・安心で活力あるむらづくり

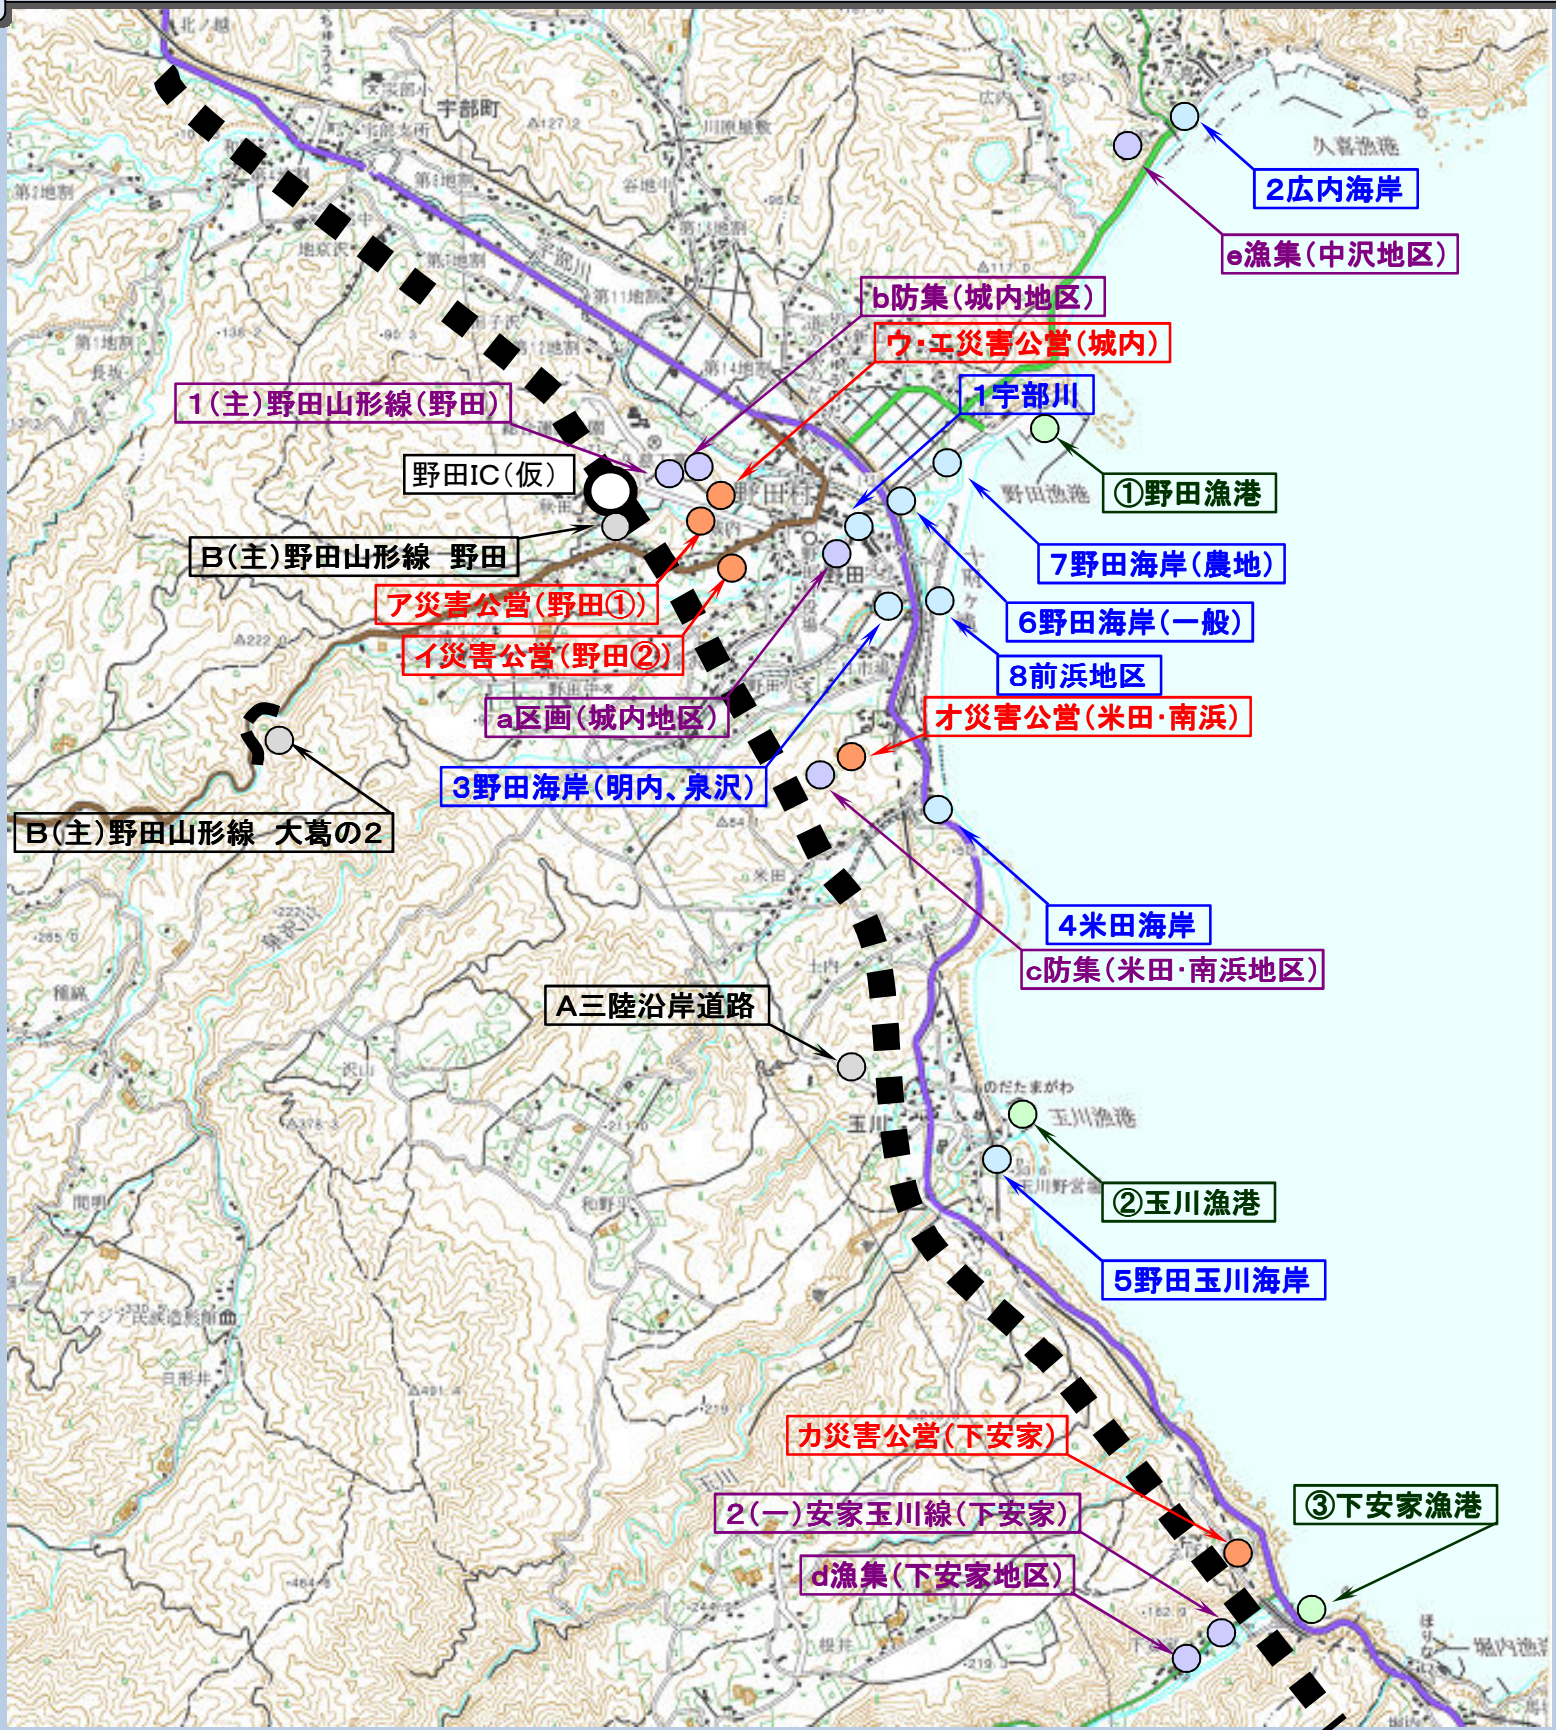

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27	H28		H29	H30
海岸保全 施設	一般海岸	県	1 宇部川	(災害復旧) 水門設備1式他	■H26.3完成									
			2 広内海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=4基他	用地、設計等			★工事						
			3 野田海岸 (明内、泉沢)	(災害復旧) 水門設備等1式他	■H25.3完成									
			4 米田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=2基他 (海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事						
			5 野田玉川海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.05km他 (海岸高潮)	■H25.5完成									
			6 野田海岸	防潮堤L=0.5km、 水門等N=1基				★工事						
	農地海岸		7 野田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤裏法面 A=2,320㎡、 水門操作室N=1棟	■H24.8完成									
	林野海岸		8 前浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=1.3km	用地、設計等			★工事						
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路 (菅代～久慈)	★用地買収、工事等 ◆H25.6.27起工式									
	復興関連道路	県	B (主) 野田山形線	大葛の2	■H25.7.2供用開始									
				野田				★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.8着工						
復興 まちづくり	土地区画整理	村	a 城内地区	区域面積: 12.9ha 対象戸数: 137戸 (民124戸・公13戸)	用地、設計等			民22戸	民13戸・公13戸	民89戸				
	防災集団移転		b 城内地区	対象戸数: 74戸 (民20戸・公54戸)				民20戸	公54戸					
			c 米田・南浜地区	対象戸数: 24戸 (民18戸・公6戸)			民18戸	公6戸	■H25.11完成					
			d 下安家地区	対象戸数: 14戸 (民13戸・公1戸)			民9戸	民4戸・公1戸	■H26.12完成					
			e 中沢地区	対象戸数: 2戸 (民2戸)				民2戸	■H27.3完成					
	まちづくり 連携道路	県	1 (主)野田山形線	野田	★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.1着工									
	2 (一)安家玉川線	下安家	★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H25.10着工											
災害公営 住宅	直接建設	県	ア 野田① (単独)	木造2階 戸数: 8戸	■H25.3完成			8戸						
			イ 野田② (単独)	木造 戸数: 18戸	■H26.1完成			18戸						
		村	ウ 城内 (区: 城内地区)	木造 戸数: 13戸				■H27.3完成	13戸					
			エ 城内 (防: 城内地区)	木造 戸数: 54戸	用地、設計等					54戸				
			オ 米田・南浜 (防: 米田・南浜地区)	木造 戸数: 6戸				■H26.7完成	6戸					
			カ 下安家 (漁: 下安家地区)	木造 戸数: 1戸				■H26.7完成	1戸					
漁 港	漁 港	県	① 野田漁港	(漁港災害) 防波堤L=125m、 岸壁L=307m 他	■H26.3完成									
		村	② 玉川漁港	(漁港災害) 防波堤L=132m、 岸壁L=50m 他	■H24.9完成									
		③ 下安家漁港	(漁港災害) 防波堤L=28m 他	■H24.9完成										

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

①堀内漁港

a漁集(堀内、沢地区)

③沢漁港

普代北IC(仮)

④白井漁港

A三陸沿岸道路

1宇留部海岸

②太田名部漁港

2・4太田名部海岸

3宇留部海岸

普代IC

⑤黒崎漁港


B(一)普代小屋瀬線 芦渡の2

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)						第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 宇留部海岸	(災害復旧) 水門設備1式 他	■H25.10完成											
			2 太田名部海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km 他	■H24.10完成											
			3 宇留部海岸	(県単治水事業) 陸間N=1基	■H25.10完成											
			4 太田名部海岸	(海岸危機) 陸間等遠隔操作化 N=2基	用地、設計等		★工事									
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	野田久慈道路 (普代～久慈)	★用地買収、工事等 ◆H25.6.27起工式											
				普代道路 (普代バイパス)	■H25.10.13供用開始											
				尾肝要普代道路 (尾肝要～普代)	★用地買収、工事等 ◆H25.11.18起工式											
	復興関連道路	県	B (一) 普代小屋瀬線	芦渡の2			★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.1.1着工									
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	村	a 堀内、沢地区	避難路			■H27.3完成									
漁港	漁港	県	① 堀内漁港	(漁港災害) 防波堤N=1式 他	■H25.10完成											
			② 太田名部漁港	(漁港災害) 防波堤L=285m、 岸壁L=36m 他	■H25.10完成											
		村	③ 沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=77m 他	■H25.7完成											
			④ 白井漁港	(漁港災害) 防波堤L=89m、 岸壁L=7m 他	■H24.6完成											
			⑤ 黒崎漁港	(漁港災害) 泊地N=1式	■H23.9完成											

社会資本の復旧・復興ロードマップ【岩泉町】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

心はひとつ いのちの海に 未来を拓く岩泉

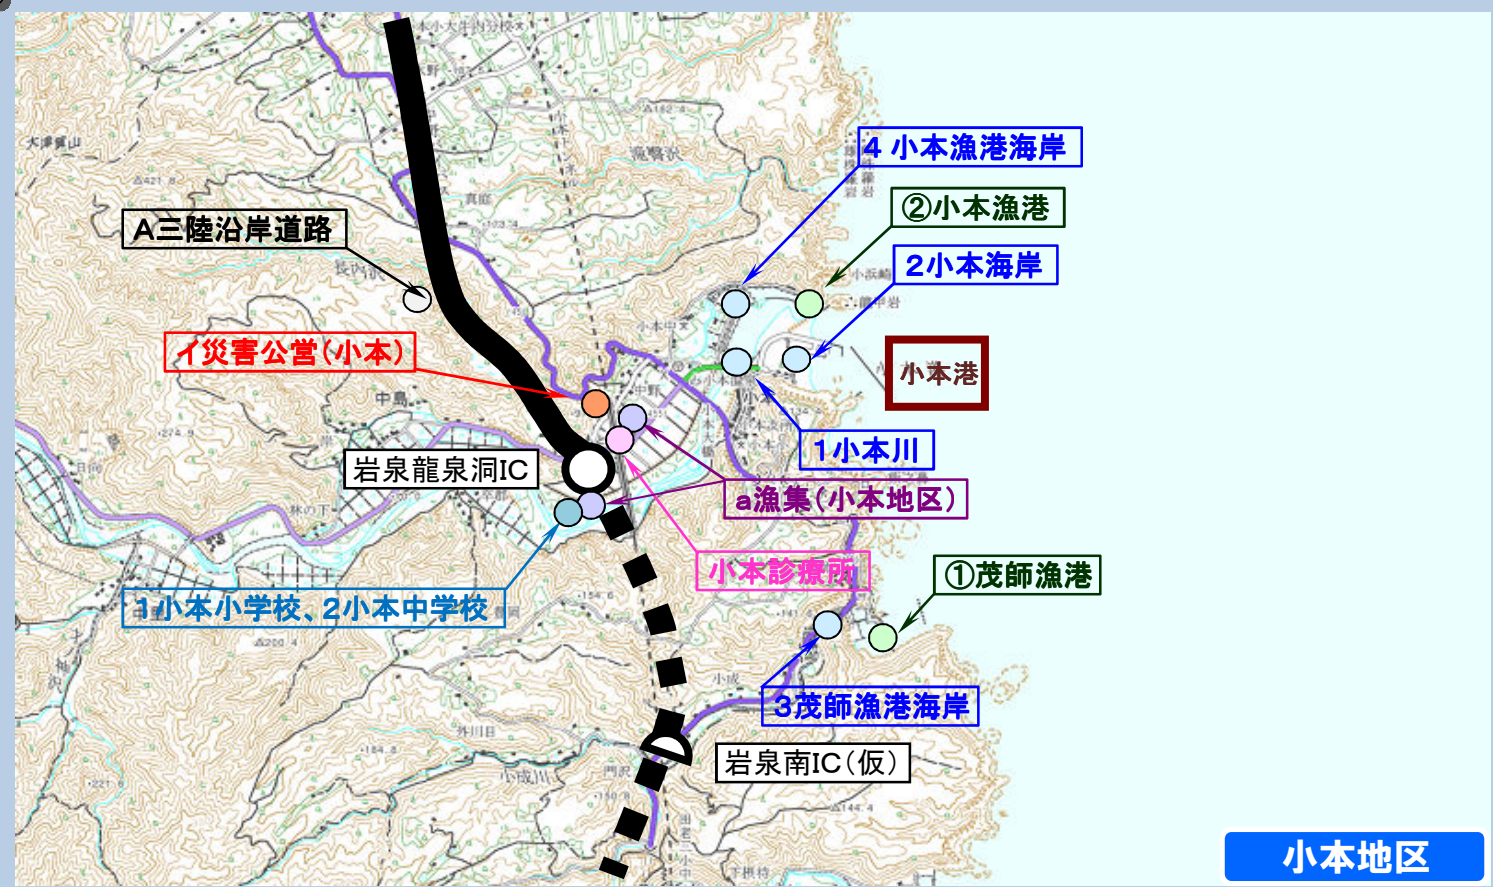

小本地区



岩泉地区



安家地区

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール							
					第1期 (基金復興期間)		第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 小本川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.2km	用地、設計等			★工事				
			2 小本海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km	■H25.3完成							
	漁港海岸	町	3 茂師漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、水門N=1基 他	用地、設計等			★工事				
			4 小本漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、水門N=1基 他	■H25.3完成							
復興道路等	復興支援助路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老北～岩泉)				★用地買収、工事等 ◆H25.3.27起工式				
			B (主) 久慈岩泉線	龍泉洞	■H24.8.28供用開始							
			大月峠		◆H25.12着工			★工事				
		C (国) 340号	押角峠	※宮古市の復興支援助路・国道340号押角峠と同一箇所				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.8着工				
復興まちづくり	漁業集落防災機能強化	町	a 小本地区	対象戸数：59戸 (民59戸)				■H27.3完成				
災害公営住宅	直接建設	町	A 森の越 (単独)	木造 戸数：15戸	■H25.5完成		15戸					
			I 小本 (単独)	木造 戸数：20戸 RC造 戸数：16戸	■H26.3完成		36戸					
漁港	漁港	県	① 茂師漁港	(漁港災害) 防波堤L=493m、岸壁L=280m 他				■H27.3完成				
		町	② 小本漁港	(漁港災害) 防波堤L=103m、岸壁L=844m 他				■H27.3完成				
港湾	小本港	県	小本浜地区	(港湾災害復旧) 防波堤L=871m、岸壁L=119m、物揚場L=105m他				■H27.9完成				
医療	医科診療所	町	小本診療所	診療所施設整備					■H27.12完成			
教育	小学校	町	1 小本小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等			★工事			〔移転完了まで仮設校舎を使用〕	
	中学校		2 小本中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等			★工事			〔移転完了まで仮設校舎を使用〕	

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市1/4】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27		H28	H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 摂待海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.1km、 水門N=1基	用地、設計等			★工事							
			2 田老海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門等N=4基		★工事									
				(海岸危機) 水門等遠隔操作化 N=1基	用地、設計等			★工事							
			3 神林海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門等N=7基	用地、設計等	★工事									
				(海岸危機) 陸間等遠隔操作化 N=1基	用地、設計等			★工事							
			4 高浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 陸間等N=4基		★工事									
				(港湾高潮) 防潮堤L=0.9km	用地、設計等	★工事									
				(海岸危機) 陸間等遠隔操作化 N=4基	用地、設計等			★工事							
			5 金浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.2km、 陸間等N=5基	用地、設計等			★工事							
			6 赤前海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 樋門N=1基		★工事									
			7 里海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 樋門N=1基		★工事									
			8 宮古港海岸 (藤原)	(港湾高潮・災害) 防潮堤L=2.2km、 陸間N=4基	用地、設計等	★工事									
			9 宮古港海岸 (高浜)	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 陸間N=1基	用地、設計等	★工事									
	10 宮古港海岸 (鍛ヶ崎)	(港湾高潮) 防潮堤L=1.6km	用地、設計等			★工事									
	11 田代川	(災害復旧) 水門N=1基	用地、設計等	★工事											
	12 閉伊川	(災害復旧) 水門N=1基	用地、設計等			★工事 H32完成予定									
	13 津軽石川	(三陸高潮) 防潮堤L=0.9km		★工事											
	農地海岸		14 宮古大沢海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.1km 水門等N=3基		★工事									
			15 摂待地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=0.3km		■H26.7完成									
漁港海岸	市	16 田老 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.0km、 水門N=4基 他	用地、設計等			★工事								
		17 宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事										
		18 津軽石 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事										
		19 白浜(宮古) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事										

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市2/4】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

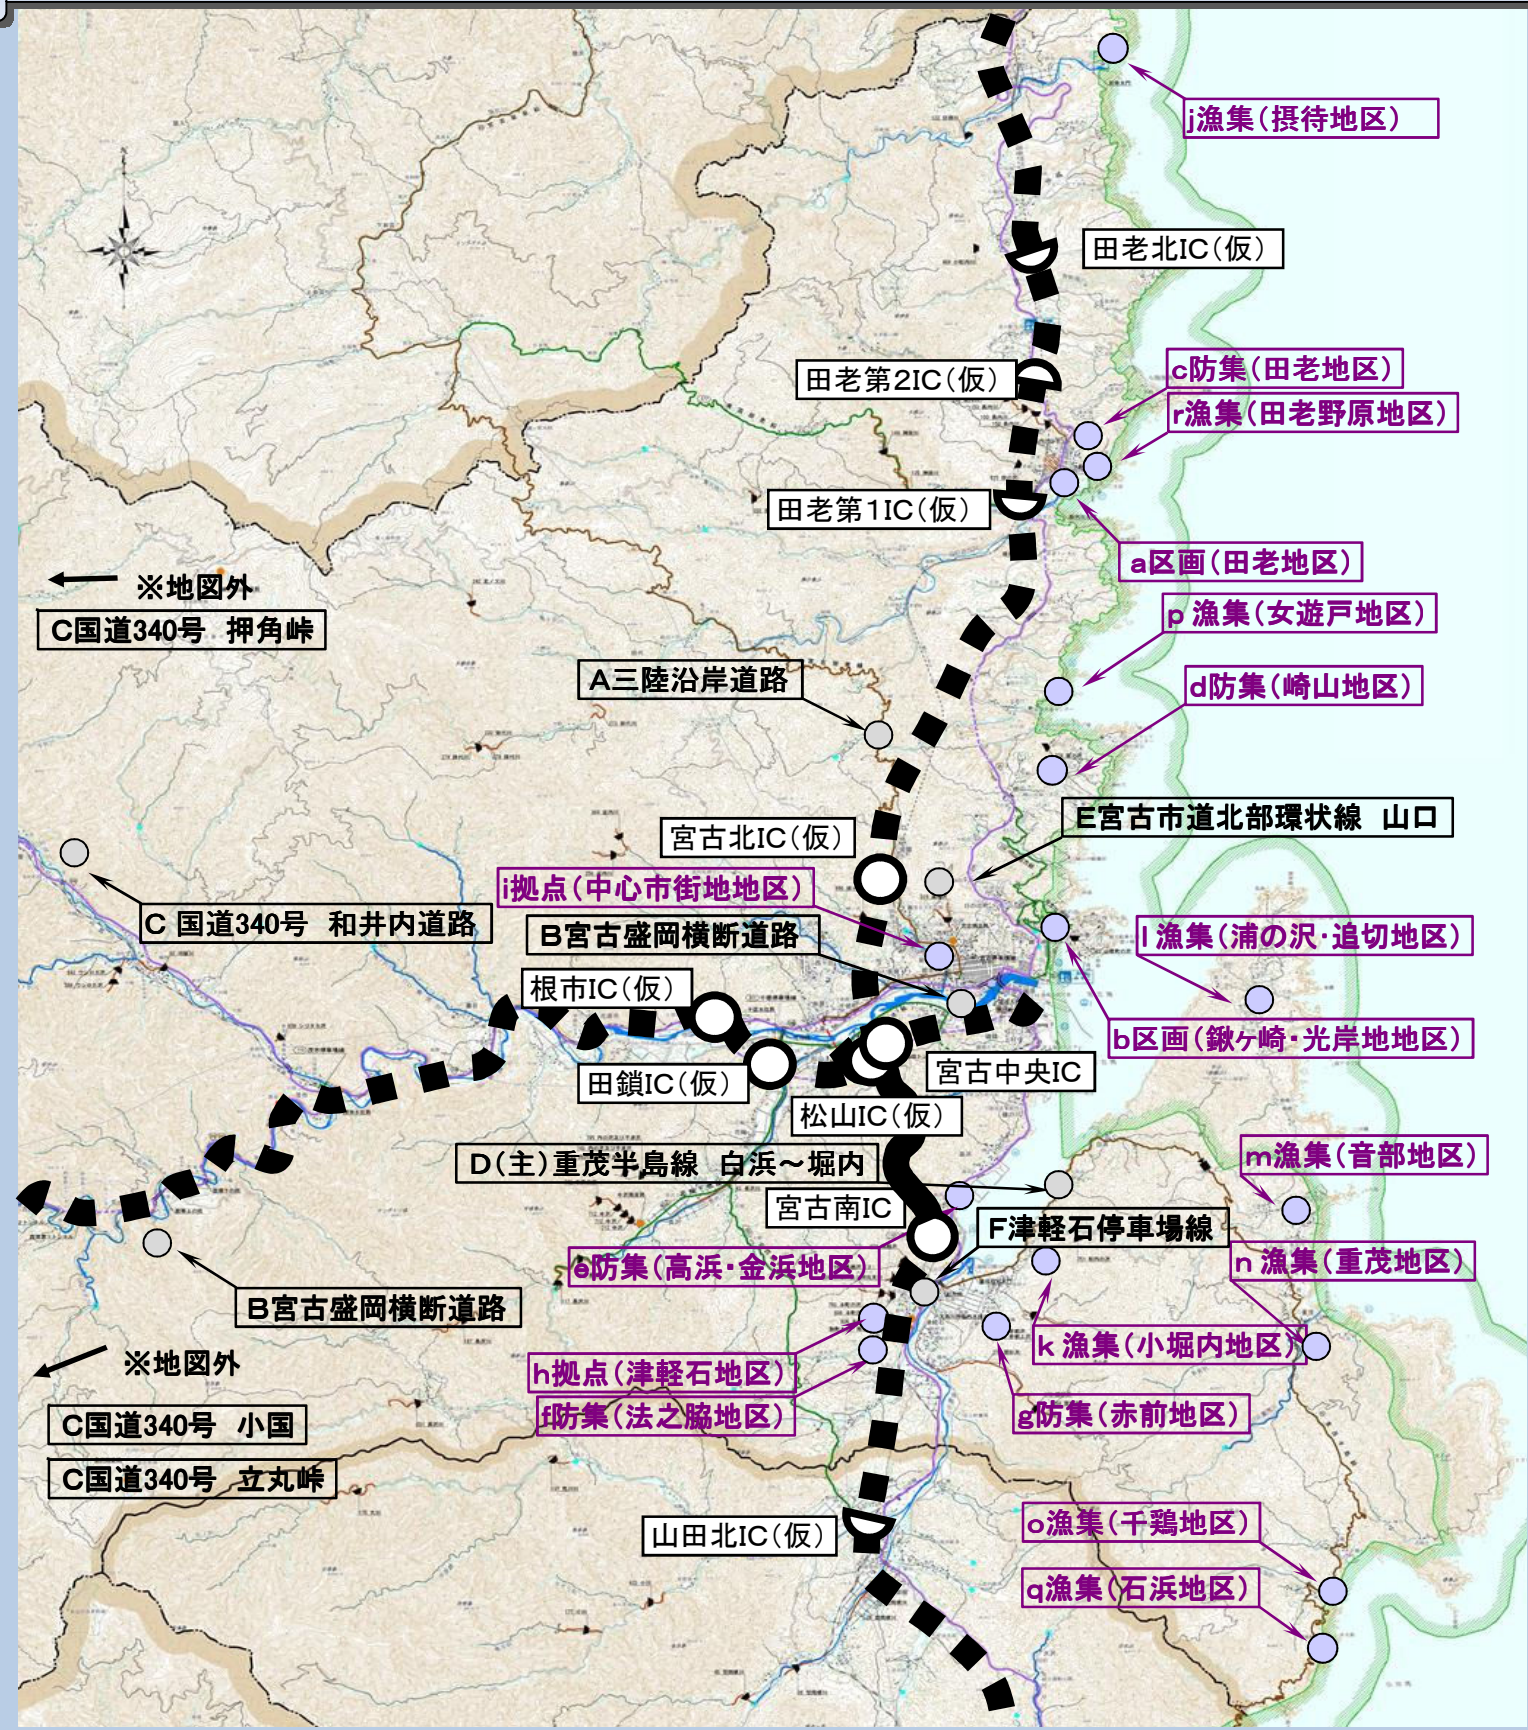


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール												
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)					
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30		
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	田老岩泉道路 (田老北～岩泉)	★用地買収、工事等 ◆H25.3.27起工事												
				宮古田老道路 (宮古中央～田老北)	◆H24.11.18起工事	★用地買収、工事等 ※田老第2IC～田老北IC H29開通予定、宮古中央IC～田老第2IC H32開通予定											
				宮古道路 (宮古中央インター線)	■H25.3.23「宮古中央インター線(千徳大橋)」供用開始												
				山田宮古道路 (山田～宮古南)	★用地買収、工事等 ◆H25.6.17起工事												
			B 宮古盛岡 横断道路	宮古箱石道路 (宮古～箱石)	◆H25.11.30起工事	★用地買収、工事等 ※宮古市下川井地区 H31開通予定、宮古市藤原～松山IC H32開通予定											
				平津戸松草道路 (平津戸・岩井～松草)	★用地買収、工事等 ◆H26.8.24起工事												
				区界道路 (区界～築川)	★用地買収、工事等 ◆H26.8.24起工事												
				宮古西道路	★用地買収、工事等												
			復興支援道路	県	小国	■H25.11.29供用開始											
					和井内道路	★工事											
	立丸峠	◆H26.3着工			★工事												
	押角峠	★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.8着工															
	復興関連道路	県	D (主) 重茂半島線	白浜～堀内	■H27.3.31供用開始												
			E 宮古市道 北部環状線	山口	★工事												
			F (一) 津軽石停車場線	津軽石	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手												
			復興まちづくり	市	a 田老地区	区域面積：19.0ha 対象戸数：220戸 (民180戸・公40戸)	民64戸 民116戸・公40戸 用地、設計等 ★工事										
						b 鎌ヶ崎・ 光岸地地区	区域面積：23.8ha 対象戸数：270戸 (民230戸・公40戸)	民12戸 民114戸・公40戸 民104戸 用地、設計等 ★工事									
							c 田老地区	対象戸数：232戸 (民161戸・公71戸)	民161戸・公71戸 ■H27.9完成								
	d 崎山地区 (大付)	対象戸数：30戸 (民6戸・公24戸)						民6戸 公24戸 ■H25.12完成									
	e 高浜・金浜 地区	対象戸数：52戸 (民40戸・公12戸)			用地、設計等 ★工事 民39戸完成、民1戸整備保留												
f 法之脇地区 (津軽石)		対象戸数：12戸 (民12戸)			民12戸 ■H26.3完成												
g 赤前地区		対象戸数：46戸 (民46戸)			民19戸 民23戸 民4戸 用地、設計等 ★工事 ※民42戸完成、民4戸整備保留												
h 津軽石地区		区域面積：約1.2ha			用地、設計等 ★工事												
	i 中心市街地 地区	区域面積：約1.6ha			用地、設計等 工事												
	漁業集落防災 機能強化	市			j 摂待地区	対象戸数：3戸 (民3戸)	民3戸 ■H25.7完成										
			k 小堀内地区	対象戸数：2戸 (民2戸)	民2戸 ■H26.3完成												
l 浦の沢・ 追切地区			対象戸数：2戸 (民2戸)	民2戸 ■H25.3完成													
m 音部地区			対象戸数：3戸 (民3戸)	民3戸 ■H26.7完成													
n 重茂地区			対象戸数：21戸 (民17戸・公4戸)	民16戸 民1戸、公4戸 ■H27.3完成													
o 千鶴地区			対象戸数：3戸 (民3戸)	民3戸 ■H25.12完成													
p 女遊戸地区			集落道他	民2戸 用地、設計等 ★工事													
q 石浜地区			対象戸数：2戸 (民2戸)	■H26.7完成													
r 田老野原地区	集落道、用地造成	用地、設計等 工事															

社会資本の復旧・復興ロードマップ【宮古市3/4】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

市民生活の安定と再建 安全で快適な生活環境の実現

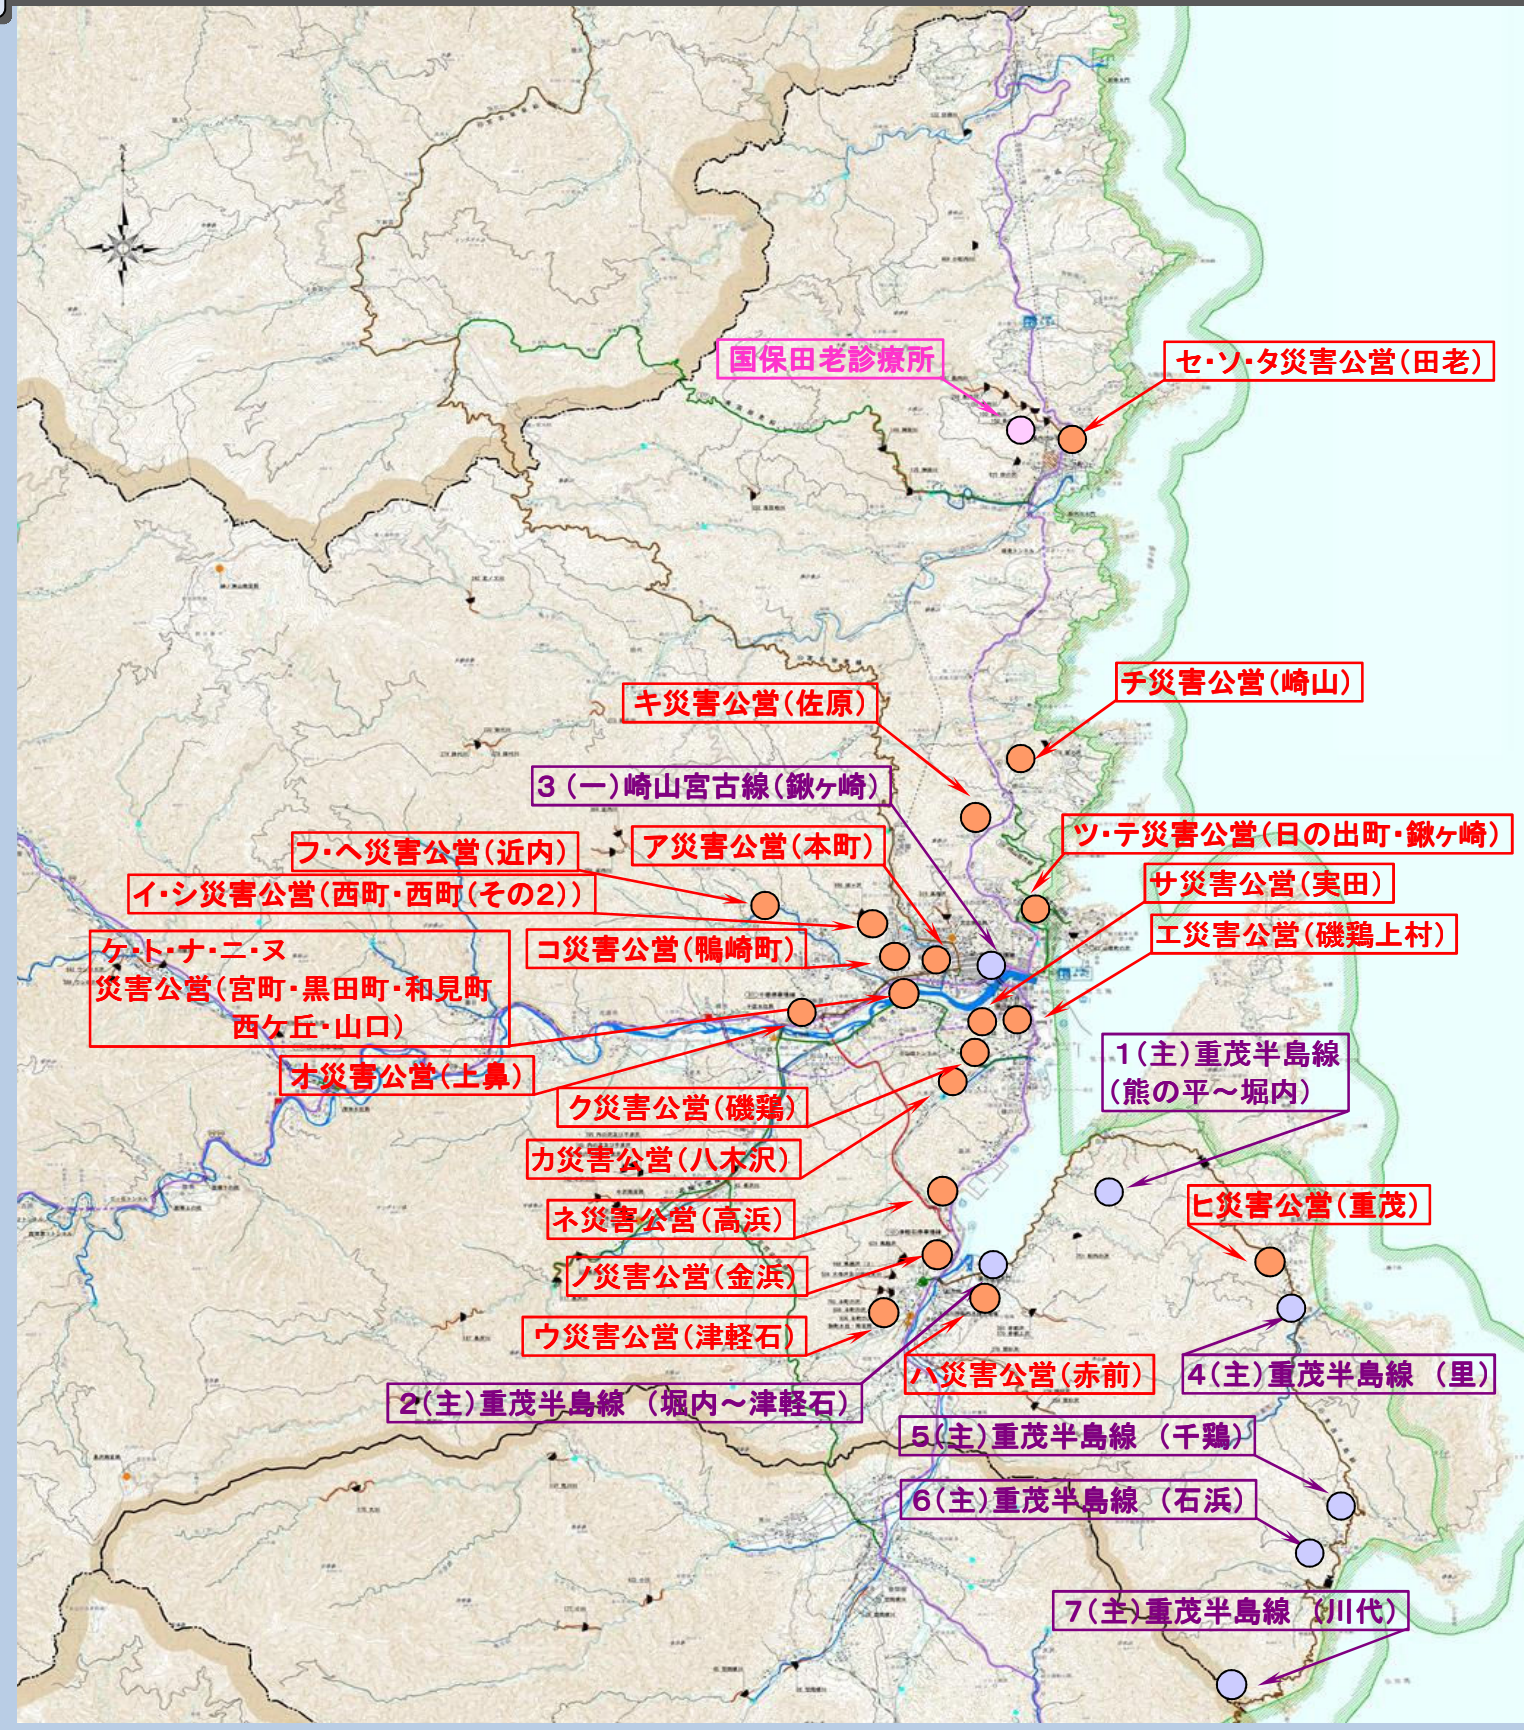


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (主)重茂半島線	熊の平～堀内		★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.10着工									
			2 (主)重茂半島線	堀内～津軽石		★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.12着工									
			3 (一)崎山宮古線	鍛ヶ崎		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
			4 (主)重茂半島線	里		★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.9着工									
			5 (主)重茂半島線	千鷲		★工事 ◆H27.8着工									
			6 (主)重茂半島線	石浜		測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									
			7 (主)重茂半島線	川代		★工事 ◆H27.9着工									
災害公営 住宅	直接建設	県	ア 本町 (単独)	RC造8階 戸数:34戸							■H27.9完成	34戸			
			イ 西町 (単独)	RC造4階 戸数:23戸						■H27.6完成			23戸		
			ウ 津軽石 (単独)	RC造5階 戸数:35戸						■H27.7完成			35戸		
			エ 磯鷄上村 (単独)	RC造4階 戸数:24戸					用地、設計等	★工事			24戸		
			オ 上鼻 (単独)	RC造4階 戸数:24戸						■H27.7完成			24戸		
			カ 八木沢 (単独)	RC造5階 戸数:42戸						■H27.10完成			42戸		
			キ 佐原 (単独)	RC造5階 戸数:50戸						■H27.2完成	50戸				
	敷地提案型 買収	県	ク 磯鷄 (単独)	S造2階 戸数:30戸						■H27.3完成	30戸				
			ケ 宮町 (単独)	S造3階 戸数:20戸						■H27.3完成	20戸				
			コ 鴨崎町 (単独)	S造3階 戸数:20戸						■H27.9完成			20戸		
			サ 実田 (単独)	S造3階 戸数:17戸						■H27.7完成			17戸		
			シ 西町(その2) (単独)	RC造5階 戸数:30戸						■H27.6完成			30戸		
			セ 田老(高台) (防:田老地区)	木造 戸数:36戸						■H27.10完成			36戸		
			ソ 田老 (区:田老地区)	RC造5階 戸数:40戸						■H27.11完成			40戸		
	直接建設	市	タ 田老(高台Ⅱ) (防:田老地区)	木造 戸数:35戸					用地、設計等	★工事			35戸		
			チ 崎山 (防:崎山地区)	RC造4階 戸数:24戸						■H27.3完成	24戸				
			ツ 日の出町 (単独)	木造2階 戸数:26戸						■H27.4完成			26戸		
			テ 鍛ヶ崎 (区:鍛ヶ崎地区)	RC造5階 戸数:40戸						■H27.12完成			40戸		
			ト 黒田町 (単独)	RC造5階 戸数:24戸						■H27.8完成			24戸		
			ナ 和見町 (単独)	RC造5階 戸数:23戸						■H27.3完成	23戸				
			ニ 西ヶ丘 (単独)	RC造4階 戸数:24戸						■H27.4完成			24戸		
			ヌ 山口 (単独)	RC造4階 戸数:23戸					用地、設計等	★工事			23戸		
			ネ 高浜 (単独)	木造2階 戸数:12戸						■H26.4完成			12戸		
			ノ 金浜 (防:金浜地区)	木造2階 戸数:12戸						■H27.11完成			12戸		
			ハ 赤前 (単独)	木造2階 戸数:14戸						■H26.11完成			14戸		
			ヒ 重茂 (漁:重茂地区)	木造 戸数:4戸						■H27.6完成			4戸		
			買収	市	フ 近内① (単独)	RC造5階 戸数:40戸					■H26.3完成			40戸	
					ヘ 近内② (単独)	RC造5階 戸数:40戸						■H27.3完成			40戸
医 療	医科診療所	市	国保田老診療所	診療所施設整備						用地、設計等	★工事				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町1/3】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

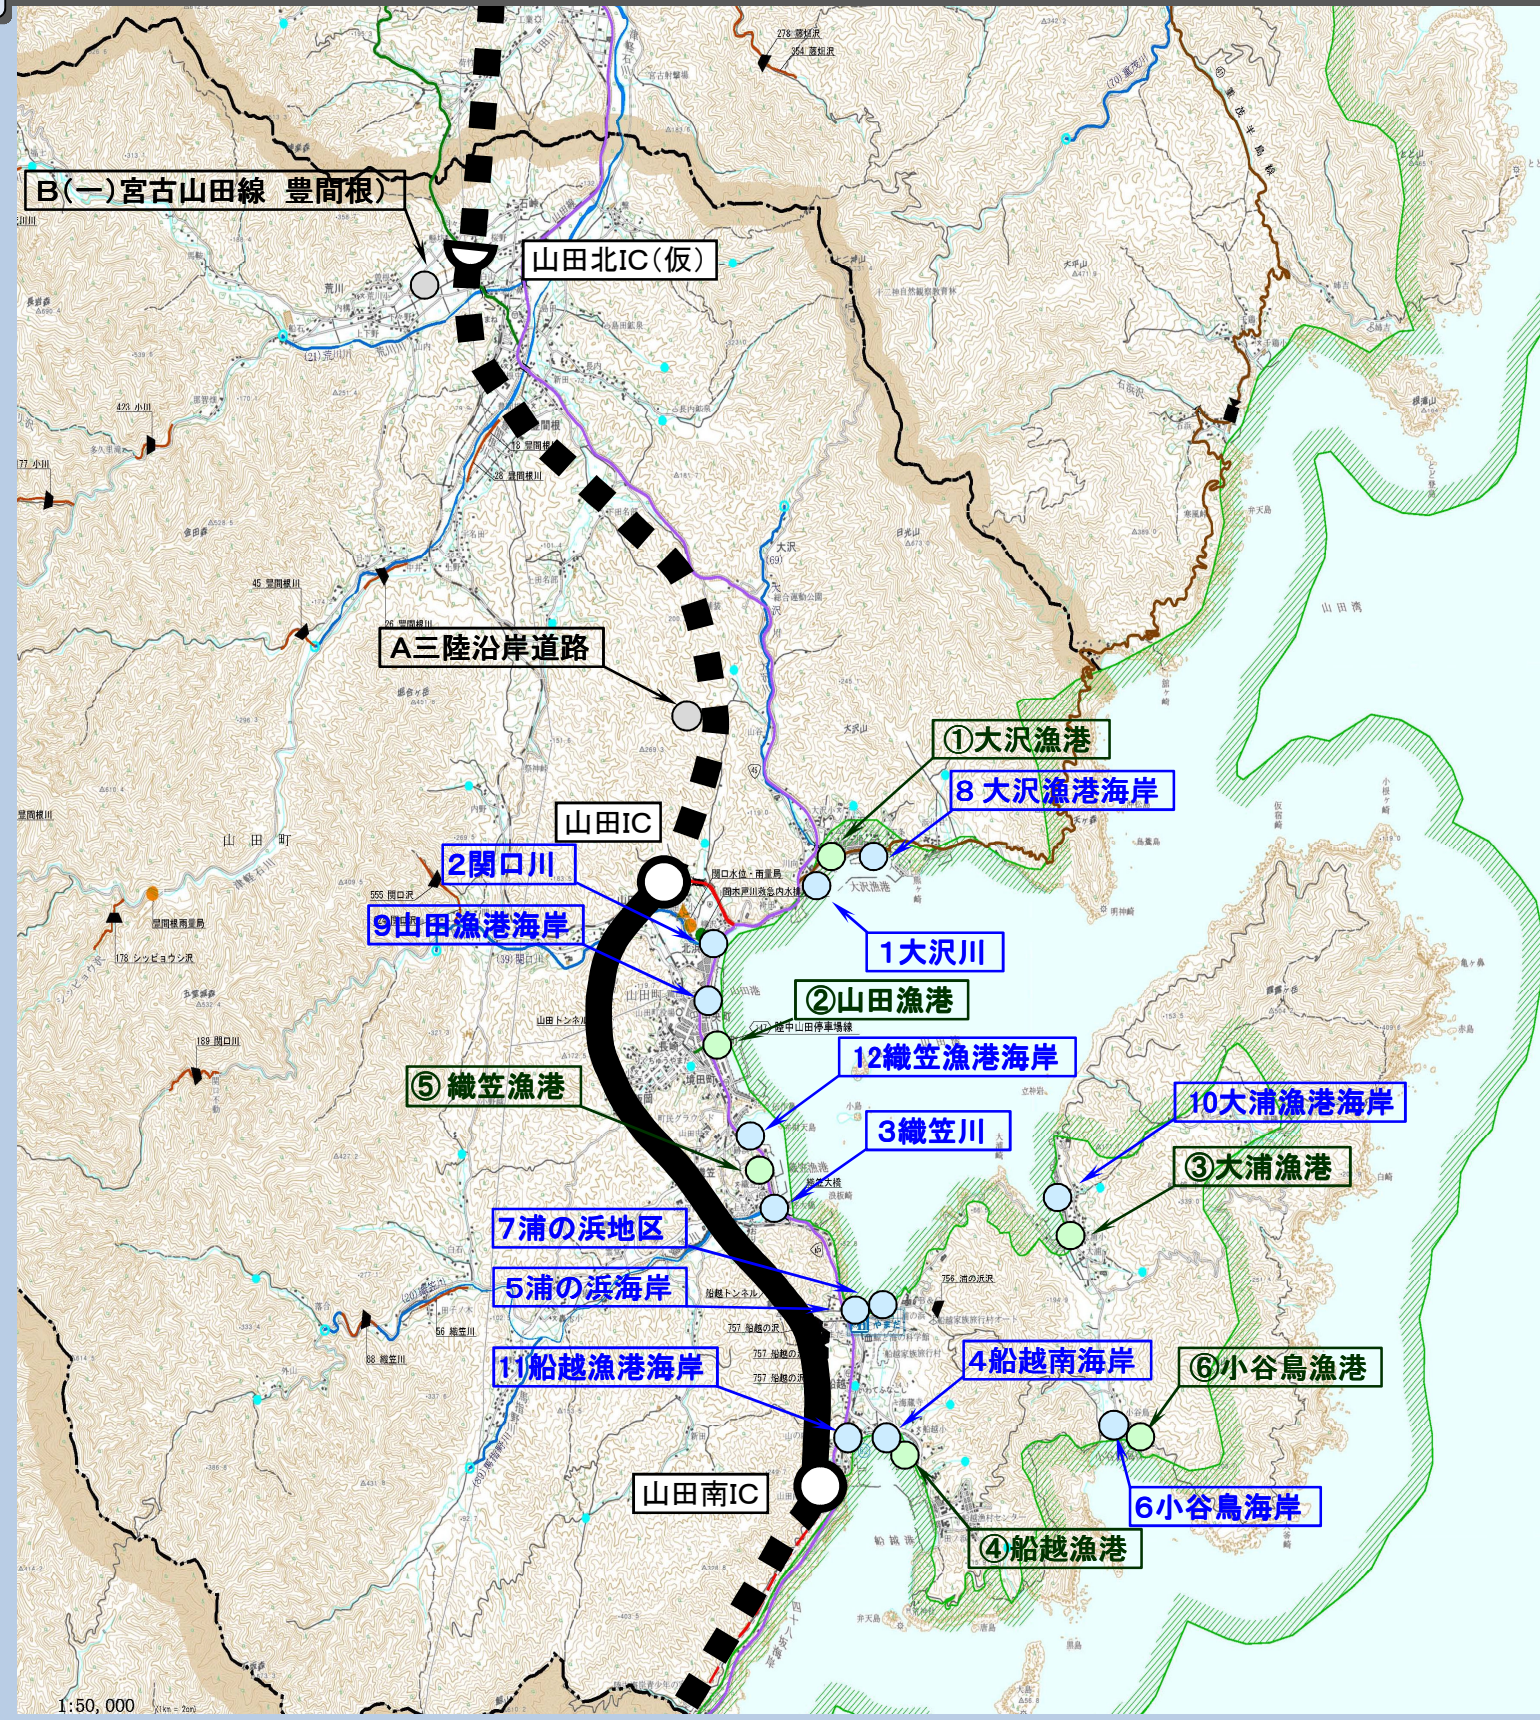


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27	H28		H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大沢川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等			★工事						
			2 関口川	(三陸高潮) 水門N=1基	★工事									
			3 織笠川	(三陸高潮) 水門N=1基	★工事									
			4 船越南海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			★工事						
	農地海岸		5 浦の浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=1基	★工事									
			6 小谷鳥海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.4km 水門等N=3基	★工事									
	林野海岸		7 浦の浜地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H25.3完成									
	漁港海岸		8-1 大沢漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=9基 他	用地、設計等			★工事						
			8-2 大沢 (熊ヶ崎地区他)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.4km	用地、設計等			工事						
			9-1 山田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.9km、 水門N=1基 他	用地、設計等			★工事						
			9-2 山田 (柳沢地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.5km	用地、設計等			工事						
			10 大浦漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.7km、 水門N=6基 他	用地、設計等			★工事						
			11 船越漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=6基 他	用地、設計等			★工事						
	町	12 織笠漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=2基 他	用地、設計等		★工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	山田宮古道路 (山田～宮古南)	★用地買収、工事等 ◆H25.6.17起工式									
				釜石山田道路	★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30開通予定									
	復興支援道路	県	B (一) 宮古山田線	豊間根	★工事 ◆H27.3着工									
漁港	漁港	県	① 大沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,360m、 岸壁L=1,417m 他	■H27.3完成									
			② 山田漁港	(漁港災害) 防波堤L=913m、 岸壁L=2,376m 他	★工事									
			③ 大浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=424m、 岸壁L=1,286m 他	★工事									
			④ 船越漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,398m、 岸壁L=2,346m 他	★工事									
		町	⑤ 織笠漁港	(漁港災害) 防波堤L=628m、 岸壁L=675m 他	★工事									
			⑥ 小谷鳥漁港	(漁港災害) 防波堤L=348m、 岸壁L=176m 他	★工事									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【山田町2/3】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

みんなで取り戻す、ひとの笑顔、元気な産業、碧い海とともに暮らす町

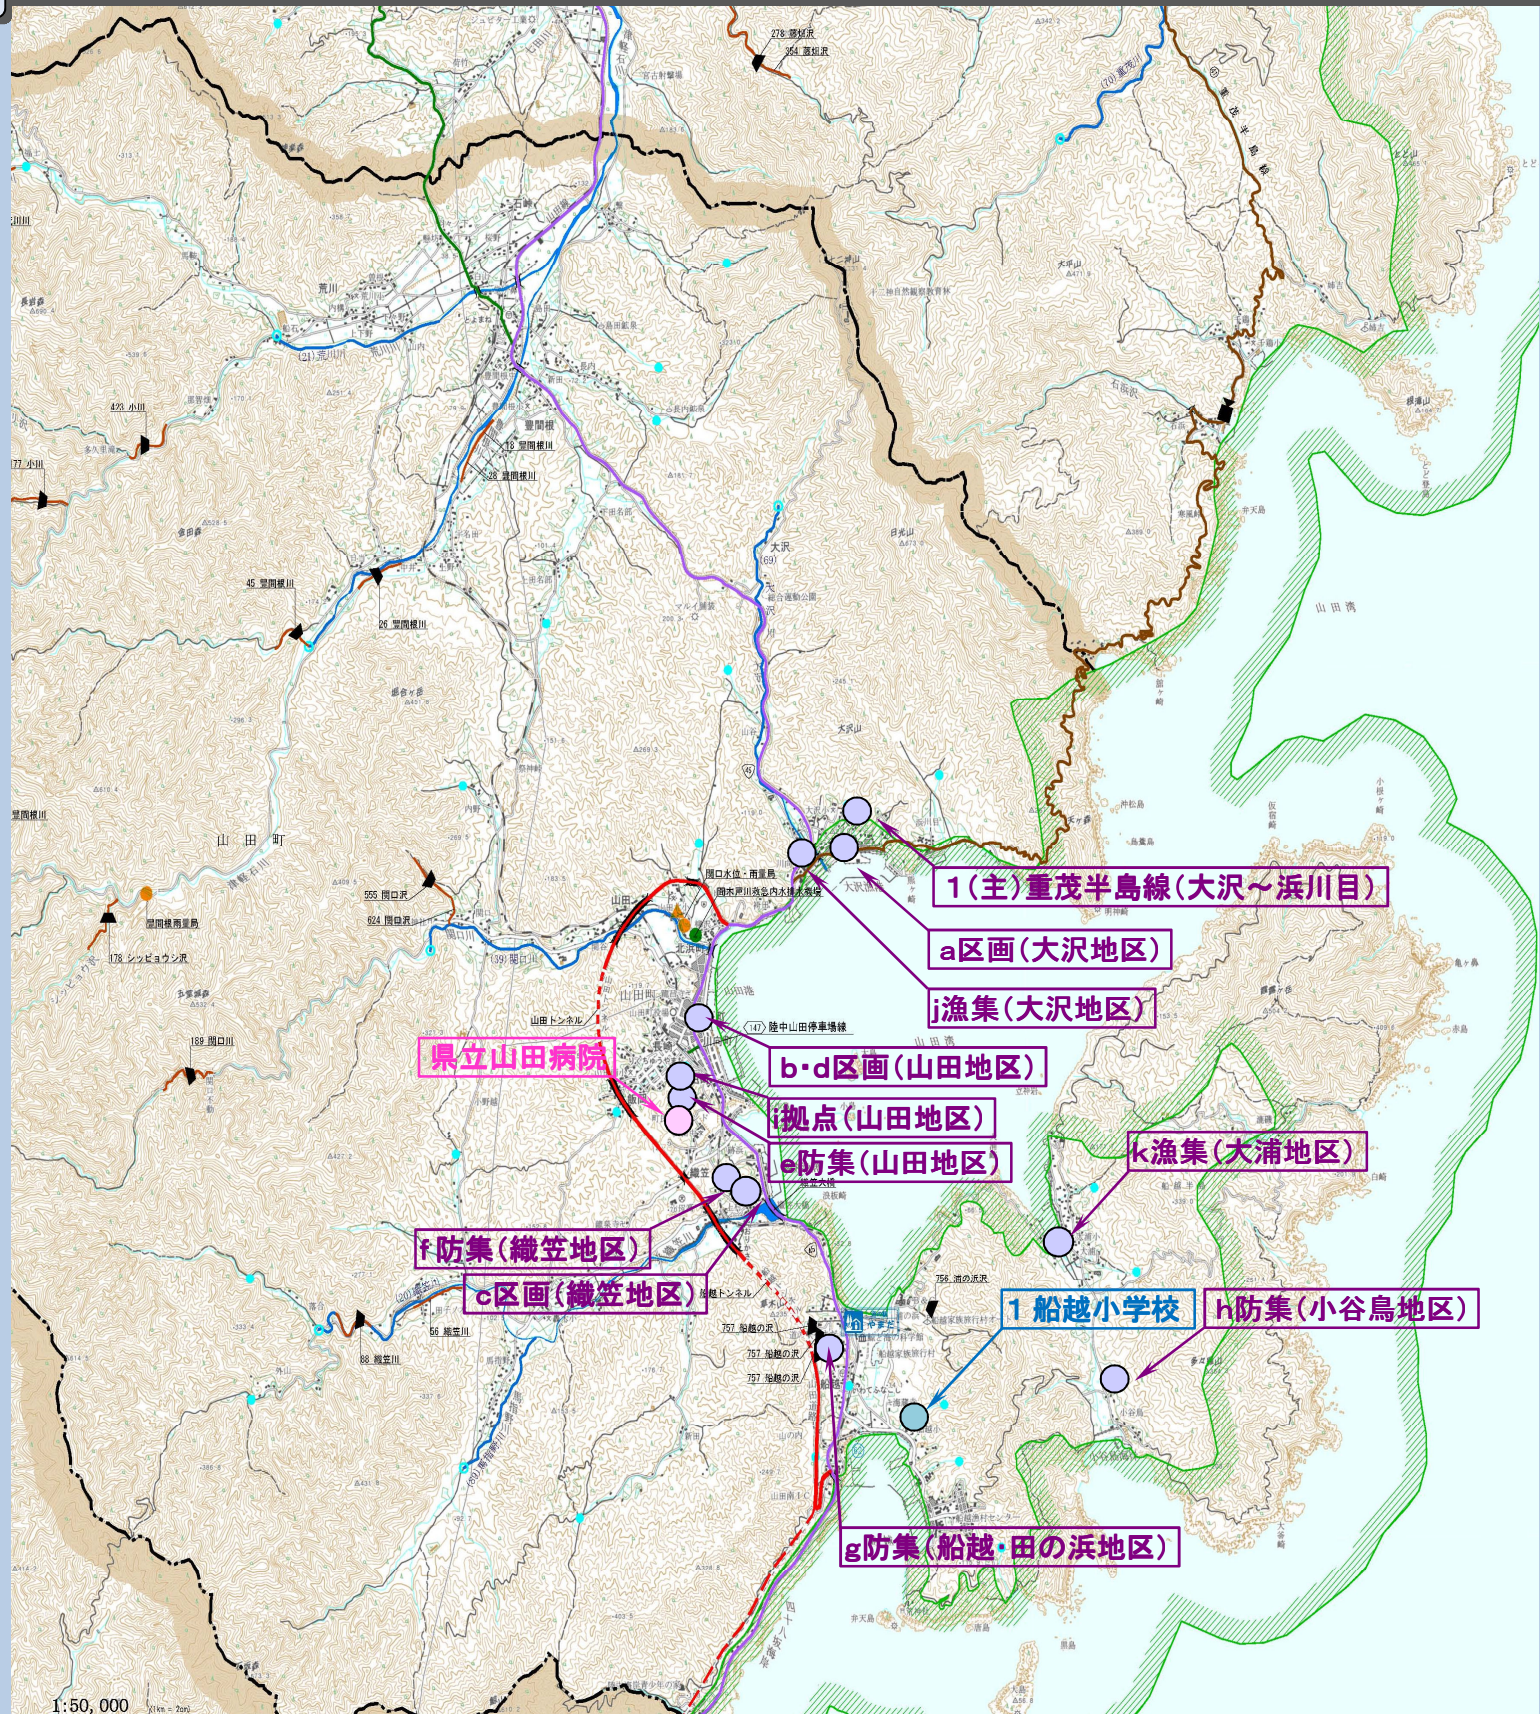

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）				第3期 （更なる展開への連結期間）		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	土地区画整理	町	a 大沢地区	区域面積：6.5ha 対象戸数：139戸 （民139戸）	用地、設計等			★工事				民139戸		
			b 山田地区	区域面積：20.3ha 対象戸数：621戸 （民475戸・公146戸）	用地、設計等			★工事				公146戸	民475戸	
			c 織笠地区	区域面積：2.5ha 対象戸数：47戸 （民47戸）	用地、設計等			★工事				民47戸		
			d 山田 国道45号周辺地区	区域面積：20.0ha	用地、設計等			★工事						
	防災集団移転	町	e 山田地区	対象戸数：200戸 （民142戸・公58戸）	用地、設計等			★工事				民142戸	公58戸	
			f 織笠地区	対象戸数：170戸 （民148戸・公22戸）	用地、設計等			★工事				民60戸	民88戸・公22戸	
			g 船越・ 田の浜地区	対象戸数：225戸 （民146戸・公79戸）	用地、設計等			★工事				民117戸	民29戸・公37戸	公42戸
			h 小谷島地区	対象戸数：4戸 （民4戸）				■H26.9完成						
	津波復興拠点	町	i 山田地区	（中心市街地エリア） 区域面積：3.1ha	用地、設計等			★工事						
				（公共防災エリア） 区域面積：2.7ha	用地、設計等			★工事						
	漁業集落防災 機能強化	町	j 大沢地区	対象戸数：155戸 （民135戸・公20戸）	用地、設計等			★工事				民34戸	民101戸・公20戸	
			k 大浦地区	対象戸数：8戸 （民8戸）				■H27.6完成				民5戸		
	まちづくり 連携道路	県	1（主）重茂半島線	大沢～浜川目				◆H26.12着工 ★工事						
医 療	病院	県	県立山田病院	織笠地区山田中学校北側町有地				用地、設計等 ★工事						
教 育	小学校	町	1 船越小学校	（災害復旧） 移転	■H26.3完成									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町^{1/3}】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

海に見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)					第3期 (更なる展開への連結期間)	
					H23	H24	H25	H26		H27		H28	H29	H30
海岸保全施設	一般海岸	県	1 大槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門等N=1基	用地、設計等	★工事 H31完成予定								
			2 小槌川	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=1基	用地、設計等	★工事 H31完成予定								
	林野海岸		3 浪板地区	(治山施設災害) 防潮堤L=0.4km	■H24.10完成									
	漁港海岸		4 吉里吉里 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=4基 他	用地、設計等	★工事								
			5 大槌漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.7km、 水門N=3基 他	用地、設計等	★工事								
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30開通予定									
	復興関連道路	県	B (主) 大槌小国線	土坂の3	★工事									
漁港	漁港	県	① 吉里吉里漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=753m 他	用地、設計等	★工事								
			② 大槌漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,486m、 岸壁L=2,582m 他	用地、設計等	★工事								
医療	病院	県	県立大槌病院	寺野地区ふれあい 運動公園内	用地、設計等	★工事								
教育	小学校	町	大槌小学校 安渡小学校 赤浜小学校 大槌北小学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等	H25 小学校4校統合(新校名:大槌小学校) 移転完了まで仮設校舎を使用。								
	中学校		大槌中学校	(災害復旧) 移転	用地、設計等	移転完了まで仮設校舎を使用。								
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (一)吉里吉里 金石線	赤浜	測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手									

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基準年度期間)			第2期 (本格実施期間)				第3期 (要なる箇所への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	土地区画整理		a 町方地区	区域面積: 29.6ha 対象戸数: 825戸 (民510戸・公315戸)	用地、設計等			★工事						
			b 安渡地区	区域面積: 6.0ha 対象戸数: 190戸 (民110戸・公80戸)	用地、設計等			★工事				公13戸 民110戸・公58戸		
			c 赤浜地区	区域面積: 7.7ha 対象戸数: 98戸 (民98戸)	用地、設計等			★工事				民98戸		
			d 吉里吉里地区	区域面積: 9.1ha 対象戸数: 212戸 (民184戸・公28戸)	用地、設計等			★工事				民19戸・公10戸		
	津波復興拠点		e 町方地区	区域面積 町方地区 (4.4ha)	用地、設計等	★工事								
			f 安渡地区	区域面積 安渡地区 (19.6ha)	用地、設計等			★工事						
			g 赤浜地区 (赤浜①団地)	対象戸数: 29戸 (民18戸・公11戸)	用地、設計等			★工事				民18戸		
			h 赤浜地区 (赤浜②団地)	対象戸数: 33戸 (民23戸・公10戸)	用地、設計等			★工事				民23戸・公10戸		
	町		i 赤浜地区 (赤浜⑥団地)	対象戸数: 35戸 (民13戸・公22戸)	用地、設計等			★工事				民13戸・公22戸		
			j 吉里吉里地区 (吉里吉里①団地)	対象戸数: 18戸 (民18戸)	民2戸	■H27.7完成			民16戸					
			k 吉里吉里地区 (吉里吉里②団地)	対象戸数: 35戸 (民35戸)	用地、設計等			★工事				民35戸		
			l 吉里吉里地区 (吉里吉里③団地)	対象戸数: 13戸 (民13戸)	用地、設計等			★工事				民13戸		
			m 浪板地区 (浪板①団地)	対象戸数: 11戸 (民11戸)	■H27.6完成			民11戸						
			n 安渡地区	対象戸数: 4戸 (民4戸)	用地、設計等			★工事				民4戸		
			o 安渡地区 (安渡①団地)	対象戸数: 28戸 (民28戸)	用地、設計等			★工事				民28戸		
			p 安渡地区 (安渡②団地)	対象戸数: 12戸 (民12戸)	用地、設計等			★工事				民12戸		
			q 安渡地区 (安渡③団地)	対象戸数: 10戸 (民10戸)	用地、設計等			★工事				民10戸		
			r 安渡地区 (安渡④団地)	対象戸数: 19戸 (民19戸)	用地、設計等			★工事				民19戸		
	防災集団移転		s 町方・小枕・ 伸松地区 (寺野臼澤団地)	対象戸数: 141戸 (民100戸・公41戸)	用地、設計等			★工事				民42戸 民24戸・公16戸 公11戸 民34戸・公14戸		
			t 町方・小枕・ 伸松地区 (大ヶ口、沢山、夏木、 椎内、屋敷前団地)	対象戸数: 66戸 (民66戸)	民4戸	用地、設計等			★工事				民37戸 民25戸	
			u 町方・小枕・ 伸松地区 (町方団地)	対象戸数: 38戸 (民38戸)	用地、設計等			★工事				民7戸 民3戸 民28戸		
			v 町方・小枕・ 伸松地区 (小枕団地)	対象戸数: 24戸 (民24戸)	用地、設計等			★工事				民24戸		
			w 町方・小枕・ 伸松地区 (花輪田地区)	対象戸数: 10戸 (民10戸)	■H27.1完成			民10戸						
			z 吉里吉里地区	漁業集落排水施設他	用地、設計等			★工事						
			aa 浪板地区	対象戸数: 21戸 (民10戸・公11戸)	用地、設計等			★工事				民10戸 公11戸		
			ab 安渡地区	集落道他	用地、設計等			工事						
			ac 赤浜地区	対象戸数: 2戸 (民2戸)	用地、設計等、工事			★工事				民2戸		
			漁業集落防災 機能強化				用地、設計等			★工事				
		用地、設計等			★工事									

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大槌町3/3】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

海が見える つい散歩したくなる こだわりのある「美しいまち」



分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
県	直接建設	ア	吉里吉里(単独)	RC造5階 戸数:34戸	■H25.8完成									
			イ 大槌(桎内)(単独)	木造 戸数:24戸				用地、設計等	★工事					
			ウ 大槌(屋敷前)(単独)	RC造5階 戸数:151戸					■H27.10完成					
	買収	エ	安渡(区:安渡地区)	RC造5階 戸数:34戸				用地、設計等・工事			工事			
			オ 三枚堂(単独)	木造 戸数:104戸				用地、設計等・工事			工事			
	直接建設	カ	町方1(戸建)(区:町方地区)	木造 戸数:32戸				用地、設計等・工事				工事		32戸
			カ 町方1(共同)(区:町方地区)	RC造 戸数:25戸				用地、設計等・工事				工事		25戸
	買収	キ	町方2(戸建)(区:町方地区)	木造 戸数:56戸				用地、設計等・工事				工事		56戸
			キ 町方2(共同)(区:町方地区)	RC造 戸数:23戸				用地、設計等・工事				工事		23戸
	直接建設													
町	買収	ク	大ケロ(単独)	木造 戸数:70戸	■H25.8完成									
			ケ 屋敷前(単独)	木造 戸数:21戸	■H25.11完成									
			コ 大ケロ2丁目(単独)	木造2階 戸数:23戸				■H26.9完成						
			サ 桎内①(単独)	木造 戸数:13戸				■H26.12完成						
			シ 町方(末広町)(区:町方地区)	RC造6階 戸数:53戸				用地、設計等	★工事					
			ス 町方(本町)(区:町方地区)	木造 戸数:8戸				用地、設計等			工事			8戸
			セ 町方(御社地)(区:町方地区)	RC造 戸数:24戸				用地、設計等			工事			24戸
			ソ 町方(上町)(区:町方地区)	木造 戸数:4戸				用地、設計等			工事			4戸
			タ 町方1(区:町方地区)	木造 戸数:8戸				用地、設計等			工事			8戸
			チ 町方2(区:町方地区)	木造 戸数:82戸				用地、設計等			工事			82戸
			ツ 吉里吉里(A)(区:吉里吉里地区)	木造 戸数:5戸				用地、設計等			工事			5戸
			テ 吉里吉里(B1)(区:吉里吉里地区)	木造 戸数:13戸				用地、設計等			工事			13戸
			ト 吉里吉里(B2)(区:吉里吉里地区)	木造 戸数:6戸				用地、設計等			工事			6戸
			ナ 吉里吉里(C)(区:吉里吉里地区)	木造 戸数:4戸				用地、設計等			工事			4戸
			ニ 赤浜①団地(防:赤浜地区)	木造 戸数:11戸				用地、設計等			工事			11戸
			ヌ 赤浜②団地(防:赤浜地区)	木造 戸数:10戸				用地、設計等			工事			10戸
			ネ 赤浜③団地(防:赤浜地区)	木造 戸数:22戸				用地、設計等			工事			22戸
			ノ 浪板(漁:浪板地区)	木造 戸数:11戸				用地、設計等			工事			11戸
			ハ 浪板(1)(単独)	木造 戸数:3戸				用地、設計等	★工事					3戸
			ヒ 浪板(2)(単独)	木造 戸数:1戸				用地、設計等			工事			1戸
			フ 安渡(A)(区:安渡地区)	木造 戸数:10戸				用地、設計等			★工事			10戸
			ヘ 安渡(A)(区:安渡地区)	木造 戸数:14戸				用地、設計等			工事			14戸
			ホ 安渡(B1)(区:安渡地区)	木造 戸数:13戸				用地、設計等			工事			13戸
			マ 安渡(B2)(区:安渡地区)	木造 戸数:9戸				用地、設計等				工事		9戸
			ミ 寺野1(防:寺野地区)	木造 戸数:16戸					■H27.9完成					16戸
			ム 寺野2(防:寺野地区)	木造 戸数:11戸				用地、設計等			★工事			11戸
			メ 寺野3(防:寺野地区)	木造 戸数:14戸				用地、設計等				工事		14戸

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 甲子川	(三陸高潮) 水門N=1基	用地、設計等	★工事								
			2 鵜住居川	(災害復旧) 水門等N=1基	用地、設計等	★工事								
			3 片岸海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.8km、 陸閘等N=1基	用地、設計等	★工事								
			4 水海海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基、 離岸堤L=280m	★工事									
			5 小白浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門等N=2基	用地、設計	★工事								
			6 釜石港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=2.1km、 水門等N=19基	★工事									
	農地海岸		7 本郷海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	★工事									
			8 下荒川海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.3km 水門等N=3基	用地、 設計等	★工事								
	林野海岸		9 根浜地区	(治山施設災害復旧) 防潮堤L=0.6km	用地、 設計等	★工事								
	漁港海岸		10 箱崎漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事								
			11 白浜(鵜) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=3基 他	用地、設計等	★工事								
			12 両石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事								
			13 釜石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.8km、 水門N=6基 他	用地、設計等	★工事								
			14 小白浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事								
			15 室浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等	★工事								
			16 仮宿漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km	★工事									
			17 桑の浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	★工事								
			18 罎石漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km 他	用地、設計等	工事								
			19 平田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=1基 他	用地、設計等	★工事								
			20 白浜(釜石) 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他	用地、設計等	工事								
			21 佐須漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他	★工事									
復興道路等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路	釜石山田道路	★用地買収、工事等 ※釜石JCT～釜石両石IC、大槌IC～山田南IC H30開通予定									
				吉浜釜石道路 (吉浜～釜石)	★用地買収、工事等 ◆H25.2.25起工式									
			B 東北横断自動車道 釜石秋田線	釜石道路 (釜石～釜石西)	★用地買収、工事等 ◆H24.11.4起工式									
	復興支援道路	県	C (一) 水海大渡線	女遊部	■H24.3.5供用開始									
			D (主) 釜石遠野線	剣	◆H25.9着工 ★工事									
			E (一) 桜峠平田線	平田	◆H25.10着工 ★工事									
			F (一) 吉浜上荒川線	下荒川	◆H24.10着工 ★工事									


基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

[illegible]

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市3/5】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

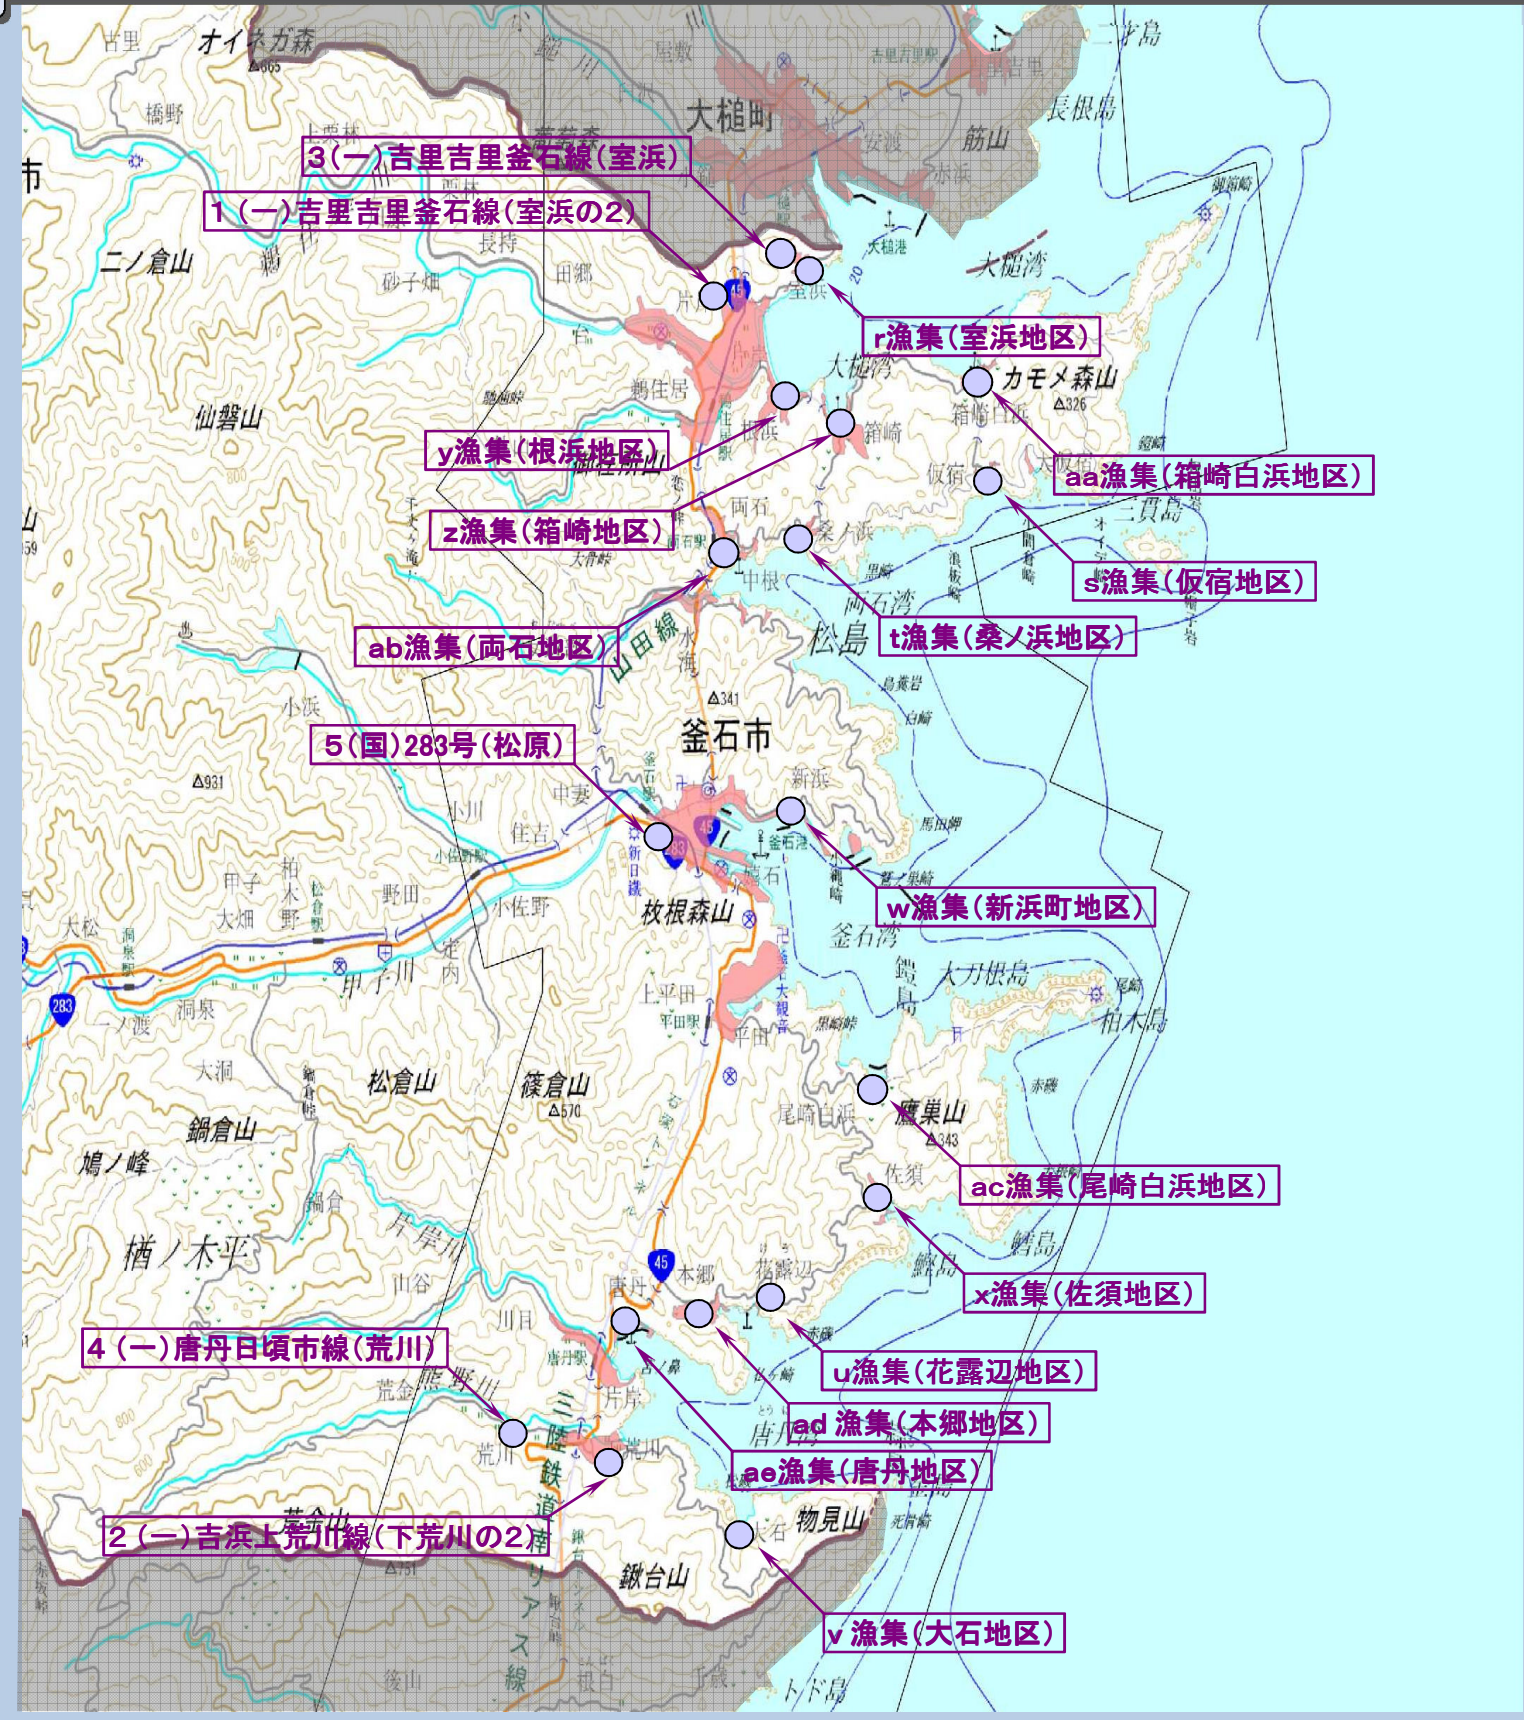


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	漁業集落防災 機能強化	市	r 室浜地区	対象戸数:16戸 (民11戸・公5戸)					民11戸 ■H27.10完成	公5戸				
			s 仮宿地区	対象戸数:4戸 (民4戸)	用地、設計等			★工事	民4戸					
			t 桑ノ浜地区	対象戸数:8戸 (民5戸・公3戸)	用地、設計等			★工事		民5戸・公3戸				
			u 花露辺地区	集落道 他	用地、設計等			★工事						
			v 大石地区	集落道 他	用地、設計等					工事				
			w 新浜町地区	用地造成他	用地、設計等						工事			
			x 佐須地区	対象戸数:5戸 (民5戸)				■H27.6完成	民5戸					
			y 根浜地区	対象戸数:6戸 (民4戸・公2戸)	用地、設計等			★工事		民4戸・公2戸				
			z 箱崎地区	対象戸数:35戸 (民18戸・公17戸)	用地、設計等			★工事	民18戸	公17戸				
			aa 箱崎白浜地区	対象戸数:3戸 (民3戸)	用地、設計等			★工事	民3戸					
			ab 両石地区	対象戸数:55戸 (民36戸・公19戸)	用地、設計等			★工事		民36戸	公19戸			
			ac 尾崎白浜地区	対象戸数:2戸 (民2戸)				■H27.9完成	民2戸					
			ad 本郷地区	対象戸数:7戸 (民2戸・公5戸)				■H27.9完成	民2戸	公5戸				
			ae 唐丹地区	集落排水施設整備 L=3,353m 処理施設整備1式	用地、設計等			★工事						
まちづくり 連携道路	県		1 (一) 吉里吉里釜石線	室浜の2				◆H26.10着工	★工事					
			2 (一) 吉浜上荒川線	下荒川の2					■H27.11.4供用開始					
			3 (一) 吉里吉里釜石線	室浜				◆H26.9着工	★工事					
			4 (一) 唐丹日頃市線	荒川				◆H26.12着工	★工事					
			5 (国)283号	松原				◆H25.10着工	★工事					

社会資本の復旧・復興ロードマップ【釜石市4/5】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

三陸の大地に光輝き 希望と笑顔があふれるまち釜石

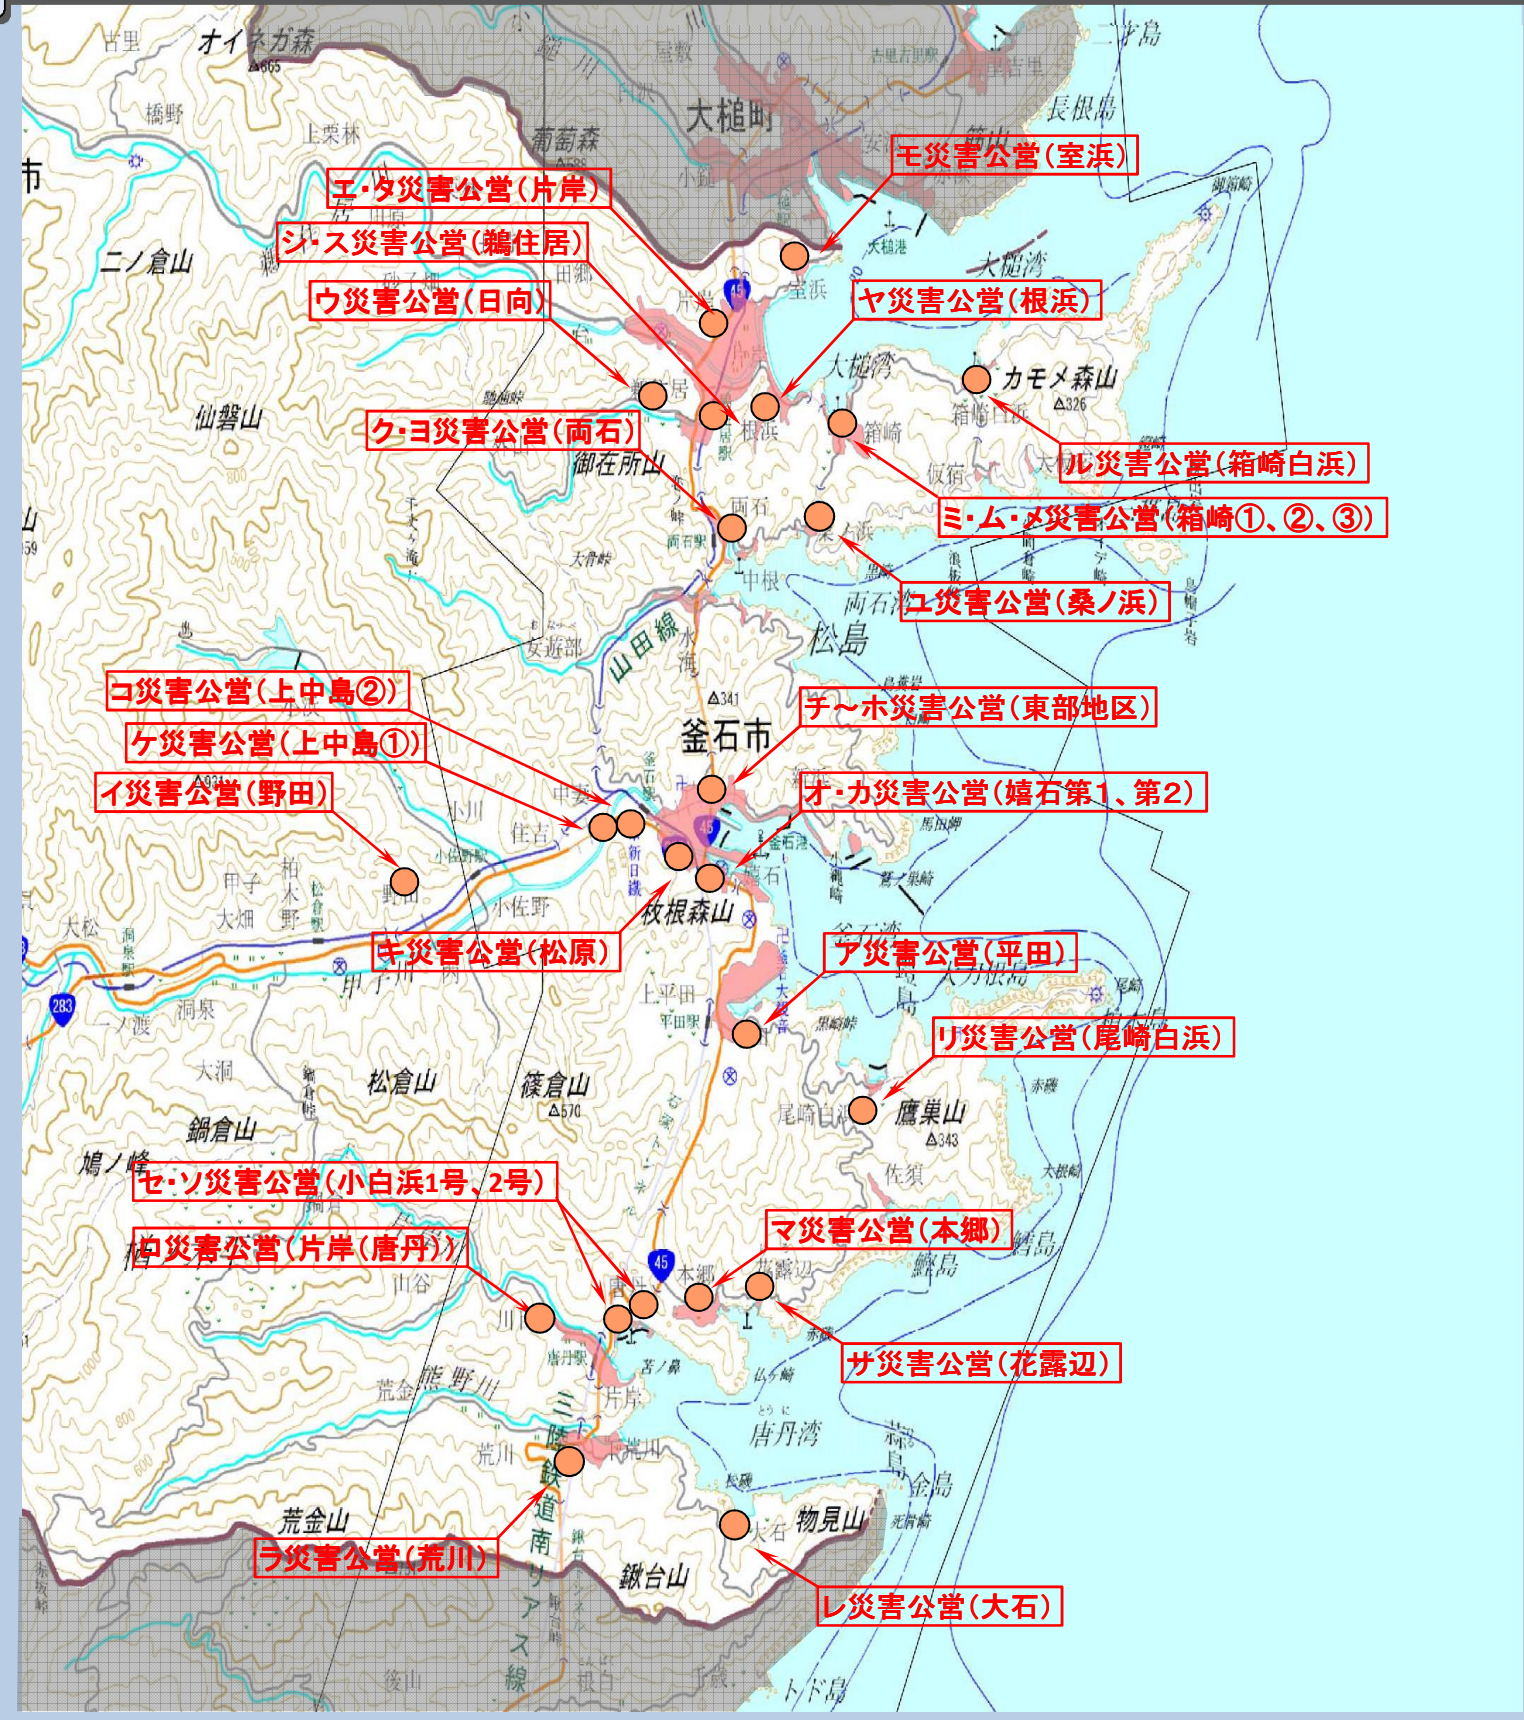

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27	H28		H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 平田 (単独)	RC造7階 戸数: 126戸			126戸									
					■H26.1完成											
			イ 野田 (単独)	RC造5階 戸数: 32戸			32戸									
					■H25.10完成											
			ウ 日向 (単独)	RC造6階 戸数: 30戸							30戸					
								■H27.7完成								
			エ 片岸 (単独)	RC造 戸数: 17戸									17戸			
	オ 嬉石第1 (区: 嬉石・松原地区)	RC造 戸数: 52戸										52戸				
	カ 嬉石第2 (区: 嬉石・松原地区)	RC造 戸数: 32戸										32戸				
	キ 松原 (区: 嬉石・松原地区)	RC造 戸数: 60戸											60戸			
	ク 両石 (防: 両石地区)	RC造 戸数: 24戸											24戸			
	買取	市	ケ 上中島① (単独)	S造3階 戸数: 54戸			54戸									
					■H25.3完成											
			コ 上中島② (単独)	S造8階 戸数: 156戸						156戸						
										■H27.2完成						
サ 花露辺 (防: 花露辺地区)			RC造4階 戸数: 13戸			13戸										
				■H25.12完成												
シ 鶴住居① (区: 鶴住居地区)			木造 戸数: 45戸										45戸			
ス 鶴住居② (区: 鶴住居地区)			RC造 戸数: 80戸											80戸		
セ 小白浜1号 (単独)			S造4階 戸数: 27戸										27戸			
ソ 小白浜2号 (単独)			木造 戸数: 3戸										3戸			
タ 片岸 (区: 片岸地区)			木造 戸数: 17戸												17戸	
チ 東部地区 (天神町) (単独)			S造5階 戸数: 52戸										52戸			
ツ 東部地区 (大町1号) (単独)			S造6階 戸数: 44戸											44戸		
テ 東部地区 (大連町) (単独)			RC造8階 戸数: 27戸											27戸		
ト 東部地区 (只越1号) (単独)			S造6階 戸数: 33戸												33戸	
ナ 東部地区 (只越2号) (単独)			S造5階 戸数: 11戸												11戸	
ニ 東部地区 (大只越1号) (単独)			S造5階 戸数: 14戸												14戸	
ヌ 東部地区 (大町2号) (単独)			5階 戸数: 29戸												29戸	
ネ 東部地区 (大町3号) (単独)			8階 戸数: 34戸												34戸	
ノ 東部地区 (大町4号) (単独)	RC造8階 戸数: 41戸												41戸			
ハ 東部地区 (大町5号) (単独)	RC造6階 戸数: 24戸												24戸			
ヒ 東部地区 (只越3号) (単独)	6階 戸数: 19戸												19戸			
フ 東部地区 (只越4号) (単独)	8階 戸数: 27戸												27戸			
ヘ 東部地区 (浜町) (単独)	7階 戸数: 53戸												53戸			
ホ 東部地区 (大只越2号) (単独)	5階 戸数: 22戸												22戸			
マ 本郷 (防: 本郷地区) (漁: 本郷地区)	木造 戸数: 12戸												12戸			
ミ 箱崎(上前) (防: 箱崎地区) (漁: 箱崎地区)	木造 戸数: 10戸												10戸			
ム 箱崎(野川前) (防: 箱崎地区) (漁: 箱崎地区)	木造 戸数: 14戸												14戸			
メ 箱崎(横瀬) (防: 箱崎地区) (漁: 箱崎地区)	木造 戸数: 5戸												5戸			
モ 室浜 (防: 室浜地区) (漁: 室浜地区)	木造 戸数: 7戸												7戸			
ヤ 根浜 (防: 根浜地区) (漁: 根浜地区)	木造 戸数: 8戸												8戸			
ユ 桑ノ浜 (防: 桑ノ浜地区) (漁: 桑ノ浜地区)	木造 戸数: 8戸												8戸			
ヨ 両石 (防: 両石地区) (漁: 両石地区)	木造 戸数: 23戸												23戸			
直接建設	県	ラ 荒川 (防: 荒川地区)	木造 戸数: 8戸											8戸		
		リ 尾崎白浜 (防: 尾崎白浜地区) (単独)	木造 戸数: 5戸											5戸		
		ル 箱崎白浜 (単独)	木造 戸数: 9戸			9戸										
				■H26.3完成												
レ 大石 (単独)	木造 戸数: 3戸			3戸												
				■H25.12完成												
ロ 唐丹片岸 (単独)	木造 戸数: 4戸												4戸			

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

1 唐丹小学校、3 唐丹中学校

2 鶴住居小学校、4 釜石東中学校

3 釜石市

4 釜石漁港

5 唐丹漁港

6 小白浜漁港

7 室浜漁港

8 片岸漁港

9 飯宿漁港

10 桑ノ浜漁港

11 釜石漁港

12 平田漁港

13 白浜(釜)漁港

14 佐須漁港


15 大石漁港

分野区分	細分項目等	事業 主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
漁 港	漁 港	県	① 箱崎漁港	(漁港災害) 防波堤L=624m、 岸壁L=889m 他					■H27.3完成							
			② 白浜(鵜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=505m、 岸壁L=504m 他					■H27.1完成							
			③ 両石漁港	(漁港災害) 防波堤L=596m、 岸壁L=834m 他				★工事								
			④ 釜石漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,120m、 岸壁L=1,898m 他				★工事								
			⑤ 唐丹漁港	(漁港災害) 防波堤L=623m、 岸壁L=572m 他					■H27.3完成							
			⑥ 小白浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=819m、 岸壁L=834m 他					■H26.12完成							
		市	⑦ 室浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=163m、 岸壁L=190m 他		用地、設計等		★工事								
			⑧ 片岸漁港	(漁港災害) 防波堤L=72m、 岸壁L=135m 他					■H27.3完成							
			⑨ 仮宿漁港	(漁港災害) 防波堤L=130m、 岸壁L=60m 他					■H27.3完成							
			⑩ 桑ノ浜漁港	(漁港災害) 防波堤L=209m、 岸壁L=250m 他					■H27.3完成							
			⑪ 嬉石漁港	(漁港災害) 防波堤L=76m、 岸壁L=304m 他		用地、設計等		★工事								
			⑫ 平田漁港	(漁港災害) 防波堤L=215m、 岸壁L=598m 他					■H27.3完成							
			⑬ 白浜(釜)漁港	(漁港災害) 防波堤L=449m、 岸壁L=378m 他						■H27.10完成						
			⑭ 佐須漁港	(漁港災害) 防波堤L=174m、 岸壁L=103m 他		用地、設計等		★工事								
			⑮ 大石漁港	(漁港災害) 防波堤L=361m、 岸壁L=233m 他						■H27.12完成						
港 湾	釜石港	国 A 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=1,660m		★工事(平成29年度完成予定)											
		県 B 須賀地区	(災害復旧) 南防波堤L=266m、 -4.0m1号物揚場 L=200m、 -7.5m岸壁L=152m他		★工事											
教 育	小学校	市	1 唐丹小学校	(災害復旧) 移転		用地、設計等				★工事				〔4校とも移転完了まで仮設校舎を使用〕		
			2 鵜住居小学校	(災害復旧) 移転		用地、設計等				★工事						
	中学校		3 唐丹中学校	(災害復旧) 現敷地で新築		用地、設計等				★工事						
			4 釜石東中学校	(災害復旧) 移転		用地、設計等				★工事						

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市1/5】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

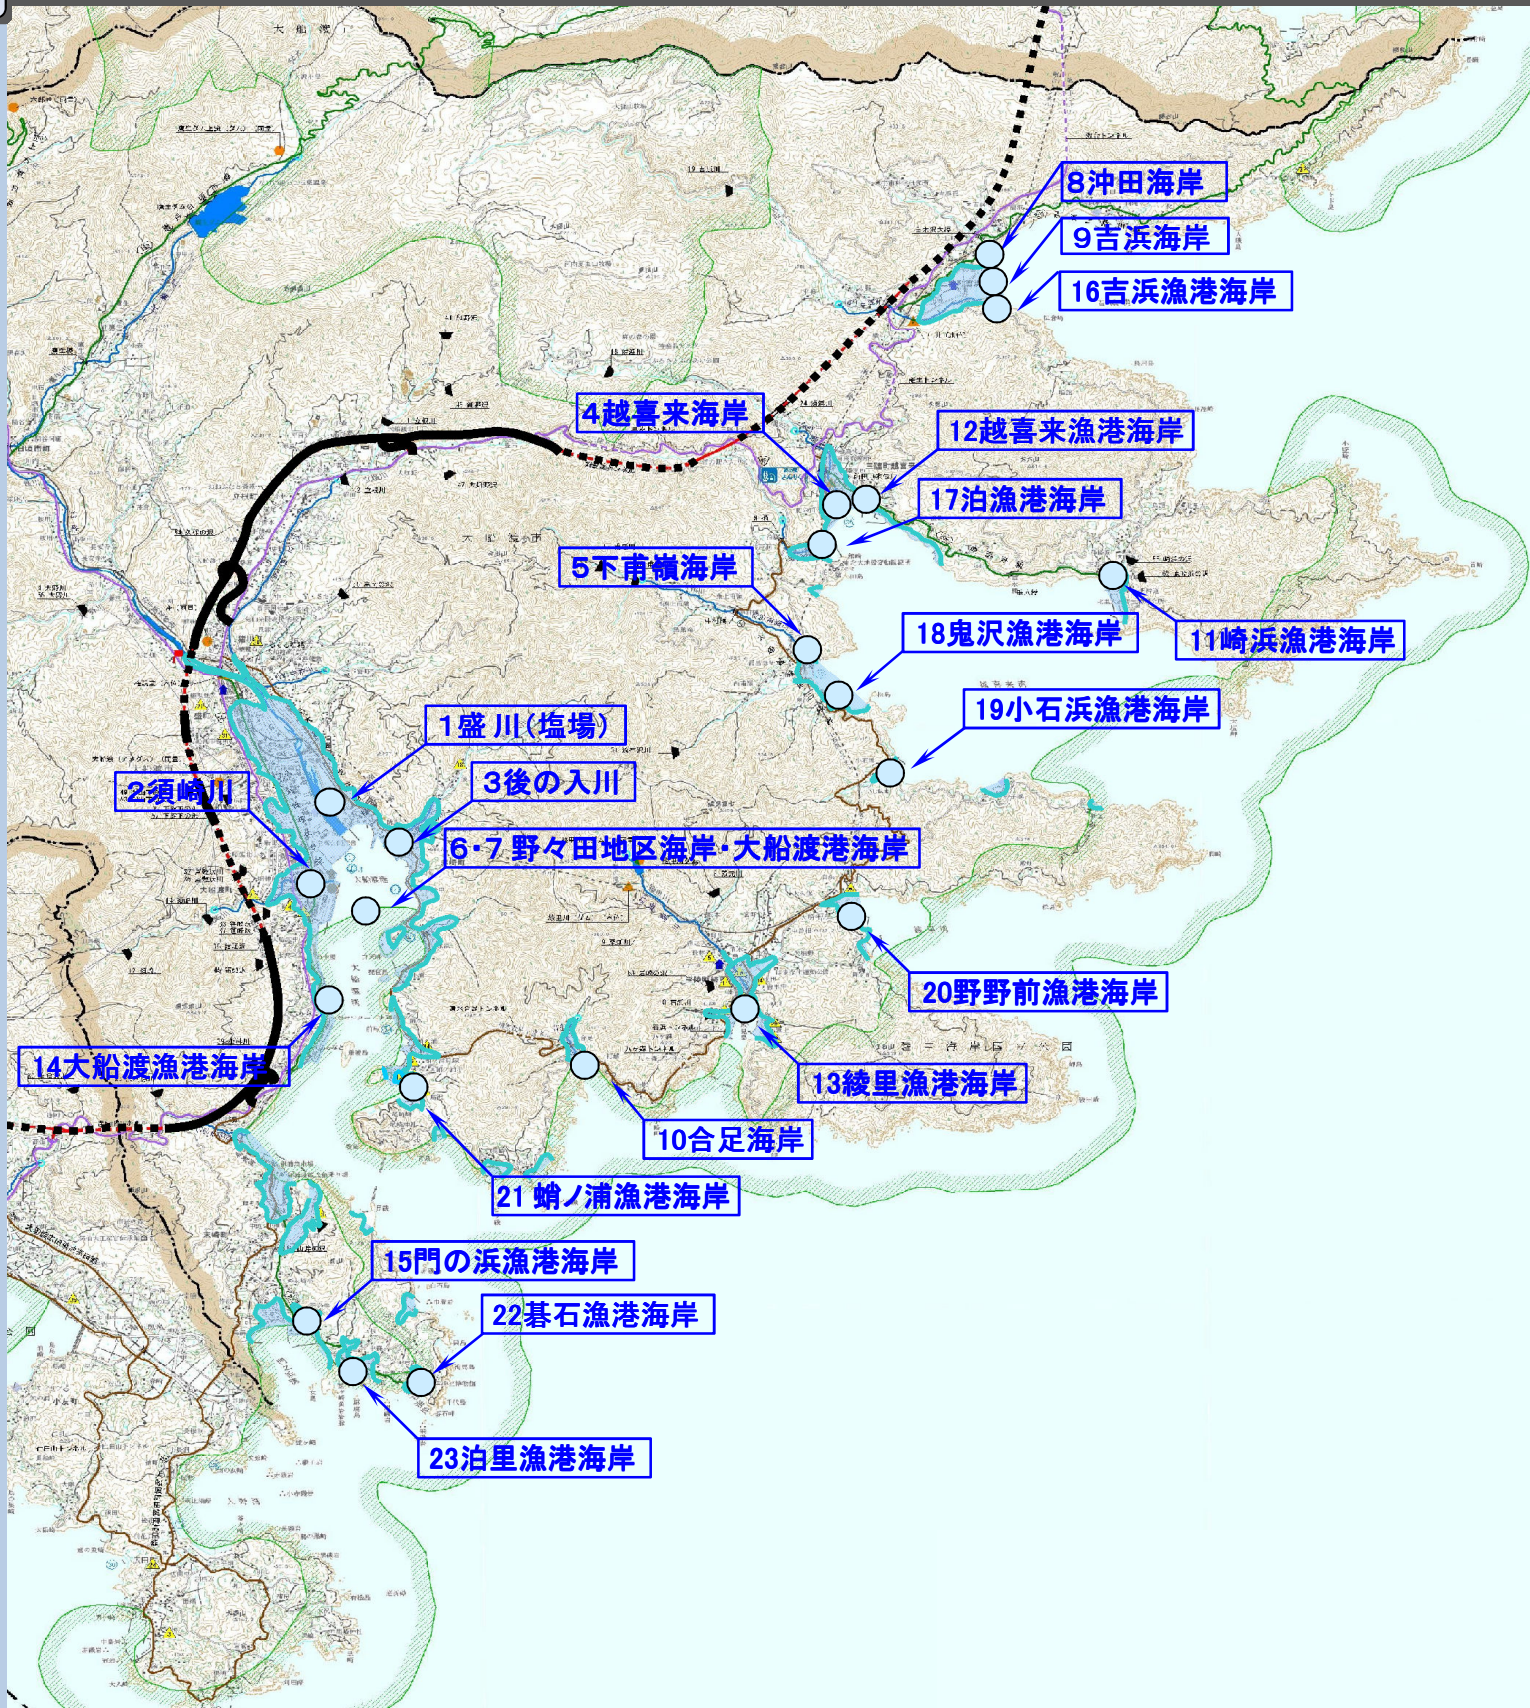

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基礎復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸 港湾海岸	県	1 盛川(塩場)	(災害復旧) 防潮堤L=2.3km		★工事										
			2 須崎川	(三陸高潮) 水門N=1基		★工事										
			3 後の入川	(三陸高潮) 水門N=1基						★工事						
			4 越喜来海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基他		★工事										
			5 下甫嶺海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.4km、 水門N=2基他		★工事										
			6 野々田 地区海岸	(港湾高潮) 防潮堤L=4.1km						★工事						
			7 大船渡港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.6km、 水門等N=38基						★工事						
	農地海岸		8 沖田海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km												
			9 吉浜海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km、 水門等N=2基		★工事										
			10 合足海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.2km、 水門等N=2基		★工事										
			漁港海岸	11 崎浜漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=3基 他						★工事					
				12 越喜来 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他		★工事									
				13-1 綾里漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 水門N=3基 他						★工事					
				13-2 綾里 (石浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km						工事					
	14-1 大船渡 漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.6km、 水門N=11基 他						★工事						
	14-2 大船渡 (細浦他地区)			(海岸高潮) 防潮堤L=2.8km、 水門N=1基 他						★工事						
	15 門の浜 漁港海岸			(災害復旧) 防潮堤L=1.5km、 水門N=2基 他						★工事						
	市			16 吉浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他		★工事									
				17 泊漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km 他		★工事									
				18 鬼沢 漁港海岸	(災害復旧) 海岸護岸L=0.1km											
				19 小石浜 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他		★工事									
				20 野野前 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km、 水門N=2基 他		★工事									
				21 蛸ノ浦 漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.3km、 水門N=6基 他						★工事					
22 碁石漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他						★工事								
23 泊里漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.3km、 水門N=1基 他						工事								


基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール										
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26		H27	H28	H29	H30		
復興まちづくり	土地区画整理	市	a 大船渡駅周辺地区	区域面積: 約33.8ha 対象戸数281戸 (民231戸・公50戸)	用地、設計等					民11戸	民46戸・公50戸		民78戸	民96戸	
			★工事												
			b 大船渡地区	対象戸数: 18戸 (民18戸)				■H27.5完成		民18戸					
			c 峰岸地区	対象戸数: 21戸 (民21戸)				■H27.6完成		民21戸					
			d 小河原地区(平林)	対象戸数: 29戸 (民29戸)				■H27.6完成		民29戸					
			e 小河原地区(上山)	対象戸数: 6戸 (民6戸)				■H27.4完成		民6戸					
			f 小河原地区(鶴巻)	対象戸数: 6戸 (民6戸)				■H26.10完成		民6戸					
			g 神坂地区	対象戸数: 9戸 (民9戸)				■H27.3完成		民9戸					
			h 細浦地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)				■H27.1完成		民13戸					
			i 小細浦地区	対象戸数: 8戸 (民8戸)	■H25.12完成					民8戸					
			j 梅神地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)				■H27.4完成		民3戸		民10戸			
			k 門之浜地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)	■H26.3完成					民13戸					
			l 泊里地区	対象戸数: 17戸 (民17戸)				■H27.7完成		民17戸					
			m 佐野地区	対象戸数: 5戸 (民5戸)				■H26.4完成		民5戸					
			n 中赤崎地区	対象戸数: 59戸 (民59戸)	用地、設計等			民5戸		★工事				民17戸	民37戸
			o 永浜地区	対象戸数: 28戸 (民28戸)	用地、設計等			民1戸		★工事				民27戸	
			p 清水地区	対象戸数: 6戸 (民6戸)				■H26.8完成		民6戸					
			q 蛸ノ浦地区	対象戸数: 16戸 (民16戸)						■H27.10完成		民16戸			
			r 田浜地区	対象戸数: 12戸 (民12戸)	■H26.5完成					民12戸					
			s 港・岩崎地区	対象戸数: 23戸 (民23戸)	■H26.6完成					民23戸					
	t 泊地区	対象戸数: 13戸 (民13戸)	■H26.1完成					民13戸							
	u 浦浜南地区	対象戸数: 11戸 (民11戸)				■H26.12完成		民11戸							
	v 浦浜仲・西地区	対象戸数: 10戸 (民10戸)				■H26.12完成		民10戸							
	w 浦浜東・甫嶺地区	対象戸数: 9戸 (民9戸)				■H27.3完成		民9戸							
	x 崎浜地区	対象戸数: 21戸 (民21戸)				■H27.6完成		民21戸							
	津波復興拠点	y 大船渡地区	区域面積: 約2.3ha (先行整備区域)	用地、設計等			★工事								
			区域面積: 約5.4ha (第2段階整備区域)	用地、設計等			★工事								
	漁業集落防災機能強化	z 越喜来地区	対象戸数: 30戸 (民30戸)	用地、設計等			★工事				民30戸				

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市3/5】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

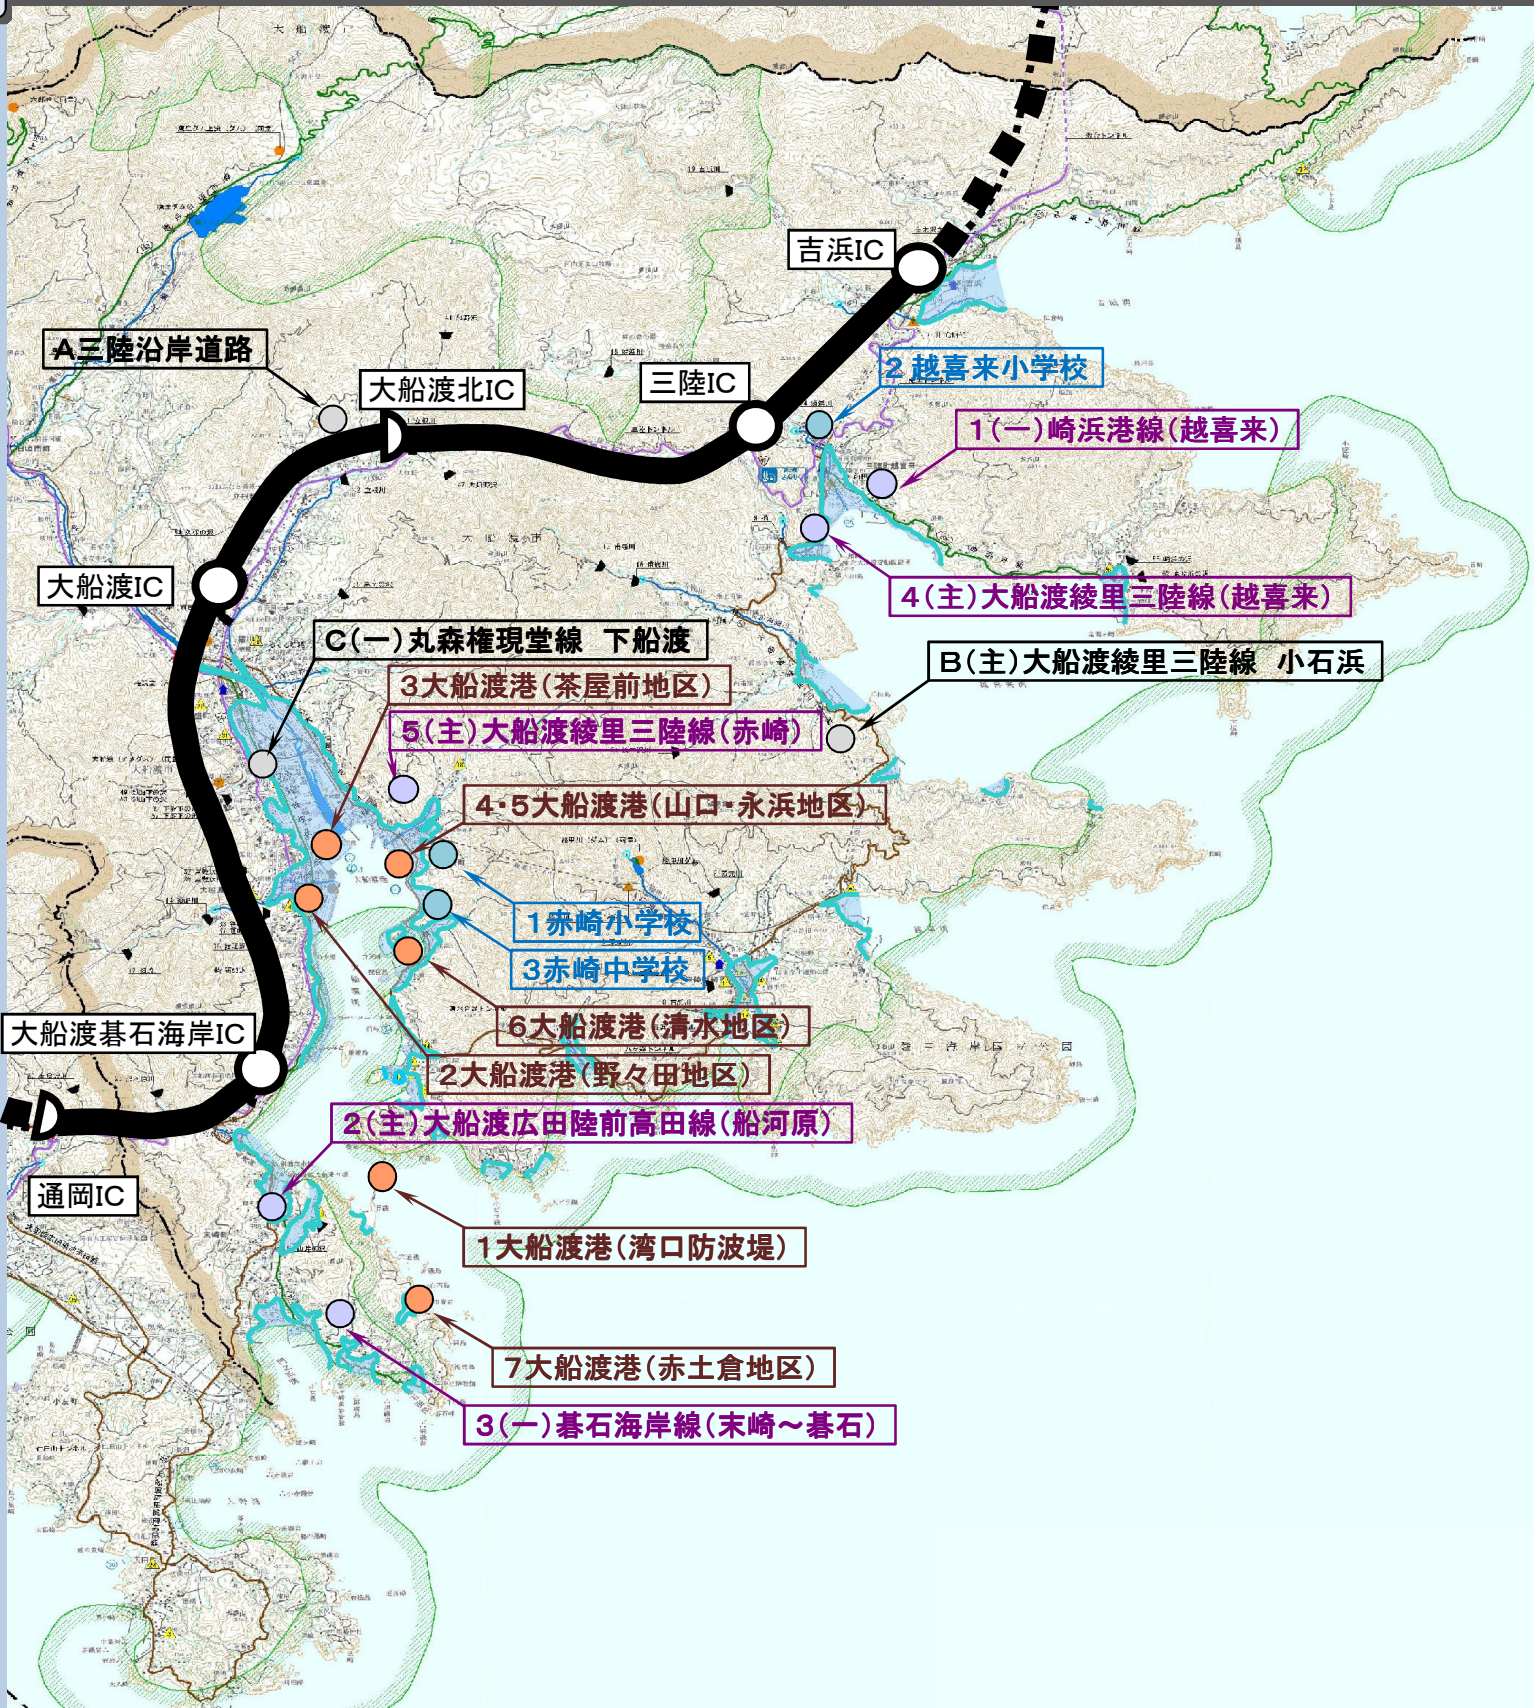


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール								
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）			第3期 （更なる展開への連結期間）		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
復興 まちづくり	まちづくり 連携道路	県	1 (一)崎浜港線	越喜来				◆H27.4着工	★工事				
			2 (主)大船渡広田 陸前高田線	船河原						測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			
			3 (一)基石海岸線	末崎～基石						測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			
			4 (主)大船渡 綾里三陸線	越喜来					★用地買収、工事等	◆H27.4着工			
			5 (主)大船渡 綾里三陸線	赤崎						測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手			
復興道路 等	復興道路	国	A 三陸沿岸道路 (吉浜～金石)	吉浜金石道路 (吉浜～金石)						★用地買収、工事等	◆H25.2.25起工式		
				吉浜道路						■H27.11.29供用開始			
	復興関連道路	県	B (主) 大船渡 綾里三陸線	小石浜						★工事	◆H25.4着工		
港湾	大船渡港	県	C (一) 丸森権現堂線	下船渡									測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手
			1 湾口防波堤	(直轄災害復旧) 防波堤L=535m						★工事 (平成28年度完成予定)			
			2 野々田地区	(災害復旧) 防波堤L=170m、 須崎防波堤L=60m、 -4.5m岸壁L=150m、 -3.0m物揚場L=87m他						★工事			
			3 茶屋前地区	(災害復旧) -9.0m岸壁L=428m、 -6.0m岸壁L=105m、 -3.0m物揚場L=376m、 -4.0m物揚場L=197m他	用地、 設計等					★工事			
			4 山口地区	(災害復旧) 防波堤L=64m、 さん橋 (-2.0m)L=32m、 物揚場L=70m他						★工事			
			5 永浜地区	(災害復旧) 防波堤L=192m、 -2.0m物揚場L=108m、 -2.0m2号物揚場138m						★工事			
			6 清水地区	(災害復旧) 防波堤L=109m、 物揚場L=285m、 船揚場L=98m						★工事			
			7 赤土倉地区	(災害復旧) 南防波堤L=79m、 北防波堤L=165m、 -2.0m2号物揚場 L=104m他						★工事			
教育	小学校	市	1 赤崎小学校	(災害復旧) 移転						用地、設計等・工事	★工事		移転完了まで蛸ノ浦小を使用
			2 越喜来小学校	(災害復旧) 移転						用地、設計等	★工事		H24 甫嶺小、崎浜小と統合 移転完了まで旧甫嶺小を使用
	中学校		3 赤崎中学校	(災害復旧) 移転						用地、設計等・工事	★工事		移転完了まで仮設校舎を使用

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市4/5】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡

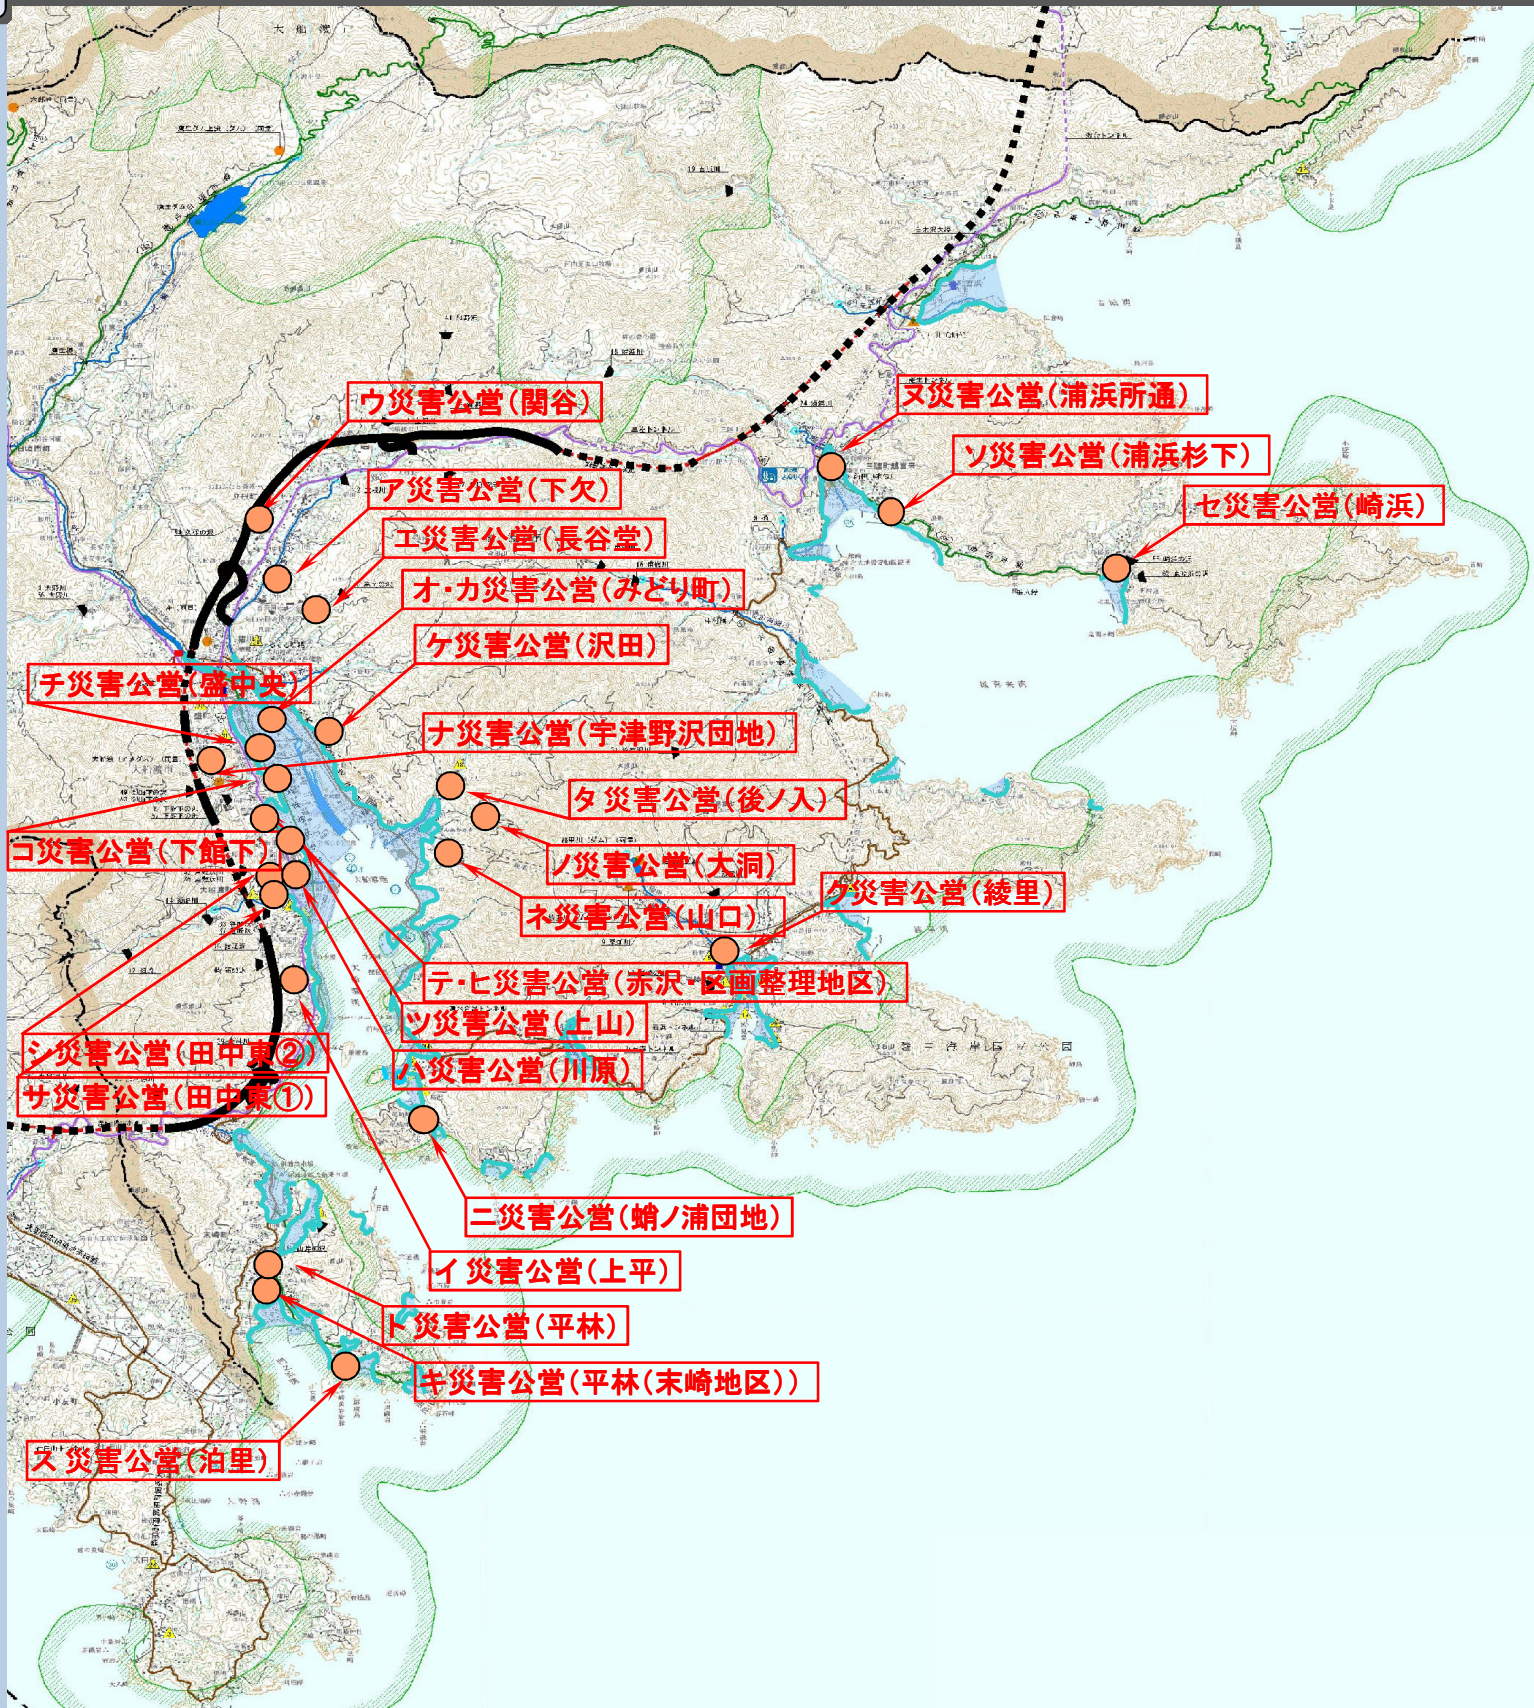











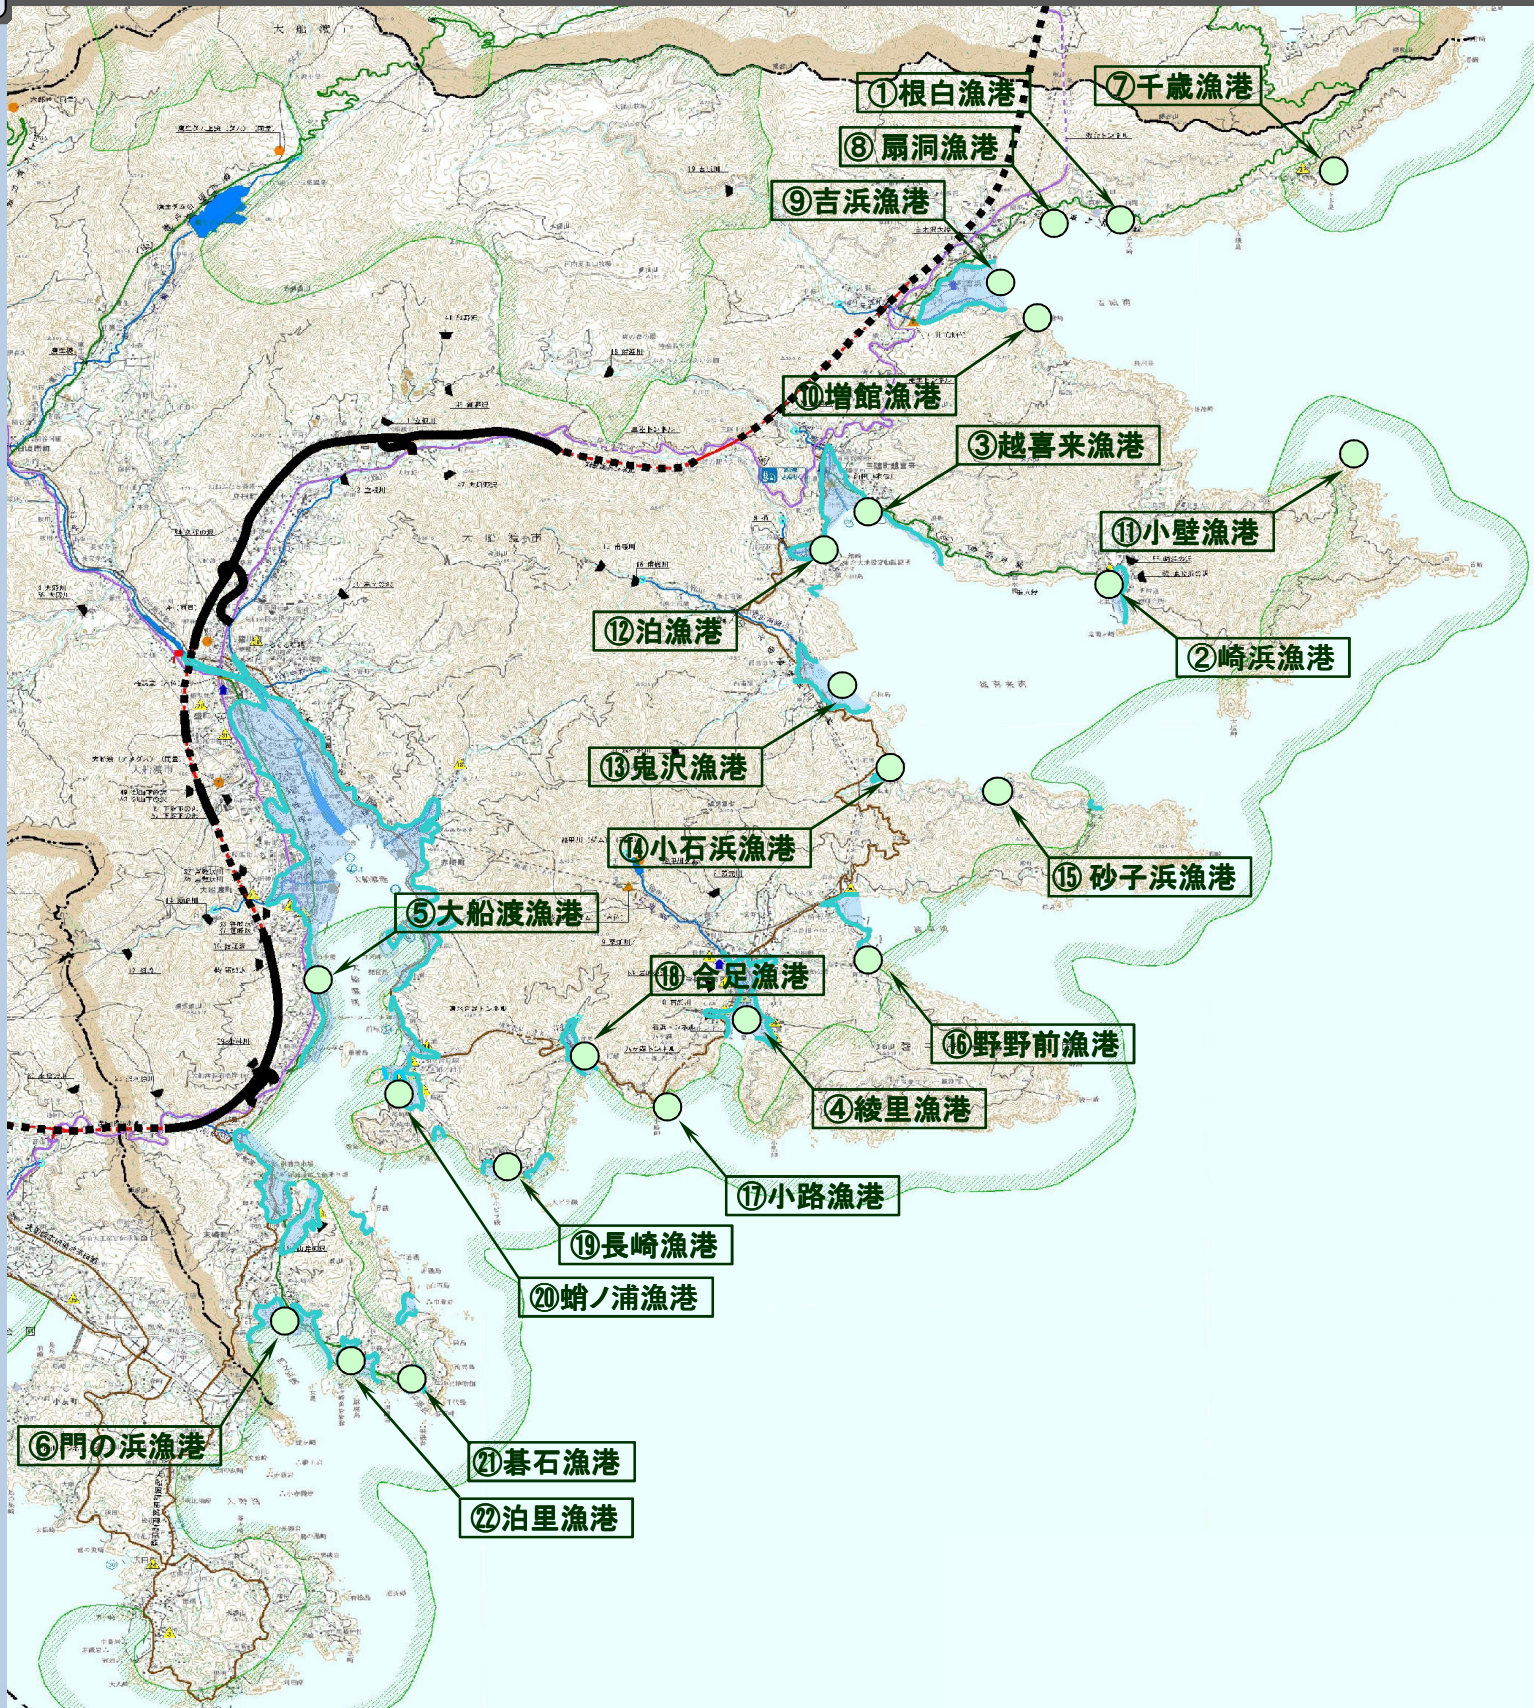




























分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)			第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
県	直接建設		ア 下欠 (単独)	RC造3階 戸数:33戸				33戸 ■H27.1完成						
			イ 上平 (単独)	RC造7階 戸数:65戸				■H27.6完成	65戸					
			ウ 関谷 (単独)	RC造5階 戸数:50戸				用地、設計等	★工事				50戸	
			エ 長谷堂 (単独)	RC造3階 戸数:53戸				■H27.3完成						
			オ みどり町 (1・2工区) (単独)	RC造6階 戸数:97戸					■H27.11完成	97戸				
			カ みどり町 (3工区) (単独)	RC造6階 戸数:50戸				用地、設計等	★工事				50戸	
	設計・施工一括選定		キ 平林 (単独)	RC造4階 戸数:55戸				用地、設計等	★工事				55戸	
			ク 綾里 (単独)	RC造3階 戸数:30戸				■H27.2完成	30戸					
			ケ 沢田 (単独)	RC造3階 戸数:20戸					■H27.12完成	20戸				
			コ 下館下 (単独)	RC造7階 戸数:58戸				用地、設計等	★工事				58戸	
	直接建設		サ 田中東団地① (単独)	木造2階 戸数:12戸			■H25.3完成							
			シ 田中東団地② (単独)	木造2階 戸数:7戸			■H26.3完成							
市	買取	災害公営住宅	ス 泊里団地 (単独)	木造平屋 戸数:6戸				用地、設計等	★工事				6戸	
			セ 崎浜団地 (単独)	木造平屋 戸数:8戸				用地、設計等	★工事				8戸	
			ソ 浦浜杉下団地 (単独)	木造平屋 戸数:9戸				用地、設計等	★工事				9戸	
			タ 中赤崎 後ノ入団地 (単独)	木造平屋 戸数:4戸				用地、設計等	★工事				4戸	
			チ 盛中央 (単独)	RC造5階 戸数:44戸			■H24.12完成							
			ツ 上山団地 (単独)	RC造3階 戸数:11戸				■H26.4完成	11戸					
			テ 赤沢団地 (単独)	RC造5階 戸数:23戸				■H26.6完成	23戸					
			ト 平林団地 (単独)	RC造3階 戸数:11戸				■H26.4完成	11戸					
			ナ 宇津野沢団地 (単独)	RC造3階 戸数:20戸				■H26.5完成	20戸					
			ニ 蛸ノ浦団地 (単独)	RC造3階 戸数:14戸					■H27.5完成				14戸	
			ヌ 浦浜所通団地 (単独)	RC造3階 戸数:20戸					■H27.11完成				20戸	
			ネ 中赤崎 山口団地 (単独)	RC造3階 戸数:13戸				用地、設計等	★工事				13戸	
			ノ 中赤崎 大洞団地 (単独)	木造 戸数:9戸				用地、設計等	★工事				9戸	
			ハ 川原 (単独)	RC造3階 戸数:29戸				■H27.5完成					29戸	
			ヒ 区画整理地区 (区:大船渡駅周辺地区)	RC造5階 戸数:50戸				用地、設計等	★工事				50戸	

社会資本の復旧・復興ロードマップ【大船渡市5/5】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

命を守り、夢を育むまちづくりと防災に協働するまち大船渡




分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 （基盤復興期間）			第2期 （本格復興期間）			第3期 （更なる展開への連結期間）					
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
漁 港	漁 港	県	① 根白漁港	（漁港災害） 防波堤L=748m、 岸壁L=638m 他												
			② 崎浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=721m、 岸壁L=827m 他												
			③ 越喜来漁港	（漁港災害） 防波堤L=580m、 岸壁L=436m 他												
			④ 綾里漁港	（漁港災害） 防波堤L=402m、 岸壁L=1,102m 他												
			⑤ 大船渡漁港	（漁港災害） 防波堤L=1,263m、 岸壁L=3,512m 他												
			⑥ 門の浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=907m、 岸壁L=575m 他												
		市	⑦ 千歳漁港	（漁港災害） 防波堤L=212m、 岸壁L=108m 他												
			⑧ 扇洞漁港	（漁港災害） 防波堤L=125m、 岸壁L=23m 他												
			⑨ 吉浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=223m、 岸壁L=185m 他												
			⑩ 増館漁港	（漁港災害） 防波堤L=137m、 岸壁L=15m 他												
			⑪ 小壁漁港	（漁港災害） 岸壁L=44m 他												
			⑫ 泊漁港	（漁港災害） 防波堤L=283m、 岸壁L=202m 他												
			⑬ 鬼沢漁港	（漁港災害） 防波堤L=329m、 岸壁L=209m 他												
			⑭ 小石浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=422m、 岸壁L=239m 他												
			⑮ 砂子浜漁港	（漁港災害） 防波堤L=176m、 岸壁L=247m 他												
			⑯ 野野前漁港	（漁港災害） 防波堤L=781m、 岸壁L=484m 他												
			⑰ 小路漁港	（漁港災害） 防波堤L=162m、 岸壁L=65m 他												
			⑱ 合足漁港	（漁港災害） 防波堤L=81m、 岸壁L=45m 他												
			⑲ 長崎漁港	（漁港災害） 防波堤L=482m、 岸壁L=475m 他												
			⑳ 蛸ノ浦漁港	（漁港災害） 防波堤L=239m、 岸壁L=972m 他												
			㉑ 基石漁港	（漁港災害） 防波堤L=123m、 岸壁L=104m 他												
			㉒ 泊里漁港	（漁港災害） 防波堤L=211m、 岸壁L=248m 他												

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市1/4】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

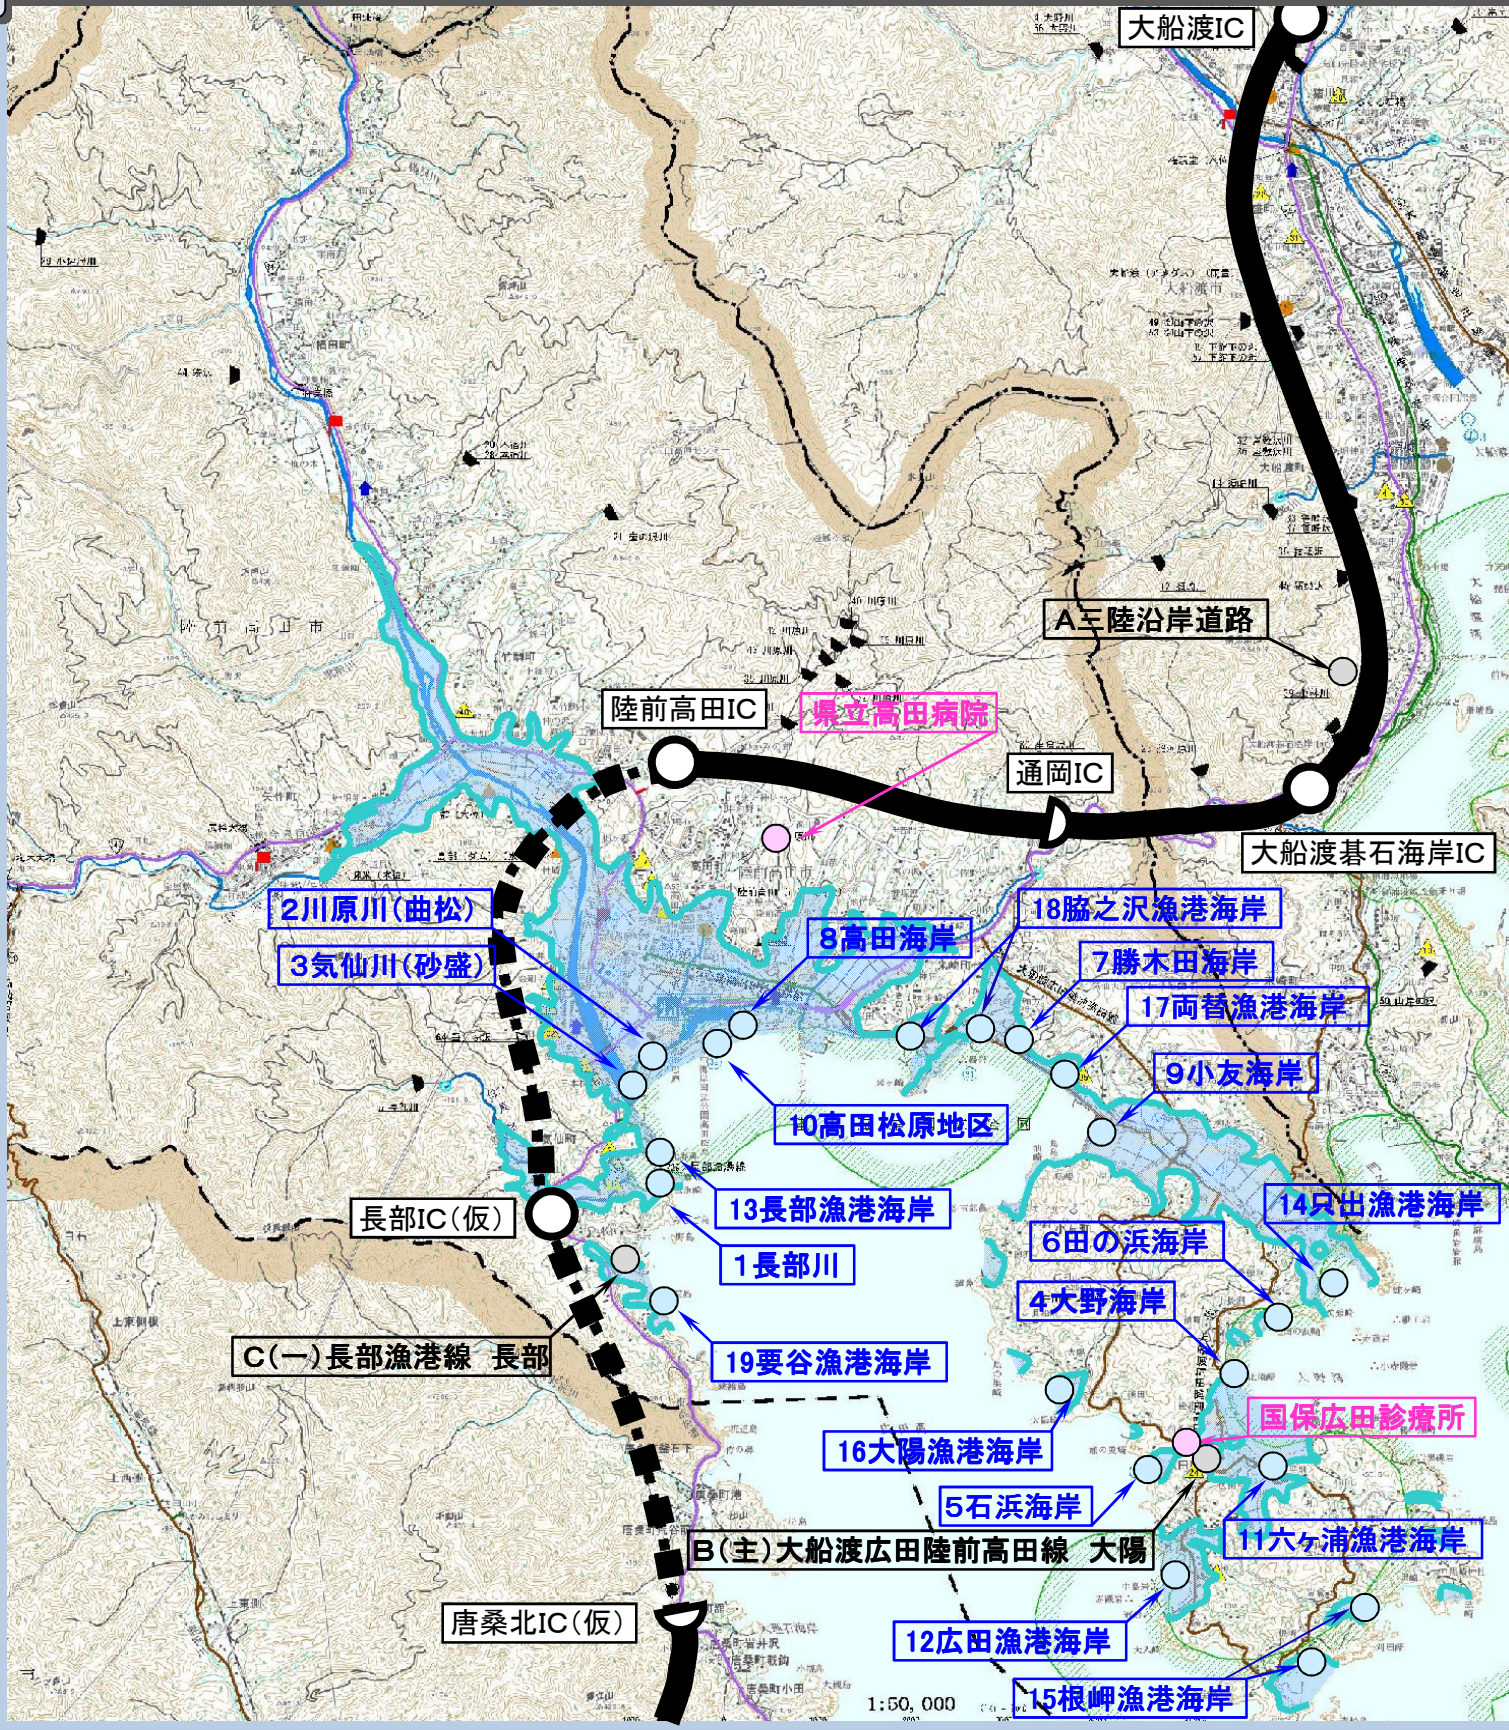

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール											
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30	
海岸保全施設	一般海岸	県	1 長部川	(三陸高潮) 水門N=1基他	用地、設計等	★工事										
			2 川原川(曲松)	(災害復旧) 護岸工L=3.4km他	用地、設計等	★工事										
			3 気仙川(砂盛)	(災害復旧) 水門N=1基		★工事 H31完成予定										
			4 大野海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km、 離岸堤L=0.3km他	用地、設計等	★工事										
			5 石浜海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 離岸堤L=0.12km他	■H26.3完成											
			6 田の浜海岸	(災害復旧) 護岸工L=0.04km、 消波工L=0.02km他	■H25.1完成											
			7 勝木田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.6km他	用地、設計等	★工事										
			8 高田海岸	(災害復旧) 防潮堤L=3.9km、 水門N=1基、人工リーフL=1.2km他	用地、設計等	★工事										
			農地海岸	9 小友海岸	(海岸保全施設災害) 防潮堤L=0.6km 水門等N=3基	用地、設計等	★工事									
				林野海岸	10 高田松原地区	(治山施設災害) (防災林造成) 防潮林林帯(地盤) L=1.3km	用地、設計等	★工事								
	漁港海岸	市	11-1 六ヶ浦漁港海岸		(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事									
			11-2 六ヶ浦(本港地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他		★工事										
			12-1 広田漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=1.4km、 水門N=10基 他	用地、設計等	★工事										
			12-2 広田(後浜地区)	(海岸高潮) 防潮堤L=0.2km、 水門N=1基 他		★工事										
			13 長部漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事										
			14 只出漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.9km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事										
			15 根岬漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.5km 他	用地、設計等	★工事										
			16 大陽漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.2km、 水門N=2基 他	用地、設計等	★工事										
			17 両替漁港海岸	(災害復旧) 防潮堤L=0.7km、 水門N=3基 他	用地、設計等	★工事										
復興道路等	復興関連道路	国	A 三陸沿岸道路	高田道路	■H26.3.23供用開始											
				唐桑高田道路 (唐桑北～陸前高田)	★用地買収、工事等 ◆H25.2.6起工式											
医療	病院	県	B (主) 大船渡広田陸前高田線	大陽	★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.6着工											
				C (一) 長部漁港線	長部	■H24.8.24供用開始										
医療	医科診療所	市	国保広田診療所	診療所施設整備	用地、設計等 工事											


基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール													
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)						第3期 (更なる展開への連結期間)				
					H23	H24	H25	H26		H27		H28		H29	H30			
復興 まちづくり	土地区画整理	市	a 高田地区	区域面積:186.1ha 対象戸数1,481戸 (民1,361戸・公120戸)					公120戸			民92戸			民140戸		民141戸	民988戸
					用地、設計等													
			b 今泉地区	区域面積:113.0ha 対象戸数485戸 (民411戸・公74戸)											公74戸	民213戸	民198戸	
					用地、設計等													
	津波復興拠点		c 高田北地区	(西区) 区域面積:9.6ha														
					★工事													
			(東区) 区域面積:9.1ha															
				★工事														
	d 高田南地区		区域面積:19.8ha															
	用地、設計等																	
	★工事																	
	e 長部地区 (月山)		対象戸数:50戸 (民50戸)											民50戸				
	■H27.8完成																	
	f 長部地区 (上長部)		対象戸数:17戸 (民17戸)				民17戸											
	■H26.1完成																	
	g 長部地区 (双六)		対象戸数:12戸 (民12戸)				民3戸				民3戸			民6戸				
	■H27.6完成																	
	h 長部地区 (要谷)		対象戸数:7戸 (民7戸)				民7戸											
	■H25.12完成																	
	i 長部地区 (福伏)		対象戸数:5戸 (民5戸)								民5戸							
	■H26.12完成																	
	j 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下矢作)		対象戸数:6戸 (民6戸)								民6戸							
	■H26.8完成																	
	k 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (館)		対象戸数:8戸 (民8戸)								民8戸							
	■H26.10完成																	
	l 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (下沢)		対象戸数:5戸 (民5戸)								民5戸							
	■H27.2完成																	
m 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (高田)	対象戸数:79戸 (民79戸)											民2戸			民77戸			
★工事																		
n 矢作・竹駒・ 高田・今泉地区 (今泉)	対象戸数:75戸 (民75戸)														民75戸			
★工事																		
o 米崎地区 (堂の前)	対象戸数:5戸 (民5戸)				民5戸													
■H25.9完成																		
p 米崎地区 (脇の沢)	対象戸数:69戸 (民69戸)											民69戸						
■H27.10完成																		
q 小友地区 (両替)	対象戸数:14戸 (民14戸)								民14戸									
■H26.4完成																		
r 小友地区 (三日市)	対象戸数:5戸 (民5戸)				民5戸													
■H25.11完成																		
s 小友地区 (柳沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)								民9戸									
■H27.3完成																		
t 小友地区 (茂里花)	対象戸数:5戸 (民5戸)								民5戸									
■H27.3完成																		
u 小友地区 (新田)	対象戸数:7戸 (民7戸)				民7戸													
■H26.3完成																		
v 小友地区 (只出)	対象戸数:11戸 (民11戸)								民11戸									
■H26.5完成																		

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市3/4】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

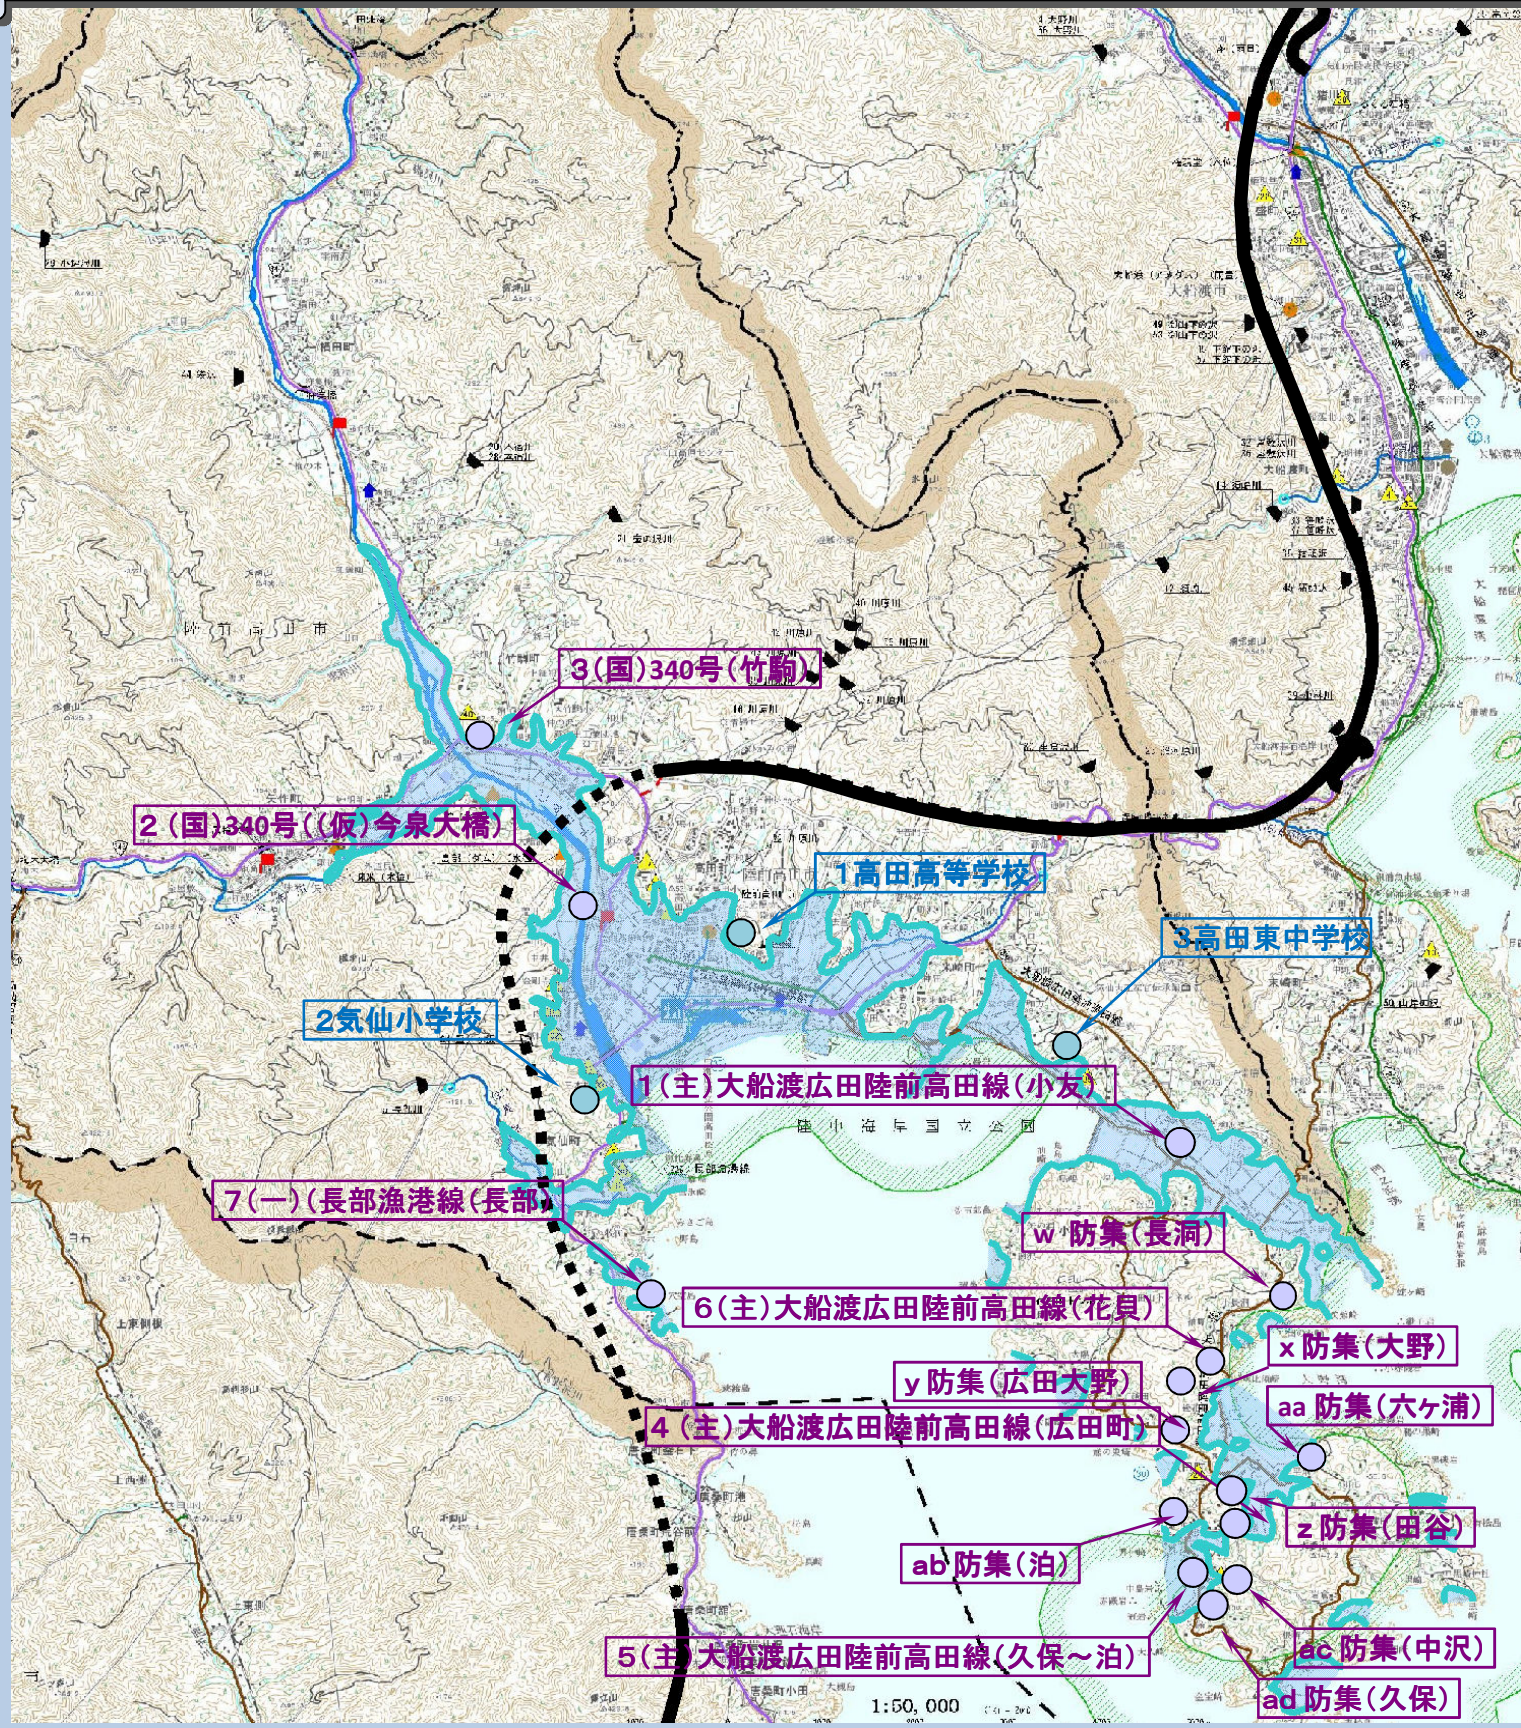


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
復興 まちづくり	防災集団移転	市	w 広田地区 (長洞)	対象戸数:14戸 (民14戸)				民14戸						
			x 広田地区 (大野)	対象戸数:8戸 (民8戸)				民8戸						
			y 広田地区 (広田大野)	対象戸数:18戸 (民18戸)				民18戸						
			z 広田地区 (田谷)	対象戸数:34戸 (民34戸)				民34戸						
			aa 広田地区 (六ヶ浦)	対象戸数:8戸 (民8戸)				民8戸						
			ab 広田地区 (泊)	対象戸数:25戸 (民25戸)				民11戸	民14戸					
			ac 広田地区 (中沢)	対象戸数:9戸 (民9戸)			民9戸							
			ad 広田地区 (久保)	対象戸数:7戸 (民7戸)				民7戸						
	まちづくり 連携道路	県	1 (主)大船渡広田 陸前高田線	小友				★測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.3着工						
			2 (国)340号	(仮)今泉大橋・ 大石沖				測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手						
			3 (国)340号	竹駒				★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.3着工						
			4 (主)大船渡広田 陸前高田線	広田町				★工事 ◆H27.2着工						
			5 (主)大船渡広田 陸前高田線	久保～泊				★用地買収等を行い、順次工事に着手 ◆H27.10着工						
			6 (主)大船渡広田 陸前高田線	花貝				★工事 ◆H27.1着工						
			7 (一)長部漁港線	長部					■H27.8.31供用開始					
教育	高等学校	県	1 高田高等学校	(災害復旧) 校舎、第一体育館、第 二体育館・柔剣道場・ 防災対応施設				■H27.3完成						
	小学校	市	2 気仙小学校	(災害復旧) 移転				用地、設計等						
	中学校		3 高田東中学校	(災害復旧) 移転				用地、設計等						
											★工事			
											H25 長部小と統合 移転完了まで現在の長部小を使用			
											H25 米崎中、小友中、広田中の3校が統合 移転完了まで現在の米崎中を使用			

社会資本の復旧・復興ロードマップ【陸前高田市4/4】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

「海と緑と太陽との共生・海浜新都市」の創造

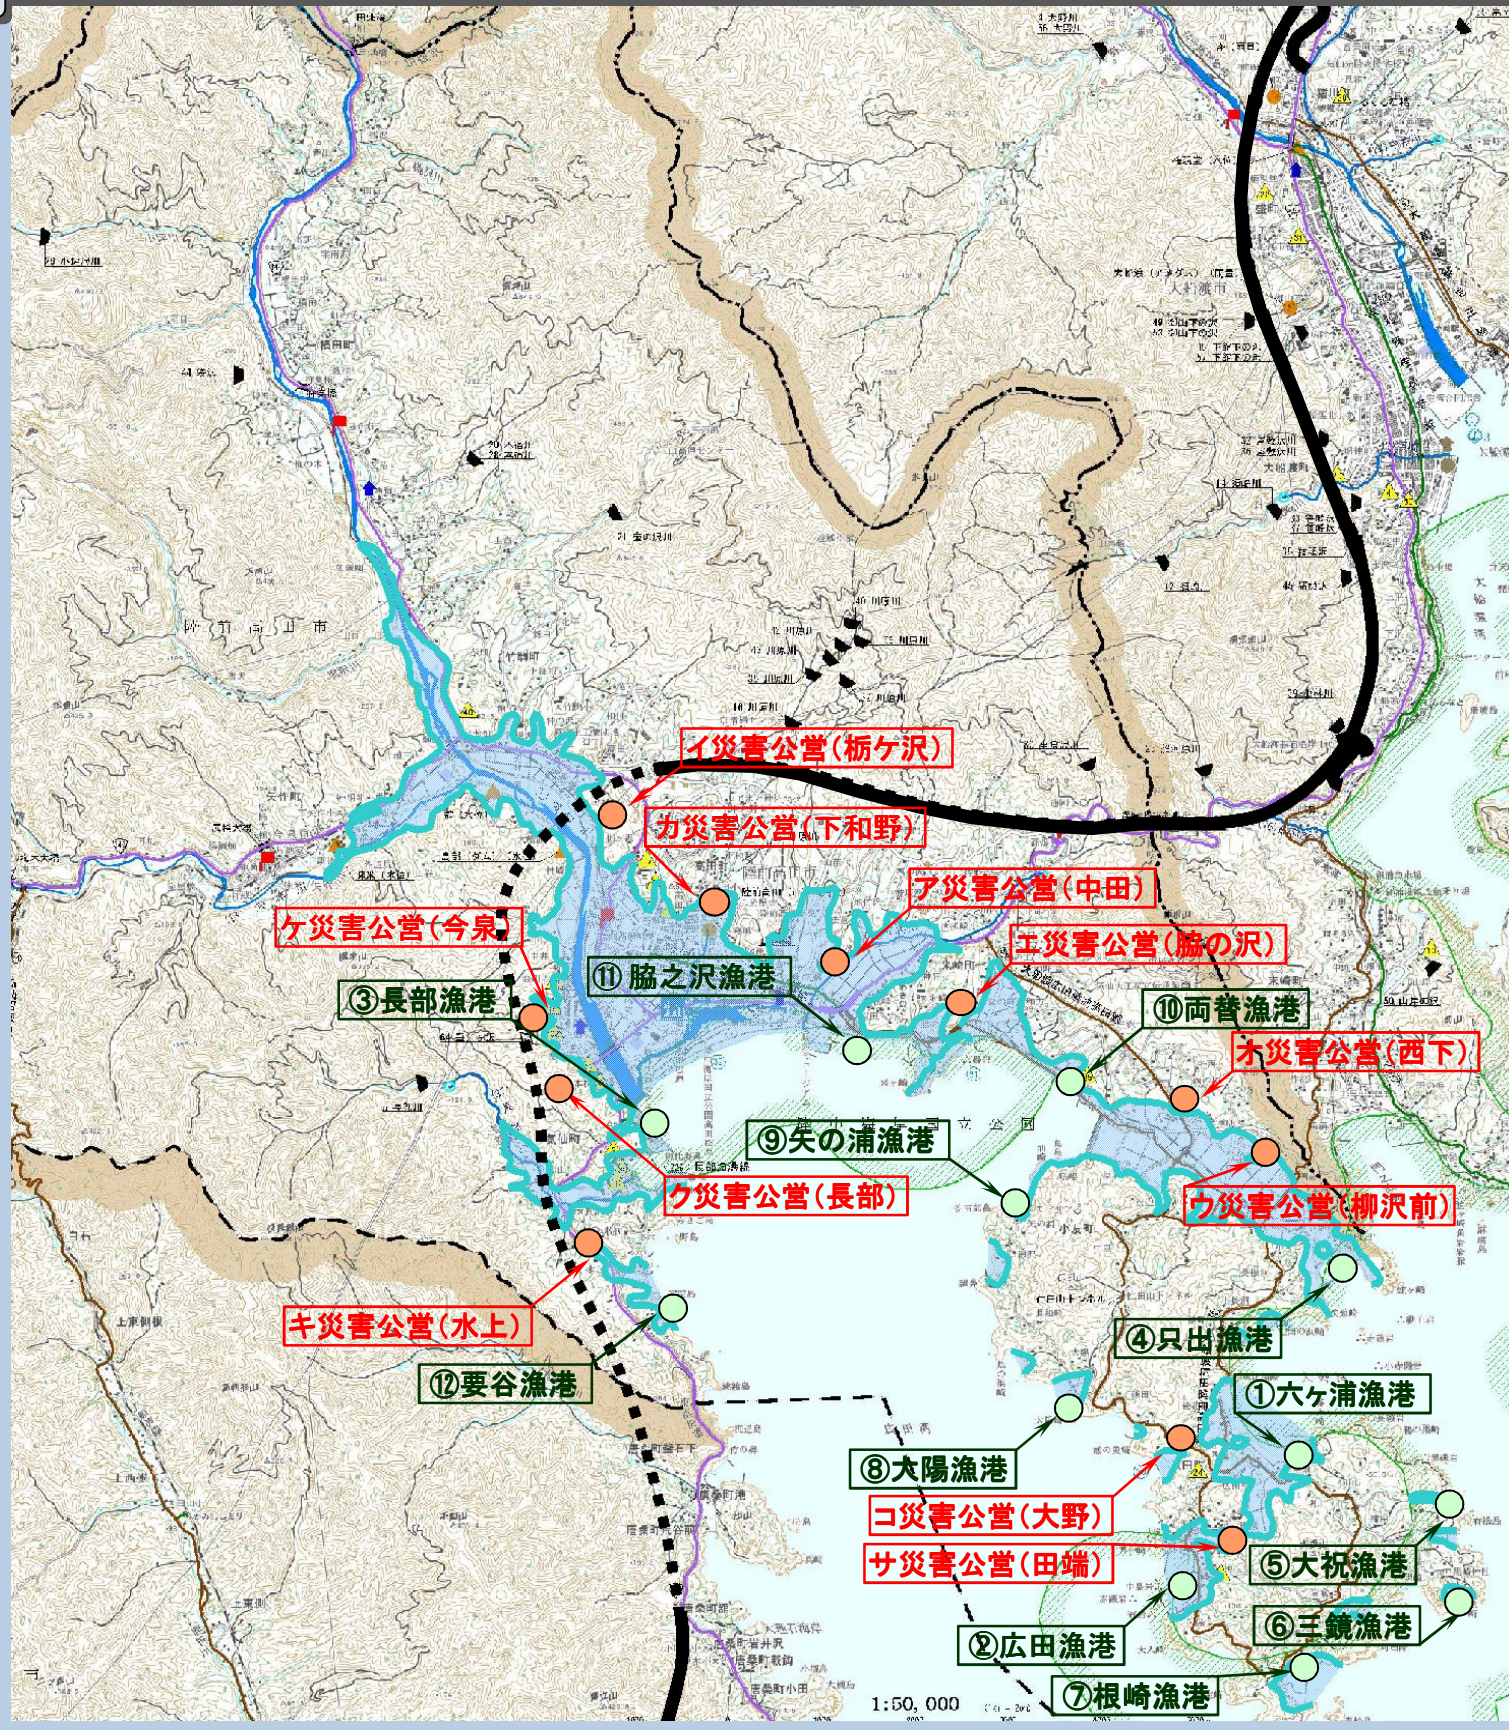


分野区分	細分項目等	事業主体	路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)			第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)		
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	県	ア 中田 (単独)	RC造8階 戸数:197戸					■H27.9完成	197戸				
			イ 柳ヶ沢 (単独)	RC造9階 戸数:301戸		用地、設計等			★工事		301戸			
			ウ 柳沢前 (単独)	RC造3階 戸数:28戸				■H27.3完成	28戸					
			エ 脇の沢 (単独)	RC造3階 戸数:60戸			用地、設計等			★工事	60戸			
	設計・施工一括選定	市	オ 西下 (単独)	RC造4階 戸数:40戸				■H26.12完成	40戸					
			カ 下和野 (区:高田地区)	RC造7階 戸数:120戸				■H26.9完成	120戸					
			キ 水上 (単独)	RC造3階 戸数:30戸				■H26.12完成	30戸					
			ク 長部 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:13戸			用地、設計等			工事	13戸			
			ケ 今泉 (区:今泉地区)	RC造3階 戸数:61戸			用地、設計等			工事	61戸			
			コ 大野 (単独)	RC造3階 戸数:31戸			用地、設計等			★工事	31戸			
漁港	漁港	市	① 六ヶ浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=601m、 岸壁L=474m 他					★工事					
			② 広田漁港	(漁港災害) 防波堤L=919m、 岸壁L=1,176m 他					★工事					
			③ 長部漁港	(漁港災害) 防波堤L=408m、 岸壁L=1,180m 他					★工事					
			④ 只出漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=298m 他					★工事					
			⑤ 大祝漁港	(漁港災害) 防波堤L=99m、 岸壁L=43m 他			用地、設計等		★工事					
			⑥ 三鏡漁港	(漁港災害) 防波堤L=14m、 岸壁L=36m 他			用地、設計等		★工事					
			⑦ 根岬漁港	(漁港災害) 防波堤L=354m、 岸壁L=150m 他			用地、設計等		★工事					
			⑧ 大陽漁港	(漁港災害) 防波堤L=332m、 岸壁L=79m 他			用地、設計等		★工事					
			⑨ 矢の浦漁港	(漁港災害) 防波堤L=136m、 岸壁L=183m 他			用地、設計等		★工事					
			⑩ 両替漁港	(漁港災害) 防波堤L=274m、 岸壁L=254m 他			用地、設計等		★工事					
			⑪ 脇の沢漁港	(漁港災害) 防波堤L=1,149m、 岸壁L=531m 他			用地、設計等		★工事					
			⑫ 要谷漁港	(漁港災害) 防波堤L=556m、 岸壁L=279m 他			用地、設計等		★工事					

社会資本の復旧・復興ロードマップ【その他の市町村】

基準日：平成27年12月31日（平成28年1月25日公表）

沿岸12市町村以外の工程表【災害公営住宅・復興道路・復興支援道路】

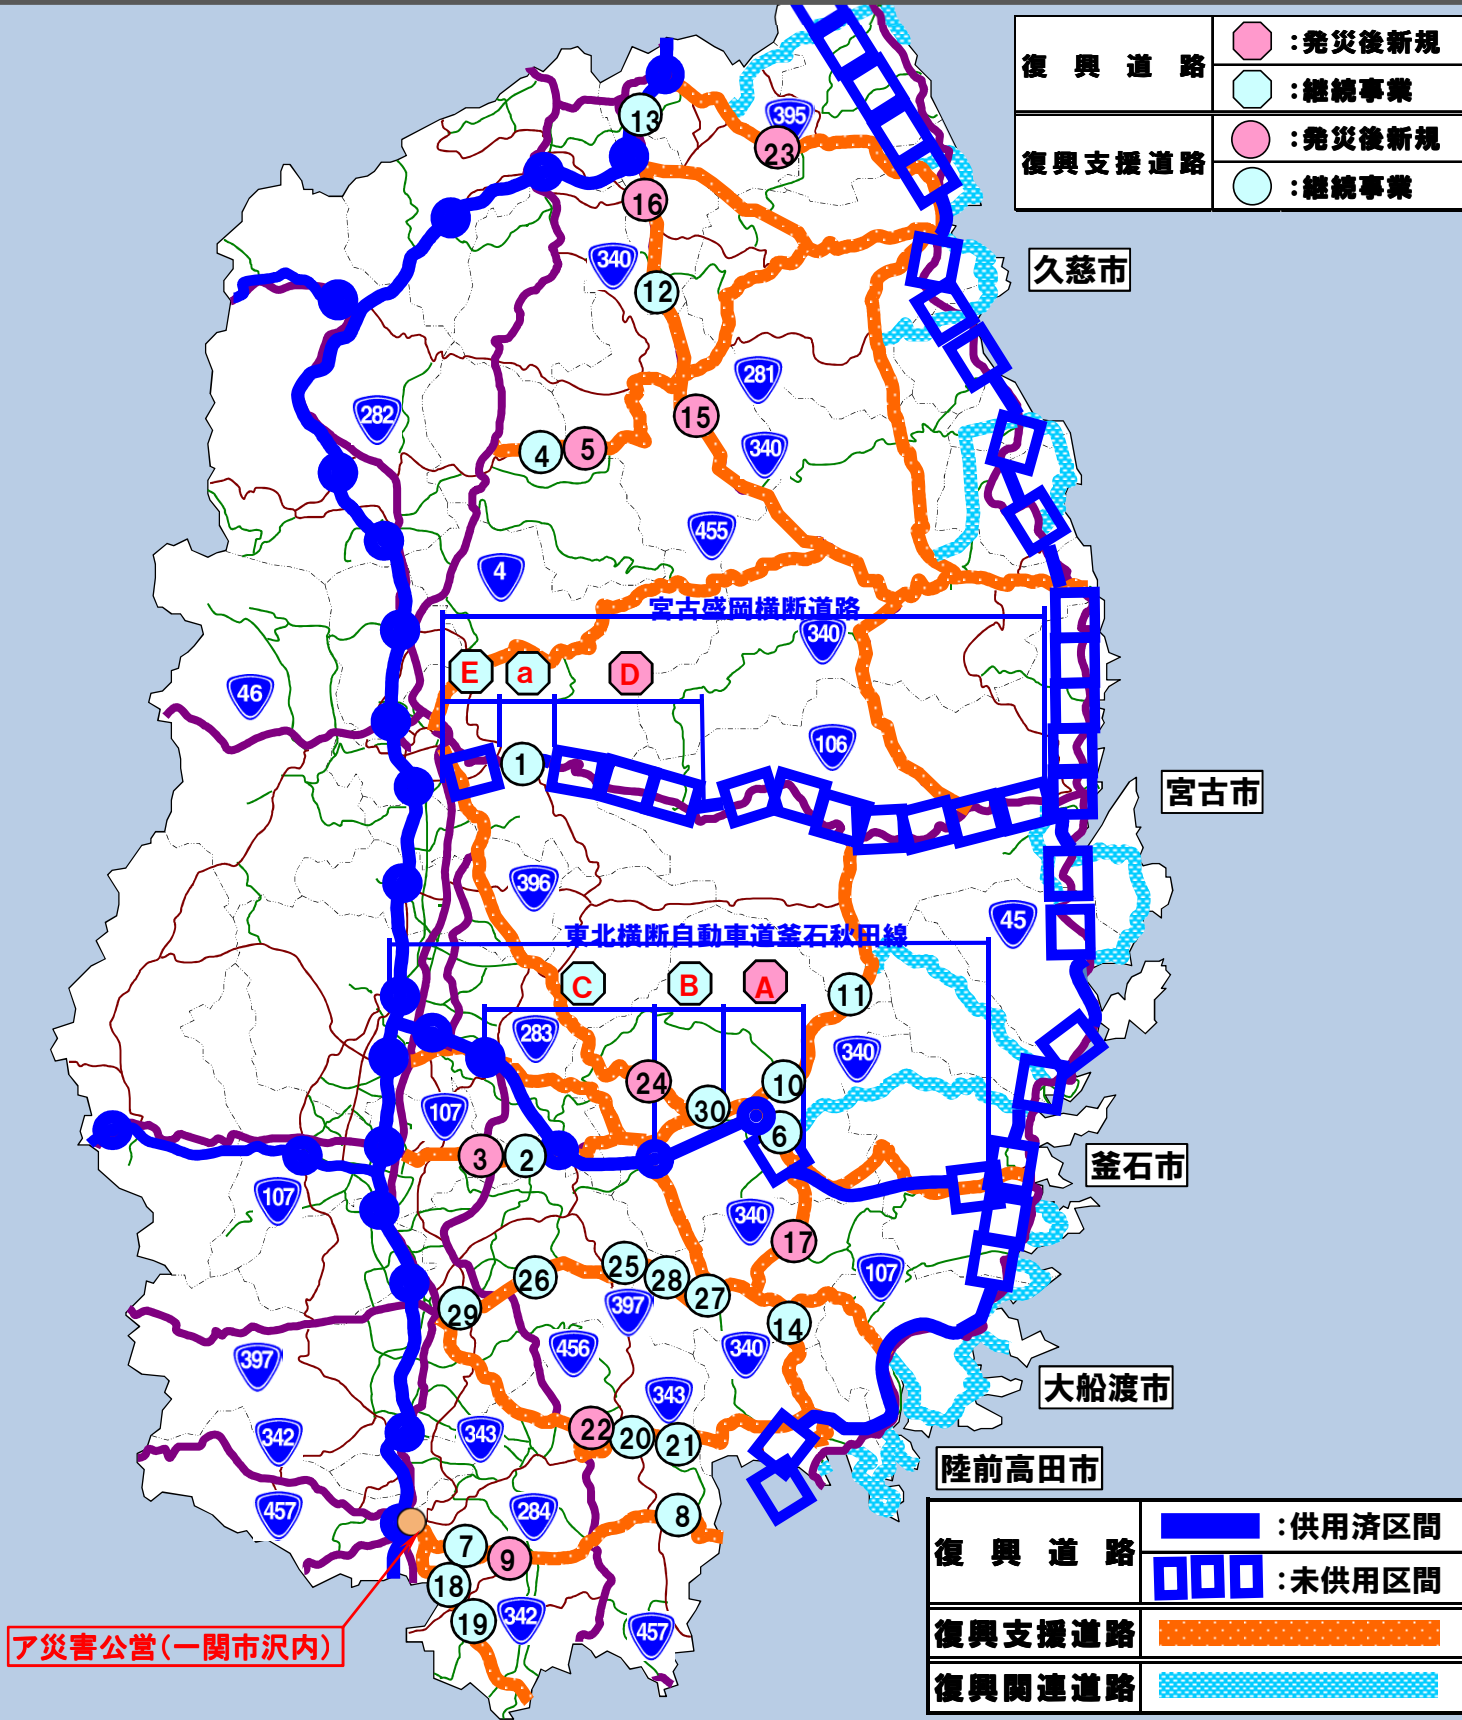

分野区分	細分項目等	事業主体	市町村名 路線・箇所名等	事業概要	年度別整備スケジュール									
					第1期 (基盤復興期間)		第2期 (本格復興期間)				第3期 (更なる展開への連結期間)			
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30		
災害公営住宅	直接建設	市	一関市 沢内 (単独)	RC造3階 戸数:27戸				用地、設計等	★工事					
直轄事業	復興道路	復興道路	東北横断自動車道 釜石秋田線	A 遠野市 遠野道路 (遠野住田～遠野)					★用地買収、工事等 ◆H25.6.16起工式					
				B 遠野市 遠野～宮守					■H27.12.5供用開始					
				C 遠野市 ～花巻市	宮守～東和			■H24.11.25供用開始						
			宮古盛岡横断道路	D 宮古市 ～盛岡市	区界道路 (区界～築川)				★用地買収、工事等 ◆H26.8.24起工式					
				E 盛岡市 都南川目道路					★用地買収、工事等 ※川目IC～田の沢IC H27開通予定、田の沢IC～手代森IC H31開通予定					
県事業	復興支援道路	復興支援道路	宮古盛岡横断道路	a 盛岡市 築川道路				■H25.3.10供用開始						
			一般国道106号 (ICへアクセスする道路)	1 盛岡市 川目				■H25.3.10供用開始						
			国道107号	2 奥州市 札押道路				■H23.10.26供用開始						
			国道107号	3 奥州市 梁川～口内					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			国道281号	4 岩手町 大坊					★工事					
			国道281号	5 岩手町 大坊の2					★用地買収、工事等 ◆H27.10着工					
			国道283号	6 遠野市 上郷道路					★工事					
			国道284号	7 一関市 真滝BP				■H24.8.7供用開始						
			国道284号	8 一関市 室根BP					★工事					
			国道284号	9 一関市 石法華					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			国道340号	10 遠野市 土淵BP				■H24.7.22一部供用開始 ■H25.12.25供用開始						
			国道340号	11 遠野市 (宮古市) ※宮古市の復興支援道路・国道340号立丸峠と同一箇所	立丸峠			◆H26.3着工	★工事					
			国道340号	12 九戸村 泥ノ木				■H27.1.16供用開始						
			国道340号	13 軽米町 駒板					◆H27.3着工 ★工事					
			国道340号	14 住田町 山谷					★用地買収、工事等 ◆H27.9着工					
			国道340号	15 葛巻町 四日市				◆H26.3着工 ★工事						
			国道340号	16 九戸村 長興寺					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			国道342号	17 住田町 葉山～恵蘇					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			国道342号	18 一関市 花泉BP				■H23.11.29一部供用開始 ■H26.8.30供用開始						
			国道342号	19 一関市 白崖					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			国道343号	20 一関市 大原				■H26.3.26供用開始						
			国道343号	21 一関市 一ノ通					◆H26.10着工 ★工事					
			国道395号	22 一関市 洗民					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			国道395号	23 軽米町 赤石峠					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			国道396号	24 遠野市 上宮守					測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手					
			国道397号	25 住田町 子飼沢				■H25.9.30供用開始						
			国道397号	26 奥州市 分限城～赤金					★工事					
			国道397号	27 住田町 高屋敷					★工事					
			国道397号	28 住田町 津付道路				■H26.10.26供用開始						
			国道397号	29 奥州市 小谷木橋					★用地買収、工事等 ◆H27.9着工					
			(一)遠野住田線 (ICへアクセスする道路)	30 遠野市 新里					■H27.12.5供用開始					
